



RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DINEPA
Direction Nationale
de l'Eau Potable
et de l'Assainissement



2025

Rapport simplifié exécution budgétaire 2024-2025 et les réalisations



12/30/2025

Principaux acronymes et sigles	3
Introduction	4
Programme prévisionnel de l'exercice 2024-2025	11
REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2024-2025.....	19
Situation d'exécution financière	26
LE RAPPORT DE DEPENSES REALISEES DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU BUDGET PROGRAMME SIMPLIFIE EXERCICE 2024-2025	26
Exécution de dépenses	26
Décaissement de Fonds – Trésor Public & Ressources domestiques	29
Décaissement de Fonds – Projet HA-L 1103 P-au-P III.....	30
Décaissement de Fonds – Programme de Reforme Secteur EPA HTI-003-B.	31
Décaissement de Fonds – Projet HA-L 1135 « Eau Potable & Assainissement du Grand Nord » ..	32
Décaissement de Fonds – Projet IDA Grant E 170 HT - EPARRDD	33
Décaissement de Fonds – Projet CDC, REGLEAU & UNICEF.....	33
Etat d'avancement des activités	34
CADRE DE RESULTATS	34
Cadre des Résultats.....	36
APPUI ANNUEL DU GOH AU SECTEUR EPA	36
APPUI ANNUEL RESSOURCES DOMESTIQUES DINEPA.....	39
PAPIII	40
HTI-003B AECID.....	43
GRAND NORD.....	46
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT RURAL RESILIENT DURABLE ET DECENTRALISE (EPARRDD).....	50
REGLEAU	52
Projet : Sécurité sanitaire et réponse aux menaces sanitaires en Haïti	54
UNICEF	56
Conclusion.....	58

Principaux acronymes et sigles

AECID	Agence Espagnole de Coopération Internationale et de Développement
BID	Banque Interaméricaine de Développement
BM	Banque Mondiale
BPS	Budget Programme Simplifié
CBP	Condition Basée sur les Performances
CDC	Control Disease Center
Coopération Suisse	Coopération Suisse
CTE	Centre Technique d'Exploitation
DINEPA	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement
EPARRD D	Programme Eau Potable et Assainissement en Milieu Rural Résilient ,Durable et Décentralisé
FCAS	Fonds de Coopération pour l'Eau et l'Assainissement
GoH	Gouvernement d'Haïti
OREPA	Office Régional d'Eau Potable et Assainissement
POA	Plan Opérationnel Annuel
PTF	Partenaire Technique et Financier
RMPP	Région Métropolitaine de Port au Prince
TEPAC	Technicien en Eau Potable et Assainissement Communaux
TP	Trésor Public
UNICEF	United Nations Children's Fund
EPAH	Eau Potable Assainissement et Hygiène

Introduction

La DINEPA à sa mission d'exécuter la politique de l'Etat dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement (EPA) en Haïti a élaboré en novembre 2022 une stratégie qui est perçue comme un outil utile pour tous, et dont le cadre logique facilitera des progrès en vue de l'atteinte de l'ODD 6 et pour la mise en œuvre de la vision de la DINEPA « Une maison : une connexion d'eau potable, un service d'assainissement intégré d'ici 2032 ».

Au terme de l'année fiscale 2024-2025, il est important pour la DINEPA de faire le point sur les actions menées par rapport aux objectifs fixés, d'évaluer les résultats obtenus et leurs impacts sur les conditions de vie de la population.

La DINEPA et les OREPA bénéficient de l'appui de partenaires nationaux et internationaux dans l'exécution de leurs mandats, ainsi pour couvrir les besoins du secteur, des investissements substantiels ont été consentis depuis plusieurs années.

Ce rapport tient compte des activités réalisées entre le 1^{er} Octobre 2024 au 30 septembre 2025 et présente l'état d'avancement de Projets et Programmes gérés par la DINEPA. Les délais d'exécution des projets UNICEF ASWA, CDC et REGLEAU sont arrivés à terme et ces financements ne sont plus disponibles pour l'exercice 2025-2026.

Ce document permettra de faire le point sur les progrès réalisés durant l'exercice 2024-2025 dans le cadre des financements reçus, en complément du Budget Programme Simplifié, objet des conditions basées sur la performance du programme EPARRDD.

Pour l'exercice 2024-2025, avec l'appui de la banque mondiale, pour la troisième fois à la DINEPA un budget axé sur les résultats communément appelé « **Budget programme Simplifié** » a été établi.

Ce budget programme qui comprend deux sections (finance et technique) a été préparé sur la base des données d'informations recueillies dans le Plan d'Opération Annuel (POA) 2024-2025 des programmes de financement en vigueur à la DINEPA, après validation des bailleurs.

Ce budget programme constitué de ressources financières venant des projets, du Trésor Public et des fonds domestiques de la DINEPA a été adopté durant l'exercice 2024 -2025 pour un montant total de **65,021,830.00 USD**. Il est découpé en sous catégories de dépenses sectorielles : **Accès à l'eau potable 61.5%, Accès aux services**

d'assainissement et hygiène 8.8% et Renforcement institutionnel 29.7%. Cette dernière catégorie de dépenses regroupe : les frais de personnel, les achats de biens et services, les contrats d'assistance technique, les dettes et les autres dépenses courantes.

Les accords de financements, les manuels opérationnels ainsi que les différentes planifications validées par les bailleurs de fonds ont été utilisés afin d'alimenter le budget programme simplifié 2024-2025 qui sert de base au présent rapport.


Afin d'avoir une vision claire sur les perspectives globales et annuelles, des plans d'opérations ont été élaborés. Ainsi, le Plan d'Opérations Annuel (POA) est l'outil de suivi de projet qui est utilisé pour évaluer l'état d'avancement des projets/programmes chaque année d'exécution. Cet instrument est susceptible d'être révisé.

Bien que les POA aient été préparé en utilisant les meilleures informations disponibles au premier trimestre de l'exercice, de nombreuses circonstances ont modifiées l'exécution du budget au cours de l'année 2025.


Le montant des dépenses pour l'exercice n'a toutefois atteint que 35,577,959.92 USD (soit 54.72 % des prévisions. Les montants de décaissement ci-dessous regroupés par sous-secteur d'activités sont tirés dans le tableau de prévisions de décaissement de chaque programme de financement gérés par la DINEPA , dans lequel sont inscrites les dépenses réalisées au cours de la période fiscale par composantes, produits et activités

Les graphes ci-dessous illustrent pour l'exercice 2024 -2025 les montants des dépenses par composante ainsi que la comparaison par rapport à l'exercice précédent 2023-2024. .


COMPOSANTE	Accès à l'Eau Potable	Accès Assainissement et Hygiène	Renforcement Institutionnel
Montant Planifié USD	39,965,117.91	5,743,148.48	19,313,363.60
Montant Exécuté USD	23,927,775.64	25,674.02	11,624,510.26
Ratio	59.87%	0.45%	60.19%

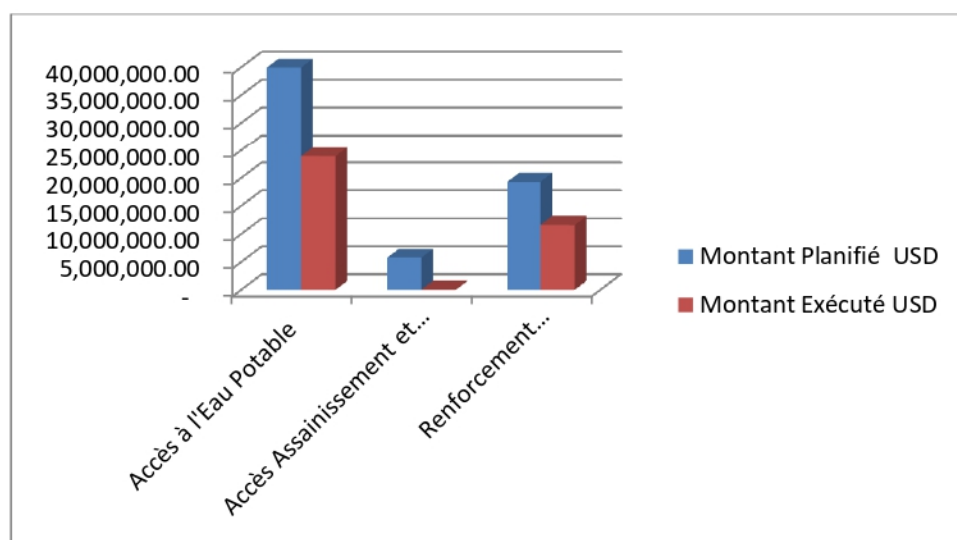

COMPOSANTE	Dépenses en USD 2024-2025	Dépenses en USD 2023-2024
Accès à l'Eau Potable	\$ 23,927,775.64	\$ 30,767,244.49
Accès Assainissement et Hygiène	\$ 25,674.02	\$ 1,051,328.66
Renforcement Institutionnel	\$ 11,624,510.26	\$ 11,888,774.79
Total	\$ 35,577,959.92	\$ 43,707,347.94

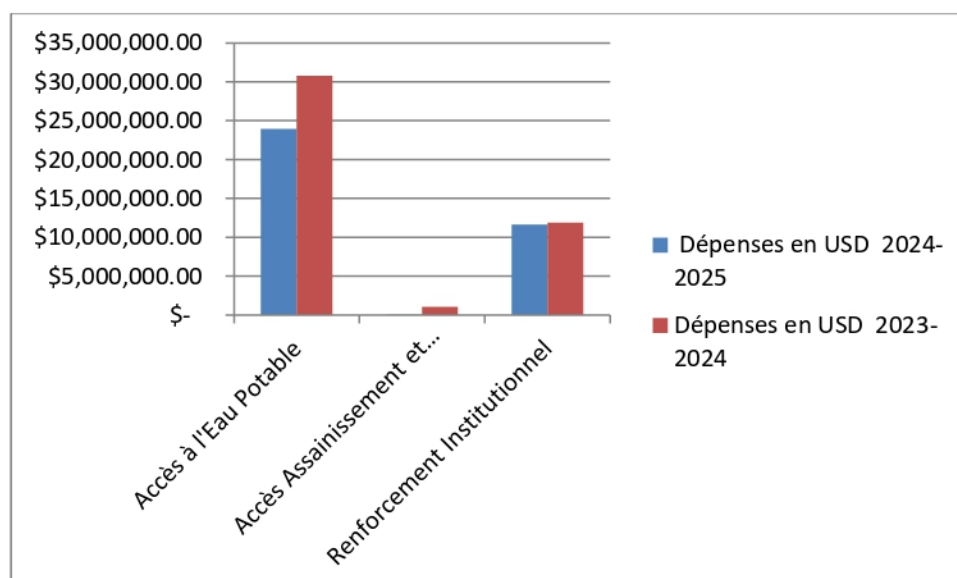

Le contexte global sécuritaire justifie en grande partie le ralentissement des activités au premier semestre de l'exercice 2024-2025 et par conséquent des retards quant à l'atteinte des indicateurs de résultats et de produits des différentes activités des programmes/projets gérés à la DINEPA.

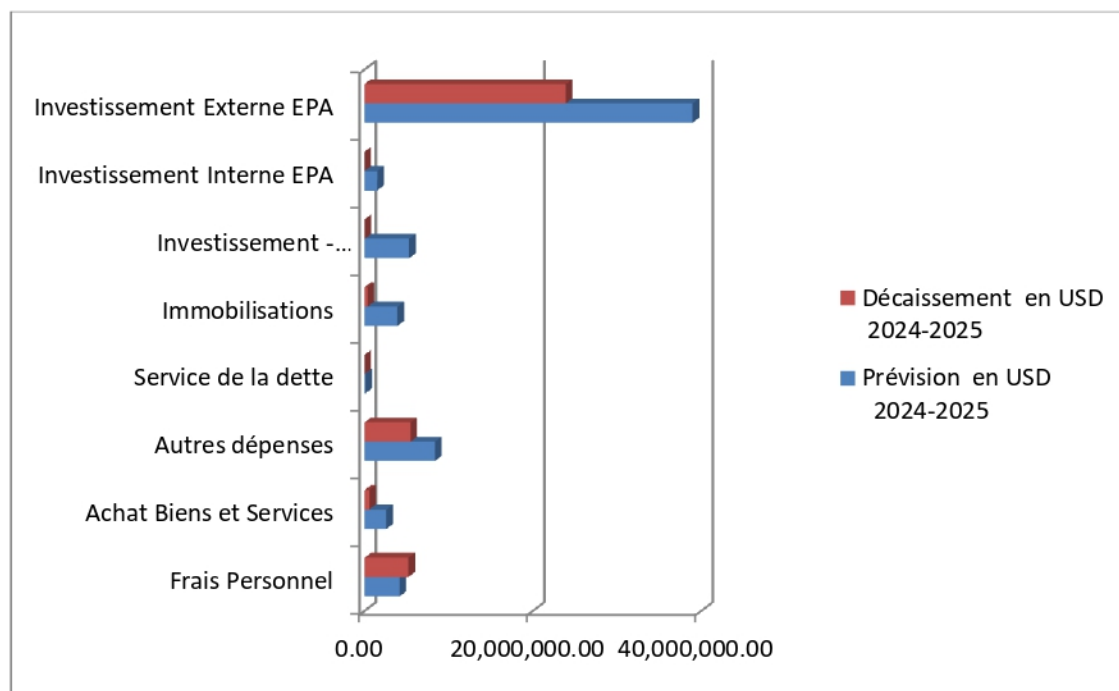

Les réalisations sont présentées en considérant les indicateurs de produits issus des cadres de résultats et en regroupant les activités des projets/programmes à partir des principales composantes.

Composante: Eau Potable

Des infrastructures d'alimentation en eau potable sont en cours d'exécutions pour permettre d'accroître la couverture, la desserte et d'avoir une gestion rationnelle des bénéficiaires. C'est ainsi que les projets/programmes ont financé la réhabilitation, le renforcement et l'extension des réseaux d'eau potable dans différentes villes et localités du pays. Pour l'exercice 2024-2025, le montant des dépenses réalisées pour cette composante s'élève à **23,927,775.64 USD**

Composante: Accès à l'assainissement et à l'Hygiène

Concernant le volet Assainissement, les ressources financières des programmes/projets ont supportés des séances de formations et de sensibilisation à l'hygiène. Les dépenses encourues pour la période 2024-2025 sont de l'ordre de **25,674.02 USD**.

Composante: Renforcement Institutionnel Sectoriel


Les activités d'appui définies dans les programmes/projets ont permis de renforcer les capacités des structures au niveau central, régional et décentralisé. Pour permettre la pérennisation des infrastructures lors de leurs exploitations, une subvention aux coûts d'exploitations a été accordée à certains centres techniques d'exploitation (CTE). Cet appui concerne la construction de bureaux administratifs, la fourniture d'équipements informatiques et bureautiques, de véhicules, la conception d'une application de Gestion des Information sur la Qualité de l'Eau Potable (GISQEP), l'installation de logiciel de Gestion des Ressources Humaines ainsi que différents modules du logiciel comptable ACCPAC et les séances d formation du personnel.

Des réunions techniques et stratégiques sont organisées périodiquement avec les parties prenantes afin de suivre les effets des projets/programmes gérés à la DINEPA.

Une amélioration de la gestion technique, commerciale et financière des CTE de Cap Haïtien, Ouanamithe, Port de Paix et des Gonaïves est en cours avec les deux (2) contrats d'Assistance Technique Par Résultats . Le démarrage du renforcement des capacités des quinze (15) mairies du Grand Sud a été initié durant cette période. Cette activité sera bénéfique pour la décentralisation de la maîtrise d'ouvrage .

Un support financier est octroyé à différentes structures pour financer leurs coûts de fonctionnement en termes de salaires du personnel transversal et de locations de bureaux . Les dépenses pour cette composante est de l'ordre de **11,624,510.26 USD**.

Les ressources financières des projets/programmes dépensées pour l'exécution des activités de l'exercice fiscal 20242025 sont présentées ci après.



PROGRAMMES	MONTANTS EN USD	%
GOH / TRESOR PUBLIC	\$ 977,055.64	2.75%
FONDs PROPRES	\$ 148,717.69	0.42%
BID / 4353/GR-HA/PAP III	\$ 6,280,954.03	17.65%
AECID / HTI-003-B	\$ 3,312,070.05	9.31%
BID / 4697/GR-HA/Grand Nord	\$ 16,982,539.27	47.73%
EPARRDD	\$ 7,390,007.31	20.77%
REGLEAU	\$ 131,148.61	0.37%
CDC	\$ 105,480.66	0.30%
UNICEF	\$ 249,986.66	0.70%
TOTAL	\$ 35,577,959.92	

N.B. : Il faut souligner que les Programme et financements REGLEAU, CDC et UNICEF ont pris fin durant l'exercice 2024-2025.

Tableau de décaissements réalisés par rubrique

Structures de Dépenses	Prévision 2024-2025	Décaissement 2023-2024	Ecart Budgétaire	% Réal
Frais Personnel	4,163,295.2	5,216,006.9	-1,052,711.7	125.3%
Achat biens et services	2,621,880.9	569,272.4	2,052,608.5	21.7%
Autres dépenses	8,361,066.8	5,464,218.6	2,896,848.2	65.3%
Service de la dette	116,927.1	5,928.6	110,998.5	5.1%
Immobilisations	3,937,595.8	389,347.2	3,548,248.6	9.9%
Investissement - Assainissement	5,332,200.8	25,674.0	5,306,526.8	0.5%
Investissement Interne EPA	1,515,151.5	0.0	1,515,151.5	0%
Investissement Externe EPA	38,973,711.9	23,907,512.2	15,066,199.7	61.3%
Total	65,021,830.0	35,577,959.9	29,443,870.1	54.7%

Programme prévisionnel de l'exercice 2024-2025

Ce chapitre présente les grandes lignes de la planification 2024-2025. Les objectifs fixés par la DINEPA pour cette période se résument ainsi :

- 1) 3% de nouveaux ménages avec accès à des services d'eau potable et d'assainissement.
- 2) 10% des Structures d'Exploitation et d'Opération ayant atteint un niveau d'autonomie financière pour leur fonctionnement.
- 3) Le secteur bénéficie d'un environnement favorable pour son développement en matière de gouvernance et de régulation.
- 4) Augmentation de 5% des localités vérifiées FDAL.

En termes d'infrastructures, avec les difficultés conjoncturelles, la réalisation des activités a été mitigée et certaines sont reporté pour l'exercice suivant soit 2025-2026. Il faut noter que les travaux de construction de SAEP au niveau de Cabaret, Arcahaie, Mariani, Carrefour Martissant sont à l'arrêt et les contrats en phase de clôture .

Les tableaux ci-dessous présentent l'essentiel des travaux et opérations ainsi que certaines études qui avaient été prévu pour être exécutées ou lancées au cours de la période. Cette planification a été réalisée globalement à 40%.

Les tableaux, ci-dessous présentent quelques activités dont les montants sont déjà définis dans les projets /programmes.

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction du réseau de distribution de Vivi-Michel et Travaux de construction du réseau de distribution de Carrefour- Travaux de construction de l'adduction Axe Mariani - Diquini- Travaux de construction de l'adduction Axe Diquini- Bolosse .Travaux de construction de l'adduction Axe Diquini- Martissant 23.	PAP 3	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	OUEST	Extension Bâtiment administratif OREPA Ouest	PAP 3	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	OUEST	Construction bâtiment administratif Anse-a-galet	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural(pour 4800 ménages sur 2 ans)	PAP 3	BID
Travaux Eau Potable	NORD	Lancement de la Réhabilitation et de l'Extension du SAEP de Fort-Liberté	HTI-003B	BID
Travaux Eau Potable	NORD	Renforcement du SAEP de Saint-Louis du Nord(Degrange)	GRAND NORD	BM
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction d'un Nouveau bâtiment administratif du CTE de Saint Louis du Nord	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	NORD	Construction SAEP Saint Louis Du Nord	GRAND NORD	BM
Travaux Eau Potable	NORD	Construction du Réseau Eau Potable a Cap-Haitien . 6 lots.	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	NORD	Construction du Réseau Eau Potable a Cap-Haitien . Lot2 Centre Ville .	HTI-003B	AECID

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Strategie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction d'un Nouveau bâtiment administratif du CTE Cap Haïtien	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction Bâtiment administratif du SAEP ANDRO	EPARRDD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction du bâtiment de l'OREPA NORD	HTI-003B	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	la mise en place d'un laboratoire de contrôle de qualité de l'eau au niveau de l'OREPA NORD;	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction de la clôture du champ captant et le bâtiment administratif du CTE à la ville de Ouanaminthe ;	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction entrepôt pour OREPA NORD	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	NORD	Lancement des travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural (pour 6000 ménages sur 2 ans)	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de renforcement du réservoir 700 m3 de la Savane (cayes)	URBAYITI	UE-AECID
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de réhabilitation et d'extension SAEP Ville des Cayes	URBAYITI	UE-AECID
Travaux Eau Potable	SUD	Mise en place du système Condominium Eau : Ville des Cayes	URBAYITI	UE-AECID
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de la ville de Jacmel	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	SUD	Finalisation Travaux de Réhabilitation et d'extension SAEP de la ville Jérémie	HTI-003B	AECID
Travaux Eau Potable	SUD	Finalisation Travaux de réhabilitation du réseau de distribution de Miragoane	HTI-003B	AECID

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Strategie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	SUD	Travaux deConstruction Bâtiments administratifs de 3 SAEP du Sud: L'Asile, Cavaillon et Abricots	EPARRDD	BM
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	SUD	Construction Bâtiment administratif OREPASud-	HTI-003B	AECID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	SUD	Construction entrepôts pour l'OREPA sud	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	SUD	SAEP RURAUX dans des localités du grand Sud: Cavaillon, Belle-Anse, Bonbon)	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	SUD	SAEP RURAUX dans le grand Sud: Localités de 15 communes à identifier	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	SUD	travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural (pour 5200 ménages sur 2 ans)	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	Centre	Finalisation de la construction du SAEP de la ville de Hinche	HTI-003B	AECID
Travaux Eau Potable	Centre	Construction, réhabilitation et extension du SAEP de la ville des	GRAND NORD	BID
Travaux Eau Potable	Centre	Finalisation de la Réhabilitation et l' Extension du SAEP de LASCAHOBAS	EPARRDD	BM
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Centre	Construction Entrepôt pour OREPA CENTRE	EPARRDD	BM
Travaux Eau Potable	Centre	Lancement des travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural(pour 950 ménages sur 2 ans)	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	OUEST	Transformation des Forages (F2-F3-75) de Delmas 19 et Turgeau en des systèmes à énergie solaire ;	PAP 3	BID

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Strategie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Exploitation -Gestion - Eau Potable	OUEST	Réalisation 31000 branchements et remplacement de 13 pompes sur les forages de la zone métropolitaine	PAP 3	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Pose de branchements dans les SAEP de Port-de-Paix, Ouanaminthe, Cap-Haitien	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Sectorisation SAEP de Ouanaminthe	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Initiative pour le renforcement et le contrôle de la qualité de l'eau distribuée dans toutes les communes du Nord	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	SUD	Mise en service d'un laboratoire de contrôle de qualité de l'eau au niveau de l'OREPA SUD ;	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	SUD	Réalisation d'opérations visant le traitement (désinfection) de l'eau potable.	RESEPSE/HELVETAS	PNUD
Exploitation -Gestion - Eau Potable	4 Régions'	Transformation des Forages en des systèmes à énergie solaire ;	DAI	usaid-eau
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes: réseau d'eau potable par pompage solaire à St Louis du Nord ;	GRAND NORD	BID
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes pour réhabilitation réseau :Caracol et Terrier Rouge; Trou du Nord, Limonade;	DAI	usaid-eau
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes : Réhabilitation et extension SAEP de Pilate ;	TP	GOH
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes et réalisation de systèmes photo voltaïques à Cap-Haitien, ST Louis et Ouanaminthe ;	GRAND NORD	BID
Eau Potable	NORD,SUD,CENTRE	Réalisation en cours des études APD des 24 SAEP sur Grand-Anse, Sud, Sud-Est , nippes, Artibonite,	EPARRDD	BM
Eau Potable	NORD,SUD,CENTRE	Réalisation en cours des études Environnementales et Sociales des 24 SAEP sur Grand-Anse, Sud, Sud-Est , nippes, Artibonite, Centre	EPARRDD	BM
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD,SUD,CENTRE	Préparation des études techniques pour construction de bureaux et Entrepôts	EPARRDD	BM

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Strategie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Travaux Assainissement:	NORD	Poursuite construction station de traitement des eaux usées et des boues de la région du Cap-Haitien à Mouchinette/Limonade	HTI-003B	AECID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Mise à niveau pour la gestion adéquate de 4 blocs sanitaires dans la RMPP ;	URBAYITI	UE-AECID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Acquisition camion de vidange pour STEB Cayes	URBAYITI	UE-AECID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne Assainissement Cap-Haitien. Stratégie Communale intégrant Assainissement et Déchets Solides	GRAND NORD	BID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne Assainissement Ouanaminthe Cap et Cayes : Services financiers pour mise à niveau des systemes d'assainissement familial	SANIFIN	USAID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défécation a l'air libre sur des localités de 10 communes du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	GRAND NORD	BID
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défécation a l'air libre sur des localités de 8 communes du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	EPARRDD	BM
Opération Assainissement et Fin Défécation a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défécation a l'air libre sur des localités de 15 communes du Grand Sud du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	EPARRDD	BM
URGENCE EPA	National	Préparation et Réponse aux Urgences	UNICEF	UNICEF
URGENCE EPA	Ouest	Préparation et Réponse aux Urgences dans la RMPP	EPARRDD	BM

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Strategie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Protection Ressource en Eau	NORD	Etudes ET construction d'un champ captant à Port-de-Paix ;	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Activités liées à la Gouvernance et résilience des données: Gouvernance des données, renforcement base de données, Interconnexion. SIRWASH	SIRWASH	BID/COSUDE
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Activités liées à la Gouvernance et résilience des données: Gouvernance des données, renforcement base de données, Interconnexion. USAID-EAU	DAI	usaid-eau
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Ajustement des Politiques publiques et Innovations: Définition de stratégies et de politiques en matière de services, de Qualité de l'Eau et assainissement en milieu rural (SIRWASH)	SIRWASH	BID/COSUDE
Renforcement Institutionnel /Régulation /	Niveau National	Appui au développement du cadre réglementaire et le contrôle des maitres d'ouvrages communaux par	REGLEAU	Coop Suisse
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Appui au montage de 3 pôles de compétences EPA en appui aux mairies	EPARRDD	BM
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Renforcement, Coordination et Supervision des actions d'urgence	UNICEF	UNICEF

PLANIFICATION POUR EXERCICE 2024-2025				
Reference avec les Objectifs Spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/Programme	Source de financement
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Ajustement des politiques publiques en matière de FDAL: Appui au dialogue politique (sectoriel) par rapport à la décentralisation du secteur (Forum décentralisation)	REGLEAU	Coop Suisse
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Evaluation des approches communautaires visant la fin de la défécation a l'air libre et Production de la Feuille de route FDAL	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Ajustement des politiques publiques en matière de FDAL: Renforcement des capacités des secteurs connexes et de pool de jeunes sur le territoire: Formation de formateurs FDAL	GRAND NORD	BID
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Renforcement de la professionnalisation et de la certification des acteurs en milieu rural-SIRWASH	SIRWASH	BID/COSUDE
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Ajustement des politiques publiques en matière de service public d'eau potable: Gestion clientèle, péréquation, renouvellement, tarification	TP	GOH

REALISATIONS POUR L'EXERCICE 2024-2025

Ci -après, est présenté un récapitulatif de l'état d'avancement des activités réalisées pour la période ainsi que et la prévision pour l'exercice 2025 -2026

REALISATIONS EXERCICE 2024-2025 / ETAT D'AVANCEMENT						
Référence avec les objectifs spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/ Programme	Source de financement	Etat Avancement : Ex 2024-2025	Prévisions : Ex 2025-2026
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction du réseau de distribution de Vivy Michel : zone Belvil, Vivy Michel et Puits Blain.	PAP 3/4353/GR-HA	BID	Les travaux de pose de conduites de distribution sont finalisés à 100% durant l'exercice 2024-2025 .	Un avenant est en préparation pour l'installation de 1125 nouveaux branchements dans les zones de Belvil, Vivy Michel et Puits Blain.
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction du réseau de distribution de Vivi-Michel zone de Puits Blain, Cassagnole et Siloe.	PAP 3/4353/GR-HA	BID	L'avancement des travaux de pose de conduites structurantes ,objet du contrat initial est estimés à 67%	, pour l'exercice 2025 - 2026 ,un avenant sera signé pour l'installation de 1000 nouveaux branchements dans la zone de Puits Blain, Cassagnole et Siloe.
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction du réseau de distribution de Vivy Michel: zone Tabarre 52,Caradeux et Vivy	PAP 3/4353/GR-HA	BID	L'avancement des travaux de pose de conduites est estimé à 18 % pour la zone de Caradeux ,de tabarre 52	Un avenant est en préparation pour l'installation de 4000 nouveaux branchements dans les zones de Vivy Michel, Tabarre 52 et Caradeux
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction du réseau de distribution de Carrefour -	PAP 3/4353/GR-HA	BID	L'avancement global des deux marchés de pose de conduites est estimé à 81 %.	Un avenant est en préparation pour des travaux de raccordement de la source Baptiste au réseau dans la zone de Carrefour. Et pour l'installation de 2000 nouveaux branchements dans la zone de Carrefour.
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de pose de conduites à Cité Soleil	PAP 3/4353/GR-HA	BID	L'avancement des travaux de pose de conduites de refoulement est estimés à 30% ,	L'exécution des travaux se poursuit durant cet exercice
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux Réhabilitation/Construction SAEF en milieu rural(pour 4800 ménages)	PAP 3/4353/GR-HA	BID	En cours Les dossiers d'Appel d'Offres sont en cours de préparation -Les travaux ont été suspendus dans la zone de Kenscoff en raison de la situation sécuritaire	Le processus d'Appel d'Offres sera lancé et l'exécution des travaux se poursuit durant cet exercice.
Travaux Eau Potable	OUEST	Travaux de Renforcement/ Extension complémentaires de la desserte en Eau Potable de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince RMPP: Travaux de construction de l'adduction Axe Mariani - Diquini-Travaux de construction de l'adduction Axe Diquini- Bolosse .Travaux de construction de l'adduction Axe Diquini- Martissant 23.	PAP 3/4353/GR-HA	BID	L'avancement global des trois marchés de travaux est estimé à 51 %. Les travaux sont suspendus et les contrats clôturés en raison du contexte sécuritaire	
Exploitation -Gestion - Eau Potable	OUEST	Fourniture et Installation de 13 motopompes pour les séries de forages F et T (Renforcement de la production)	PAP 3/4353/GR-HA	BID	Contrat en cours d'attribution -	La réalisation de l'activité est prévue pour l'exercice 2025-2026

REALISATIONS EXERCICE 2024-2025 / ETAT D'AVANCEMENT						
Référence avec les objectifs spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/ Programme	Source de financement	Etat Avancement : Ex 2024-2025	Prévisions : Ex 2025-2026
Exploitation -Gestion - Eau Potable	OUEST	Acquisition de groupes électrogènes pour la remise en fonctionnement des kiosques existants à Cité Soleil	PAP 3/4353/GR-HA	BID	Contrat en cours d'attribution -	La réalisation de l'activité est prévue pour l'exercice 2025-2026
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	OUEST	Travaux de construction d'un bureau commercial à Vivy Michel	PAP 3/4353/GR-HA	BID	Contrat en cours d'attribution -	La réalisation de l'activité est prévue pour l'exercice 2025-2026
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	OUEST	Extension Bâtiment administratif OREPA Ouest	PAP 3/4353/GR-HA	BID	Contrat en cours d'attribution -	La réalisation de l'activité est prévue pour l'exercice 2025-2026
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	OUEST	Construction bâtiment administratif Anse-a-galet	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité /Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Travaux Eau Potable	NORD	Travaux de Réhabilitation et d'Extension du SAEP de Fort-Liberté	HTI-003B	AECID	L'avancement des travaux de pose de conduites est estimé globalement à 65%,le réservoir existant est réhabilité à 100%	L'exécution des travaux de pose se poursuit - La construction d'un nouveau réservoir en béton armé est prévu pour l'exercice
Travaux Eau Potable	NORD	Renforcement du SAEP de Saint-Louis du Nord(Degrange)	HTI-003B	AECID	L'avancement des travaux de pose de l'adduction est estimé à 50%.	Les travaux s'achèveront durant cet exercice
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction d'un Nouveau bâtiment administratif du CTE de Saint Louis du Nord	GRAND NORD /4697	BID	Les travaux ont démarré et l'avancement est estimé à 38%	Les travaux s'achèveront durant cet exercice
Travaux Eau Potable	NORD	Construction SAEP Saint Louis Du Nord	EPARRDD	BM	Le dossier d'étude de faisabilité préparé par L'ATPR est validé.Le dossier a été introduit à la coordination EPARRDD pour transmission à UNOPS aux fins de finalisation comme APD selon les critères EPARRDD.	
Travaux Eau Potable	NORD	Construction du Réseau Eau Potable a Cap-Haïtien . 6 lots.	GRAND NORD /4697	BID	L'avancement Global des travaux de pose de conduites est estimé à 72%	Les travaux s'achèveront durant cet exercice
Travaux Eau Potable	NORD	Construction du Réseau Eau Potable a Cap-Haïtien . Lot2 Centre Ville .	HTI-003B	AECID	Les travaux de pose de conduites sont achevés.Un avenant a été signé avec l'entreprise pour la réfection des chaussées .	Le réseau sera fonctionnel durant cet exercice
Assainissement	NORD	Acces aux services pour 1 000 ménages à un assainissement intégré sur site dans les quartiers du Cap Haïtien.	GRAND NORD /4697	BID	Contrat en cours de signature	La prestation débutera durant cet exercice
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	NORD	Construction d'un Nouveau bâtiment administratif du CTE Cap Haïtien	GRAND NORD /4697	BID	Le démarrage des travaux est effectif depuis février 2025 . L'avancement des travaux est estimé à 25%	Les travaux s'achèveront durant cet exercice
Travaux Eau Potable	NORD	Construction des reseaux de distribution du Cap Haïtien avec branchements domestiques et kiosques à eau. Contrat 3, Lot 1B, Petite Anse	GRAND NORD /4697	BID	En phase d'évaluation des offres	L'attribution du marché et le démarrage des travaux sont prévus pour cet exercice
Travaux Eau Potable	NORD	Construction des réseaux d'adduction du Cap Haïtien de Balan à Babioles, section Balan à la RN1	GRAND NORD /4697	BID	En cours d'exécution - Avancement des travaux de pose de conduites 10%	L'exécution des travaux se poursuit

REALISATIONS EXERCICE 2024-2025 / ETAT D'AVANCEMENT						
Référence avec les objectifs spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/ Programme	Source de financement	Etat Avancement : Ex 2024-2025	Prévisions : Ex 2025-2026
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	NORD	Construction Bâtiment administratif du SAEP ANDRO	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité / Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	NORD	Construction du bâtiment de l'OREPA NORD	HTI-003B	BID	En cours d'exécution - avancement des travaux est estimé à 40%/ les travaux ont été suspendus durant l'exercice à cause des problèmes de trésorerie de l'entreprise de construction et n'ont pas eu un avancement notable durant l'exercice	Le chantier reprendra
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	NORD	Construction de la clôture du champ captant et le bâtiment administratif du CTE à la ville de Ouanaminthe ;	GRAND NORD	BID	En cours d'exécution	
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	NORD	Construction entrepôt pour OREPA NORD	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité / Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Travaux Eau Potable	NORD	Lancement des travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural (pour 6000 ménages sur 2 ans)	GRAND NORD	BID	En cours avec UNICEF	En cours avec UNICEF
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de renforcement du réservoir 700 m3 de la Savane (cayes)	URBAYITI	UE-AECID	En cours d'exécution - L'entreprise est en attente des matériels importés	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de réhabilitation et d'extension SAEP Ville des Cayes	URBAYITI	UE-AECID	En cours d'exécution avancement 55%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	Mise en place du système Condominium Eau : Ville des Cayes	URBAYITI	UE-AECID	En cours d'exécution - avancement 30%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	Travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de la ville de Jacmel	GRAND NORD	BID	En cours d'exécution. L'avancement du chantier est estimé à 25%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	Finalisation Travaux de Réhabilitation et d'extension SAEP de la ville Jérémie	HTI-003B	AECID	En cours d'exécution. L'avancement du chantier est estimé à 15%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	Finalisation Travaux de réhabilitation du réseau de distribution de Miragoane	HTI-003B	AECID	Travaux achevés. L'inauguration a eu lieu en juin 2025	

REALISATIONS EXERCICE 2024-2025 / ETAT D'AVANCEMENT						
Référence avec les objectifs spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/ Programme	Source de financement	Etat Avancement : Ex 2024-2025	Prévisions : Ex 2025-2026
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	SUD	Travaux de Construction Bâtiments administratifs de 3 SAEP du Sud: L'Asile, Cavaillon et Abricots	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité /Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	SUD	Construction Bâtiment administratif OREPASud-	HTI-003B	AECID	Adjudé mais non démarré	
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	SUD	Construction entrepôts pour l'OREPA sud	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité /Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Travaux Eau Potable	SUD	SAEP RURAUX dans des localités du grand Sud: Cavaillon, Belle-Anse, Bonbon)	GRAND NORD /4697	BID	Les travaux ont démarrés et l'avancement global est estimé à 32%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	SUD	SAEP RURAUX dans le grand Sud: Localités de 15 communes	EPARRDD	BM	Les Communes bénéficiaires sont identifiées- Méthodologie d'intervention élaborée	Le démarrage des Prestations pour l'identification des sous projet est prévu pour cet exercice
Travaux Eau Potable	Centre	Finalisation de la construction du SAEP de la ville de Hinche	HTI-003B	AECID	En cours d'exécution - avancement des travaux est estimé à 80%	En cours d'exécution
Travaux Eau Potable	Centre	Construction, réhabilitation et extension du SAEP de la ville des Gonaïves Construction et réhabilitation du système d'alimentation en eau potable des Gonaïves, SAEP	GRAND NORD /	BID	En cours d'exécution - avancement des travaux est estimé à 72%	Les travaux s'achèveront en juin 2026
Travaux Eau Potable	Centre	Finalisation de la Réhabilitation et l' Extension du SAEP de LASCAHOBAS	EPARRDD	BM	Achévé	La réception provisoire ets prononcée
Renforcement Institutionnel / Régulation / Coordination	Centre	Construction Entrepôt pour OREPA CENTRE	EPARRDD	BM	Etude de faisabilité /Avant Projet Détaillé est en cours	Le lancement du processus d'appel d'offres pour l'exécution des travaux est prévu pour l'exercice 2025-2026
Travaux Eau Potable	Centre	Lancement des travaux Réhabilitation/Construction SAEP en milieu rural(pour 950 ménages sur 2	GRAND NORD	BID	En cours d'exécution avec UNICEF- Les appels d'offres ont été lancés	
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes: réseau d'eau potable par pompage solaire à St Louis du Nord ;	GRAND NORD	BID	Etude réalisée : partie hydraulique	
Exploitation -Gestion - Eau Potable	NORD	Etudes : Réhabilitation et extension SAEP de Pilate ;	TP	GOH	Dossier soumis comme FIOP - Attente de la disponibilité du financement	
Eau Potable	NORD,SUD, CENTRE	Réalisation en cours des études APD des 24 SAEP sur Grand-Anse, Sud, Sud-Est , nippes, Artibonite, Centre Nord-ouest, nord, Nord-Est	EPARRDD	BM	Avancement global : 35 % 4 Etudes Avant Projet détaillées réalisées/ 7 etudes de faisabilité initiées	Poursuite des prestations d'études pour Ferrier,Roseau,Cavaillon,St Louis du Nord etc.. - Lancement AO pour les 4 dossiers : Mole St Nicolas, Anse Rouge,Decovil et Baint
Eau Potable	NORD,SUD, CENTRE	Réalisation en cours des études Environnementales et Sociales des 24 SAEP sur Grand-Anse, Sud, Sud-Est , nippes, Artibonite, Centre Nord-ouest, nord, Nord-Est	EPARRDD	BM	En cours avec le contrat UNOPS	En cours durant la durée des prestations

REALISATIONS EXERCICE 2024-2025 / ETAT D'AVANCEMENT						
Référence avec les objectifs spécifiques de la Stratégie Décennale	REGION	Activités	Projet/ Programme	Source de financement	Etat Avancement : Ex 2024-2025	Prévisions : Ex 2025-2026
Travaux Assainissement:	NORD	Poursuite construction station de traitement des eaux usées et des boues de la région du Cap-Haitien à Mouchinette/Limonade	HTI-003B	AECID	Travaux à l'arrêt - L'entreprise est en attente de matériels importés pour poursuivre avec les travaux	
Opération Assainissement et Fin Défection a l'Air Libre (FDAL)	National	Mise à niveau pour la gestion adéquate de 4 blocs sanitaires dans la RMPP ;	URBAYITI	UE-AECID	Achevé	Réception des travaux à faire
Opération Assainissement et Fin Défection a l'Air Libre (FDAL)	National	Acquisition camion de vidange pour STEB Cayes	URBAYITI	UE-AECID	Processus appel d'offres en cours	Adjudication ,signature de contrat et acquisition à faire
Opération Assainissement et Fin Défection a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défection a l'air libre sur des localités de 10 communes du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	GRAND NORD	BID	En cours avec UNICEF	Poursuite des prestation avec le recrutement des Partenaires de Mise en Oeuvre
Opération Assainissement et Fin Défection a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défection a l'air libre sur des localités de 8 communes du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	EPARRDD	BM	En cours avec UNICEF	Poursuite des prestation avec le recrutement des Partenaires de Mise en Oeuvre
Opération Assainissement et Fin Défection a l'Air Libre (FDAL)	National	Campagne pour la Fin de la Défection a l'air libre sur des localités de 15 communes du Grand Sud du pays et mise a niveau de blocs sanitaires dans les institutions clés	EPARRDD	BM	En cours avec PADF	Les prestations démarreront durant l'exercice 25-26
URGENCE EPA	Ouest	Préparation et Réponse aux Urgences dans la RMPP	EPARRDD	BM	Réalisé jusqu'à novembre 2024	La prestation reprendra durant l'exercice 2025-2026 avec la signature d'un avenant de 1MUSD avec UNICEF pour étendre la réponse aux Urgences à d'autres OREPA
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Appui au développement du cadre réglementaire et le contrôle des maitres d'ouvrages communaux par la DINEPA	REGLEAU	Coop Suisse	Réalisé à 90%	Attente de validation
Renforcement Institutionnel /Régulation / Coordination	Niveau National	Evaluation des approches communautaires visant la fin de la défécation a l'air libre et Production de la Feuille de route FDAL	GRAND NORD	BID	Réalisé avec UNICEF	

Pour cette période 2025-2026, il s'agira de :

- Poursuivre les travaux lancés au cours de l'exercice précédent, notamment au niveau des SAEP de Cap-Haitien, ceux du Grand Sud (Jacmel Jérémie, Cayes), de Carrefour et de Vivy Michel, de Cité Soleil, Fort-Liberté, Saint Louis du Nord, Petit Goave ainsi que la Station de Traitement des Eaux Usées et des Boues de Limonade. la finalisation des travaux du SAEP de Hinche.
- Lancer de nouveaux travaux de réhabilitation/construction de plusieurs SAEP dont , Anse Rouge, Mole Saint Nicolas, Decovil ainsi que les SAEP prioritaires des villes de moins de 10000 habitants, et des petits SAEP ruraux de plus de 20 communes

Outre les travaux, un ensemble d'opérations est planifié pour optimiser ou faciliter la mise en service d'infrastructures existantes : Pour les opérations, il est prévu des aménagements, des réparations au niveau des forages, la solarisation de plusieurs SAEP, des travaux de protection de périmètres de sources, de mise en place de laboratoire de qualité de l'Eau, des interventions de réponse aux urgences dans les sites de déplacés de la RMPP.

Situation d'exécution financière

LE RAPPORT DE DEPENSES REALISEES DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU BUDGET PROGRAMME SIMPLIFIE EXERCICE 2024-2025

Dans les paragraphes ci après sont présentés une analyse financière des dépenses .

Exécution de dépenses

Dans le cadre de l'exécution du Budget Programme Simplifié (BPS) 2024-2025, les données de dépenses recueillies des projets au 30 septembre 2025 ont accusé un montant total de décaissement de l'ordre de **35, 577,959.92** dollars américains, soit une réalisation nette de 54.7%, par rapport à la prévision annuelle de dépenses. Eu égard à la réalisation de l'exercice précédent, une régression de 22.8% a été observée. Cette diminution s'explique par l'aggravation de la situation sécuritaire du pays qui a affecté généralement le bon déroulement des travaux. En effet, dans le plan global de financement défini pour le secteur à travers le plan d'opération annuel (POA) des projets 4697/GR-HA, 4353/GR-HA, AECID, EPARRDD, et les autres projets CDC, UNICEF, REGLEAU, un plan de passation de marché (PPM) a été défini pour chacun d'eux accompagné d'un plan financier annuel de décaissement. Cependant, en dépit de ces outils financiers et les révisions à mi-parcours opérées, les activités prévues dans les différents POA des projets n'ont pas pu être exécutées, selon les résultats escomptés (outcomes attendus).

PROGRAMMES	MONTANT PLANIFIES EN USD EX.24-25	MONTANTS DEPENSES EN USD EX.24-25	% DEPENSES/PRE VISIONS
GOH / TRESOR PUBLIC	\$ 2,590,091.84	\$ 977,055.64	37.72%
FONDS PROPRES	\$ 271,875.57	\$ 148,717.69	54.70%
BID / 4353/GR-HA/PAP III	\$ 12,708,554.50	\$ 6,280,954.03	49.42%
AECID / HTI-003-B	\$ 15,276,205.76	\$ 3,312,070.05	21.68%
BID / 4697/GR- HA/Grand Nord	\$ 19,582,074.87	\$ 16,982,539.27	86.72%
EPARRDD	\$ 13,945,898.65	\$ 7,390,007.31	52.99%
REGLEAU	\$ 141,000.00	\$ 131,148.61	93.01%
CDC	\$ 140,654.15	\$ 105,480.66	74.99%
UNICEF	\$ 365,474.66	\$ 249,986.66	68.40%

Ce manquement a été principalement observé dans le programme de financement de l'AECID ou bon nombre de travaux d'infrastructures hydrauliques et sanitaires sont reconduits dans le présent POA 2025-2026.

Il est à remarquer que pour les deux programmes de financement de la BID 4697/GR-HA et 4353/GR-HA plusieurs chantiers ont été réalisés, notamment ceux du Grand Nord, des Gonaïves, de Jacmel et la poursuite de certains travaux hydrauliques parmi lesquels, la pose de canalisations et de branchements à travers certaine agglomération de la Région Métropolitaine de Port-au-Prince. Il s'en suit donc sur le plan budgétaire, une réalisation nette de 86.72% et de 49.42%, respectivement pour ces deux opérations.

Pour le programme EPARRDD, la poursuite des activités prévues dans les composantes 2 et 3 a atteint un résultat acceptable par rapport aux objectifs initialement fixés. Cependant, les prochains décaissements pour les contrats avec l'UNOPS et l'UNICEF sont reprogrammés sur le présent exercice fiscal 2025-2026. Par rapport à la prévision annuelle, le projet EPARRDD affiche une réalisation de 53%.

En considérant le décaissement global de la coopération internationale, ces trois programmes de financement avoisinent à eux-seuls 89% de réalisation. Les 11% restant sont attribués aux autres projets CDC, UNICEF, REGLEAU, incluant le programme de fonds bilatéral AECID.


Au cours de l'exercice, le programme d'investissement public annoncé lors du budget rectificatif d'avril 2025, est reconduit pour le même montant sur le présent exercice 2025-2026. Par conséquent, sur les prévisions de dépenses à réaliser sur le plan interne, un décaissement de l'ordre de 1,125,773.30 USD a été observé, il en résulte une progression sensible par rapport à l'exercice 2023-2024.

En fait, pour l'exercice 2024-2025, les dépenses réalisées (financement interne et externe) sont de l'ordre de 35,577,959.90 USD pour le secteur EPA. De ce montant, 96.8% concernent la coopération internationale et 3.2% proviennent du financement national (cf. tableau T3 fichier excel). Ci-dessous, le tableau résumé de décaissements réalisés pour l'exercice fiscal terminé le 30 septembre 2025, par sous-secteurs d'activités.

Les montants de décaissement ci-dessus regroupés par sous-secteur d'activités sont tirés dans le tableau de décaissement de chaque programme de financement, dans lequel sont inscrites les dépenses réalisées au cours de la période fiscale par composantes, produits et activités. En voici par structures de dépenses les résultats obtenus sur le plan financier :

Tableau de décaissements réalisés par rubrique

Structures de Dépenses	Prévision 2024-2025	Décaissement 2024-2025	Ecart Budgétaire	% Réal
Frais Personnel	4,163,295.2	5,216,006.9	-1,052,711.7	125.3%
Achat biens et services	2,621,880.9	569,272.4	2,052,608.5	21.7%
Autres dépenses	8,361,066.8	5,464,218.6	2,896,848.2	65.3%
Service de la dette	116,927.1	5,928.6	110,998.5	5.1%
Immobilisations	3,937,595.8	389,347.2	3,548,248.6	9.9%
Investissement - Assainissement	5,332,200.8	25,674.0	5,306,526.8	0.5%
Investissement Interne EPA	1,515,151.5	0.0	1,515,151.5	0%
Investissement Externe EPA	38,973,711.9	23,907,512.2	15,066,199.7	61.3%
Total en USD	65,021,830.0	35,577,959.9	29,443,870.1	54.7%

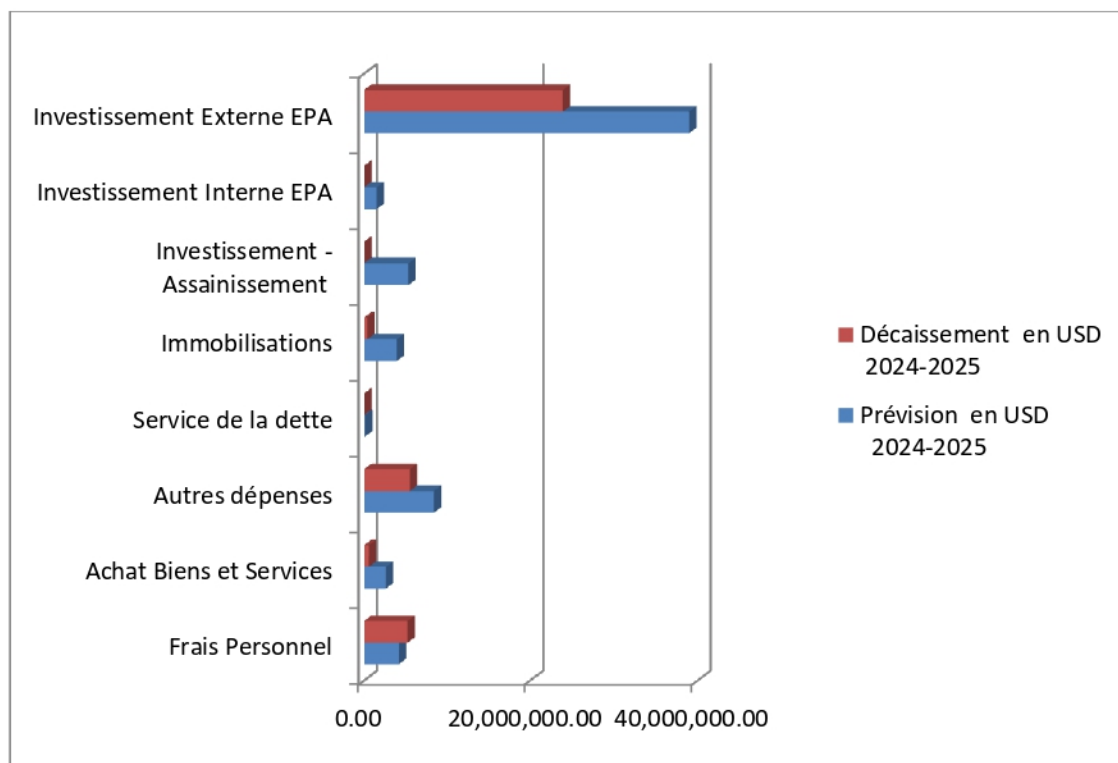

Les montants de décaissement ci-dessus regroupés par sous-secteur d'activités sont tirés dans le tableau de décaissement de chaque programme de financement, dans lequel sont inscrites les dépenses réalisées au cours de la période fiscale par composantes, produits et activités.

Ci après, les résultats obtenus sur le plan financier par programme de financement :

Décaissement de Fonds – Trésor Public & Ressources domestiques

Ordinairement, les financements provenant de la coopération internationale injectés dans le secteur EPA en matière d'investissement passent d'abord par le pouvoir central puis transférer à la DINEPA, sous la base d'un Accord de Rétrocession. Dans le présent budget national 2025-2026, une tranche de ces financements d'une valeur de 5,226,000,000.00 HTG équivalent à environ 40 millions dollars américains est inscrite, en termes d'investissement public. En plus de cette valeur, le Trésor Public a octroyé une allocation budgétaire (fonctionnement & investissement) de 367,374,472.00 HTG à la DINEPA pour son renforcement sur le plan institutionnel. Incluant les dépenses réalisées sur les fonds propres de l'Institution, pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, un décaissement de 3.2% par rapport à la réalisation globale a été observé sur les financements internes

(Trésor Public et fonds domestiques), en termes de coût de renforcement. Il est à remarquer que les travaux de SAEP prévus à hauteur de 200 millions de gourdes lors de la rectification du budget national n'ont pas été réalisés, en dépit que les dossiers des FIOP ont été déposés au Ministère de la planification et de la Coopération Externe (MPCE). Le financement de ces travaux est reconduit dans le budget du présent exercice fiscal 2025-2026.

Décaissement de Fonds – Projet HA-L 1103 P-au-P III

Ce programme sous financement de la BID, intitulé « Projet Eau Potable et Assainissement à Port-au-Prince -3», a été institué, dans le but de poursuivre avec les travaux entamés par les deux premiers programmes de financement : P-au-P -1 et P-au-P -2, sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. En effet, des travaux ont été déjà réalisés en termes de construction d'infrastructures hydrauliques au cours des programmes précédents. Depuis le début du programme de financement en décembre 2017, un plan directeur englobant les activités à réaliser a été établi pour un montant total de 65,000,000.00 USD. Depuis le début des opérations du projet en décembre 2017, un plan directeur englobant les activités à réaliser a été établi pour un montant initial de 65,000,000.00 USD. Après constat de réalisation de travaux impactés par le climat d'insécurité du pays au cours des deux dernières années, le projet a bénéficié une prolongation ramenant au 20 décembre 2026, la date de clôture des activités. Au 30 septembre 2025, le montant total de décaissement cumulé se chiffre autour de 46,595,547.11 USD, soit un taux de décaissement de 71.7%. De ce montant, 58.0% représentent les coûts d'investissement directs injectés dans le secteur. Pour l'exercice 2024-2025 eu égard à la prévision de décaissement, une réalisation de 49.4% a été observée, il s'en suit un poids de 17.7% par rapport au décaissement global de l'exercice. Dans cette même veine, une régression de 14.4% est constatée en glissement annuel. Cette situation s'explique par le fait que les travaux dans les zones de Mariani, de Diquini, de Martissant n'ont pas pu être complétés à cause du climat de troubles permanents orchestrés dans ces zones limitrophes de la Capitale de Port-au-Prince. Ces zones, fortement exposées à l'insécurité, ont été confrontées à une série de contraintes aggravantes : présence de groupes armés, pertes de matériel, difficultés logistiques répétées et absence d'un encadrement étatique suffisant. Malgré les efforts déployés par les entreprises contractantes et les démarches de médiation engagées par la DINEPA, la situation n'a pas permis une reprise effective des travaux sur certains marchés surtout au niveau de la commune de Carrefour. À l'exception des marchés B4 et B5, qui ont enregistré des avancées notables avec la pose de branchements particuliers, l'ensemble des autres chantiers demeure inactif à ce jour.

Les travaux d'extension de conduite « Marché-M, Vivy Mitchel » sont en cours d'exécution . A l'analyse des dépenses exécutées dans le POA du projet, il a été constaté la réalisation des réseaux condominiums à Vivi Mitchel, la reprise des travaux de branchement dans les Agences du CTE/RMPP et la fourniture de pompes et accessoires hydrauliques pour les

forages F (lot-1) et forages T (lot-2). Dans les composantes III et IV liées à l'investissement un décaissement total de 4,618,603.90 USD sur une prévision de 10,048,249.80 a été réalisé, ce qui représente 46.0% . D'autres activités liées au renforcement institutionnel telles que : suivi, évaluation et audit ont réalisées dans les composantes I, II et V pour une valeur totale de 1,662,350.10 USD.

Décaissement de Fonds – Programme de Reforme Secteur EPA HTI-003-B.

Ce programme instauré Par l'Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement (AECID) depuis le début de la reforme du secteur EPA en 2009, visant le financement de nouvelles infrastructures de base, a connu des hauts et des bas. Au cours de la période considérée, des changements en profondeur ont été opérés dans le plan initial, amenant ainsi une réorientation du financement à travers deux (2) documents majeurs : un plan opérationnel général (POG) en 2015, et un POG révisé en décembre 2022. Ce programme visant la mise en place des travaux d'infrastructures à l'échelle nationale du pays, est découpé en plusieurs catégories de dépenses spécifiques : Investissement, Assistance technique internationale et renforcement de la capacité institutionnelle de la DINEPA, des OREPA et des Exploitants. Sur un financement initial de 100,359,000.00 USD, 79.7% ont été décaissés au 30 septembre 2025. Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2025, il a été constaté une réalisation de 21.7% sur les 15.3 millions de dollars américains de décaissement prévu, soit une régression de 75.3% par rapport à la réalisation de l'exercice précédent. Du coût annuel de réalisation, 82.2% sont consacrés à l'investissement. Cette faible performance se justifie par les retards considérables accumulés dans les travaux de réhabilitation des SAEP de Hinche, de Fort-Liberté, de Saint-Louis du Nord ainsi que les travaux de construction de la STEB de Limonade (réf POA 2024-2025 exécuté). Dans leur ensemble, les travaux prévus dans le programme d'investissement annuel n'ont pas pu être exécutés à hauteur de 30%, en raison du blocage quotidien des voies d'accès, empêchant la disponibilité de matériels et de fournitures sur nos différents chantiers. Il n'a été également constaté aucune avancée véritable dans le dossier de construction des bâtiments administratifs des trois (3) OREPA (Nord, Sud et Centre), incluant le bureau des Centres Techniques d'Exploitation (CTE) tels que : Cabaret, Jérémie, Mirebalais et Fort-Liberté. Le chantier de construction du bâtiment administratif des OREPA Nord et Centre dont le démarrage des travaux est initié depuis l'année 2023, n'a été l'objet d'aucune avancée significative au cours de la période. A noter que pour l'ensemble de ces travaux de construction, un montant de 2,850,860.00 USD a été dégagé dans le POA. Il est à remarquer que sur un coût total d'investissement de 10.5 millions USD prévus pour les travaux de SAEP, seulement 26.8% ont été réalisés –et cette réalisation concerne les travaux de construction et de réhabilitation des SAEP de Hinche, de Jérémie, de Fort-Liberté, de Saint-Louis du nord, de Petit-Goâve, et les travaux de construction du réseau de distribution , lot 1 & 2 Cap-Haitien. Les travaux du réseau de distribution de la

ville de Miragoane ainsi que le réservoir de 150m³ du SAEP de Lafond ont été réceptionnés en juin 2025. Il est à noter que les travaux de Cabaret et d'Arcahaie sont suspendus en raison des problèmes de sécurité. Le programme de financement a bénéficié d'une extension qui amènera la clôture définitive des activités au 31 décembre 2026.

Décaissement de Fonds – Projet HA-L 1135 « Eau Potable & Assainissement du Grand Nord »

Le programme de financement de la BID dénommé « Projet Eau et Assainissement du Grand Nord » a été paraphé par le gouvernement haïtien et rétrocédé à la DINEPA pour un montant de 125,000,000.00 USD sur une période de 5 ans. Ce nouveau programme qui vise la construction des infrastructures hydrauliques dans les zones urbaines, périurbaines et rurales comporte dans son budget initial cinq (5) grandes composantes : Les composantes II et III englobant les investissements urbains et ruraux représentent à elles seules 76.6% de l'enveloppe ; les composantes I et IV couvrant les coûts d'exploitation des CTE de la région et les coûts de gestion du projet affichent un taux de 20.6% et la composante V appui au Covid-19 figure pour 2.7%. Suivant le tableau des opérations OPS-1 produit par la BID, il a été observé au 30 septembre 2025, un décaissement cumulé de 66,753,814.48 USD USD, soit un taux de réalisation de 53.4% par rapport au montant initial. De cette valeur décaissée, 60% représentent le coût des investissements injectés dans les travaux de SAEP en milieu urbain et rural. Pour l'exercice fiscal arrêté au 30 septembre 2025, le projet a réalisé un décaissement de 86.7%, au regard à la prévision annuelle. Sous la base de cette performance, une progression de 20.1% a été observée en glissement annuel. Au cours de la période, de nombreux travaux hydrauliques ont été réalisés, parmi lesquels les travaux de construction du réseau d'eau potable de Cap-Haïtien, les travaux d'extension du réseau des Gonaïves, les travaux d'extension du réseau de Jacmel ainsi que la reprise des travaux de forages du Cap. Ces travaux insérés dans la composante II du POA ont été réalisés pour une valeur globale de 11,007,266.55 USD. Dans le cadre des contrats de performance de l'ATPR du Cap-Haïtien et de celui des Gonaïves un décaissement de 3,850,653.70 USD a été observé. D'autres activités liées au renforcement institutionnel prévues dans les composantes I et IV ont été réalisées pour une valeur de 2,124,619.02 USD. Suite à la dernière demande d'extension validée par le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), la nouvelle date de clôture du projet est arrêtée au 22 avril 2028.

Décaissement de Fonds – Projet IDA Grant E 170 HT - EPARRDD

Le programme de financement intitulé «Projet Eau Potable et Assainissement Rural, Résilient, Durable et Décentralisé (EPARRDD) » est signé en mai 2023 par le gouvernement haïtien et la banque mondiale, puis rétrocéder à la DINEPA, pour exécution. Ce programme de financement d'une valeur de 80,000,000.00 USD vise à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène en milieu rural et dans les petites villes.. Trois contrats majeurs d'assistance technique sont exécutés dans le cadre de ce projet .Il s'agit :

- 1) De l'Assistance Technique pour une amélioration de l'accès à l'assainissement de base (composante I).
- 2) De l'Accord de collaboration pour la mise en œuvre de la sous- composante 2.1 du Projet EPARRDD (composante II)
- 3) De l'Assistance technique basée sur les résultats pour l'accompagnement des communautés et la gestion des sous projets EPAH dans les localités de 15 communes du Grand Sud. (Composante II)

Le budget initial du projet est reparti en quatre (4) grandes composantes. La composante II dans laquelle est prévue le développement des services Eau, Assainissement et Hygiène englobe 75% du budget total.

Au cours de l'exercice 2024-2025, à travers l'UNOPS, des matériels et équipements (véhicules, motos, matériels de bureau et informatiques) ont été livrés à la DINEPA et quatre (4) études sont en cours de finalisation pour la construction et la réhabilitation des SAEP de Anse Rouge, Mole Saint Nicolas, Décovil et Baint . Un avenant au contrat signé avec UNICEF a augmenté l'enveloppe pour les interventions d'urgences dans les camps des déplacés internes de la zone métropolitaine de Port au Prince et des départements du Centre et du Sud. Il a été noté également la phase finale des travaux de construction du SAEP de Lascahobas. Sur les 13.9 millions de décaissement prévus pour l'exercice, une réalisation de 53.0% a été constatée, soit une forte régression de 109.7% par rapport au décaissement de l'exercice précédent. Au 30 septembre 2025, le montant de décaissement cumulé se chiffre à 22,890,084.60 USD, soit un taux de réalisation de 28.6% eu égard au montant initial du projet. Vu sous cet angle, le décaissement moyen annuel sur les quatre (4) prochaines années est estimé à 14.3 millions USD.

Décaissement de Fonds – Projet CDC, REGLEAU & UNICEF

Pour les autres petits projets sous financement de HELVETAS, CDC et UNICEF, l'objectif visé est similaire - améliorer la qualité de services offerts aux populations par le contrôle du système de chloration et la mise en place des mécanismes de contrôle pour la gouvernance du secteur

avec l'appui des autorités locales. En effet, les programmes CDC et UNICEF, après plus d'une décennie d'appui au secteur EPA, étant arrivés à terme au cours de la seconde moitié de l'année fiscale. Conséquemment à cette échéance de mi-parcours, pour ces trois (3) programmes de financement, au début de l'exercice 2024-2025, une prévision de décaissement combinée en appui avec le secteur a été enregistrée pour une valeur de 647,128.8 dollars américains. Cette somme représente 1% du montant global de prévision disponible pour le secteur tous fonds confondus. Il est à remarquer que ces projets combinés affichent au 30 septembre 2025 un taux de réalisation de 75.2%, soit un taux de croissance négative de 8.4% et un poids de 1.4% par rapport au décaissement global de la période. Il est à noter que la clôture du programme REGLEAU, sous financement de Helvetas est fixée au mois d'avril 2026.

Etat d'avancement des activités

CADRE DE RESULTATS

Bien que les programmes/projets soient antérieurs avec la stratégie décennale de la DINEPA, ils sont tous compatibles avec le cadre logique de la DINEPA et les indicateurs des résultats dénotent une progression vers l'atteinte des objectifs spécifiques préalablement définis.

Les indicateurs de résultats et les indicateurs de produits sont renseignés dans le canevas des tableaux 4 et 5 du Budget Programme Simplifié.

L'atteinte des résultats est progressive et est fonction des moyens mis en place, le décompte des bénéficiaires de chaque activité se fera nécessairement au cours ou à la fin des évaluations des projets /programmes.

Comme précédemment expliqué, cet exercice de Budget Programme Simplifié est un outil de suivi des investissements du secteur et les méthodes de collecte et d'analyse s'affineront avec le temps. En l'occurrence, les fiches des projets/programmes présentent les informations des tableaux 4 et 5 de l'exécution budgétaire du budget programme simplifié 2024-2025 et l'avancement des activités les plus significatives de la période en attendant l'impact en nombre de bénéficiaires.

Globalement les activités ont été entamées sur la base de la passation de marchés et des cahiers de charges et des ressources leurs ont été attribuées.

Pour l'exercice 2024-2025, les activités en lien avec le développement des infrastructures eau potable et assainissement n'ont pas été complétées à la date prévue en raison de plusieurs contraintes en termes de suspension des contrats, de programmation et suivi des

investissements et d'autres facteurs externes. Ces activités accusent des retards importants en raison du contexte sécuritaire et les délais et ajustements d'exécution seront nécessaires pour permettre que les objectifs des projets /programmes puissent permettre le développement du secteur EPA .

Ci après est présenté de manière succincte les avancements des activités en cours .

Cadre des Résultats

APPUI ANNUEL DU GOH AU SECTEUR EPA

1. Appui Annuel du Gouvernement Haitien au Secteur de l'Eau Potable et de l'Assainissement-					
Champ géographique	Commune de Kenscoff (Département de l'Ouest), de Chansolme (Département du Nord Ouest) et la commune de Pilate (Département du Nord)				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et 4 Orepa)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Renforcer les capacités du secteur EPA pour assurer la gestion des services et pour améliorer la qualité de vie des familles par un accès durable à l'eau potable	Augmentation du nombre de personnes ayant accès à l'eau potable dans les communes de Kenscoff (département de l'Ouest), de Chansolme (Département du Nord Ouest) et la commune de Pilate (Département du Nord)	Nombre additionnel de ménages ayant accès à de l'eau potable	Réhabilitation et extension SAEP	Nombre de SAEP réhabilités	0
				Nb des dossiers FIOP soumis au MPCE & MEF	17
				Nombre des périmètres rapproché pour la protection des captages construits/réhabilités	0
		Augmentation en % du nombre d'abonnés		Nb de branchements posés	0
		Nb additionnel de personnes ayant accès à une quantité quotidienne d'eau égale ou supérieure à 20 l/ personne / jour à travers les points d'eau construits/réhabilités		Nb de kiosques construits/réparés	0
	Améliorer l'accès à l'eau potable dans les sites vulnérables	Quantité d'eau fournie par camion en urgence aux personnes affectées en zone urbaine par le cholera, le déplacement (IDP, Rapatriés)	Interventions Eau Potable, Assainissement & Hygiène dans les camps des déplacés.	Nb de personnes dans des contextes humanitaires bénéficiant de services d'eau potable appropriés	0
	Améliorer l'accès à l'assainissement dans les sites vulnérables	% de la population ayant accès à un assainissement de base, y compris la gestion des excreta, aux familles déplacées vivant dans des camps ou hébergées dans les communautés urbaines et peri-urbaines;		Nb de camps touchés bénéficiant des services de vidanges et fournitures d'assainissement (kit d'hygiène)	0
	Renforcer la gestion des services d'eau à l'échelle nationale	Nb de structures ayant le personnel adéquat pour la gestion des services EPA au niveau national	La gestion des services d'eau est renforcée	Nb de contrats de personnel pris en charge par le Trésor Public	205
N.B.: Les fonds publics pour les investissements n'ont pas été alloués pour l'exercice en dépit de la soumission de projets. Le financement est donc reporté pour l'exercice 25-26					

Au cours de l'exercice 2024-2025, Les faits marquants de l'année ont été les suivants :

La préparation et la présentation au Ministère de l'Economie et des Finances via le Ministère des Travaux Publics Transports et Communications de 17 dossiers FIOP répartis comme suit :

- 9 dossiers de réhabilitation et d'extension de SAEP ;
- 7 dossiers de protection de captages de sources ;
- 1 dossier d'intervention d'urgence -fourniture d'eau et de services d'assainissement dans les camps des déplacés de la Région Métropolitaine de Port de Prince.

Aucun décaissement n'a été accordé pour les investissements durant l'exercice 2024-2025. Le financement recherché n'a pas été accordé cependant, pour l'exercice 2025-2026, ces dossiers seront resoumis.

Il est à noter que les fonds de ce programme sont issus du budget annuel du Gouvernement Haïtien et ce programme finance la grande majorité du personnel de la DINEPA et des OREPA, des URD et des TEPAC. Soit un effectif de 205 personnes. Ce financement permet à l'institution de fournir une assistance technique et consultative aux parties prenantes pour les aider à renforcer leur gestion et à promouvoir les bonnes pratiques de construction.

APPUI ANNUEL RESSOURCES DOMESTIQUES DINEPA

2. Appui Annuel - Ressources Domestiques DINEPA					
Champ géographique	National				
Champ institutionnel	DINEPA - OREPA				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Appui au renforcement de la capacité institutionnelle de la DINEPA	La redevance des exploitants contribue régulièrement aux frais de fonctionnement de la DINEPA Centrale	% de contribution des redevances dans des frais courants de la DINEPA	Renforcement de la gestion des services par la prise en charge des exploitants	Nb d'exploitants régulés par la DINEPA	12
Appui à la Réforme Institutionnelle du Secteur (DINEPA, OREPA, Exploitants, ...)	Les ressources générées par les exploitants contribuent régulièrement aux frais de fonctionnement et d'exploitation des structures du Secteur EPA	moyenne % ratio dépenses/ recettes réalisées par les exploitants EPA	Suivi de la performance des Exploitants urbains et ruraux par la DINEPA et les OREPA	Nb de rapports de performance des exploitants validés	17
			Renforcement de la gestion des services des Stations de Traitement des Excrétas et des Boues (STEB)	Nombre de mètre cube (m3) de boues reçus et traités dans les STEB	100

Ce programme supporte essentiellement la composante de renforcement institutionnel notamment les dépenses de fonctionnement non couvert par les partenaires techniques. Les montants proviennent des redevances perçues sur les exploitants et aussi sur la vente de DAO. Pour l'exercice 2024-2025, 12 exploitants urbains ont versés la redevance de 4% à la DINEPA et cette redevance représente 6% dans les dépenses globales réalisées par la DINEPA.

Pour rappel, un rapport de performance est établi chaque trimestre par la DINEPA pour le suivi de la gestion financière des exploitants.

PAPIII

Le programme intitulé « Eau Potable et Assainissement de Port-au-Prince III (Don 4353 /GRHA) » constitue le principal projet actuellement mis en œuvre dans la région ouest, notamment dans la Région Métropolitaine de Port-au-Prince.

Le programme Port-au-Prince III (PAP3) a été revu en considérant les problèmes sécuritaires conçu pour fournir de l'eau potable à une partie importante de la zone de Vivy Mitchell et des quartiers avoisinants, y compris une section de Puits Blain et du haut Tabarre, et aussi le Carrefour.

3. Eau Potable et Assainissement à Port-au-Prince III-					
Champ géographique	Région Métropolitaine de Port au Prince et le Département de l'Ouest)				
Champ institutionnel	Service public EPA (DINEPA - Orepa Ouest - CTE RMPP)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires de la population de Port-au-Prince et des communautés rurales, via une offre de services durables d'eau et d'assainissement.	Améliorer l'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service des eaux et les pratiques d'hygiène dans la RMPP.	Pourcentage de ménages ayant accès à un service d'eau amélioré dans la RMPP	Investissements dans des ouvrages urbains d'eau potable et assainissement	Nb de réservoirs construits & réhabilités	0
				Nb ml de conduites nouvellement installés (adduction et refoi)	8278
				Nb branchements installés au niveau des ménages	504
				Nb Mimi réseau condominaux installés	0.2
				Nb Kiosques construits ou réhabilités	0
		Pourcentage de femmes travaillant dans des kiosques nouvellement construits ou réhabilités à Carrefour et au Centre-Ville.		Nb SAEP construits et/ou réhabilités dans les zones urbaines	0.5
	Améliorer l'accès aux services d'eau et d'assainissement et à l'hygiène dans des zones rurales de l'OREPA-Ouest affectées par le cyclone Matthew	Nombre de nouveaux ménages en milieu rural ayant accès à un service d'eau amélioré	Investissements dans des ouvrages d'eau ruraux	Nb Outil de planification rural développé	0
				Nb Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les zones rurales	0
				Nb Réseau d'eau potable construits ou réhabilités dans les zones rurales	1.5
				Nb Points d'eau construits ou réhabilités	0
	Nombre de nouveaux ménages en milieu rural ayant accès à un service d'assainissement et d'hygiène amélioré	Investissements dans des ouvrages ruraux d'eau	Appui pour la COVID 19 - Fonds d'Urgence Sanitaire	Nb Forages construits, réhabilités et équipés	13
				Nb Campagnes de sensibilisation et Communication sur les bonnes pratiques d'hygiène réalisées	0

3. Eau Potable et Assainissement à Port-au-Prince III-

Champ géographique Région Métropolitaine de Port au Prince et le Département de l'Ouest)

Champ institutionnel Service public EPA (DINEPA - Orepa Ouest - CTE RMPP)

Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer la qualité de vie et les conditions sanitaires de la population de Port-au-Prince et des communautés rurales, via une offre de services durables d'eau et d'assainissement.	Réglementation effective par la DINEPA au niveau central et déconcentration au niveau de l'OREPA-Ouest.	Nombre de CTE de la DINEPA qui fonctionnent conformément au cadre institutionnel de régulation et de planification	Renforcement Institutionnel du CTE-RMPP, de l'OREPA OUEST, de l'OREPA NORD, et de la DINEPA	Nb Campagne de communication et de marketing pour amélioration des condition d'hygiène de base .	0
				Campagnes de communication et de marketing dans les zones urbaines du projet pour améliorer la connectivité au réseau d'eau potable, l'accès a l'assainissement et l'hygiène , exécutées	1
				Nb contrat de consultations d'appui à la DINEPA pour la régulation signé et appui en matériel	3
				Nb bâtiment construit pour l'OREPA Ouest ainsi que les entités prises encharges.	0.45
				Nb Entités prises en charge par le projet 4353 en termes de Salaires, matériels roulant et de cout de fonctionnement	2
				Nb de Contrats d'appui à l'OREPA Ouest pour la supervision technique et la réalisation d'études APD, travaux urbains & ruraux signés	0
				Nb lot de matériels pour la DINEPA et ses structures fournis	0
				% avancement de l'exécution du projet 4353 (Salaire Personnel, Formation, acquisition véhicules, réalisation d'audit, suivi, évaluation, ateliers et autres réalisés par le projet)	73%
	Améliorer la viabilité financière du CTE-RMPP	Le Ratio opérationnel (revenu opérationnel annuel / dépenses opérationnelles annuelles) du CTE RMPP est supérieur à 1	Appui à l'exploitation et à l'entretien du CTE RMPP	Nb Accords de subvention au CTE pour la facture de l'EdH signés	1
				Nb Contrat d'approvisionnement en combustible signé	3
				Subvention au profit du CTE RMPP dans le cadre d'appui à l'exploitation et au fonctionnemet	0
				Nb Contrats d'assistance technique, sociale et opérationnelle pour l'amélioration de la desserte en eau dans les quartiers défavorisés de la RMPP signés	0

HTI-003B AECID

Le Programme Fonds Bilatéral HTI 003B a obtenu une prolongation jusqu'au 31 décembre 2026 pour poursuivre la mise en œuvre des activités définies. Pour rappel, ce programme a financé la mise en place de la Réforme et le déploiement effectif des structures déconcentrées. La DINEPA à travers ce financement fait des interventions au niveau des chefs lieux des départements et de certaines villes.

Le programme fourni un appui au fonctionnement de la DINEPA par la prise en charge de la location de l'annexe de la DINEPA, de personnel transversal, des services de sécurité des bâtiments – de l'acquisition de fourniture de bureau et de la fourniture de carburant.

Durant l'exercice 2024-2025, plusieurs chantiers ont accusé des retards considérables à cause de l'insécurité d'une part et des problèmes de trésorerie des entreprises.

4. Programme de Reforme du Secteur EPA en Haiti-

Champ géographique Echelle Nationale- Tous les départements du pays

Champ institutionnel Service public EPA (Dinepa et 4 Orepa)

Objectifs de développement		Résultats (outcome)		Résultats (output)	
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Contribuer de manière décisive à la réalisation par Haiti de la cible 10, OMD 7, qui consiste à réduire de moitié la population n'ayant pas accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base, jetant ainsi les bases d'une transformation à long terme et durable du secteur de l'eau et de l'assainissement.	Augmentation du nombre de personnes ayant accès à l'eau dans les zones urbaines et périurbaines ciblées par le programme	# de ménages ayant accès à l'eau à travers les réparations et amélioration des systèmes existants (villes de plus de 10.000 habitants non prioritaires)	Réparations des SAEP dans les villes non prioritaires	Nombre de SAEP réparés dans les villes de plus de 10.000 habitants non prioritaires	2
		#de ménages ayant accès à l'eau à travers les réparations et amélioration des systèmes existants (11 villes de plus de 10.000 habitants prioritaires).	Réhabilitation, Construction et Extension SAEP urbains et périurbains dans 12 villes de plus de 10,000 habitants .	Nombre de SAEP urbains réhabilités et/ou nouvellement construits dans le 12 villes prioritaires de plus de 10.000 habitants	2.5
				Nombre de sources d'eau protégées (SAEP urbain)	1
	Augmentation personnes ayant accès à l'eau contrôlé dans les localités rurales (population < 10000 habitants)	#de ménages ayant accès à l'eau à travers les réparations et amélioration des systèmes existants (11 villes de plus de 10.000 habitants prioritaires), dont l'accès à l'assainissement est aussi amélioré (seulement au CAP)		Nombre de ménages touchés par les travaux	250
		# de personnes ayant accès à l'eau à travers les réparations et amélioration des systèmes ruraux existants.	Réparations de SAEP dans les localités rurales.	Nombre de SAEP dans les localités de moins de 10,000 habitants	1
				Nombre de Sources protégées (SAEP rural)	0
				Nombre de CAEPAS existants renforcés par les URD	0
				Nombre d'hypochlorateurs installés dans les SAEP des localités prioritaires du programme.	0

4. Programme de Reforme du Secteur EPA en Haiti-

Champ géographique Echelle Nationale- Tous les départements du pays

Champ institutionnel Service public EPA (Dinepa et 4 Orepa)

Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
Contribuer de manière décisive à la réalisation par Haïti de la cible 10, OMD 7, qui consiste à réduire de moitié la population n'ayant pas accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base, jetant ainsi les bases d'une transformation à long terme et durable du secteur de l'eau et de l'assainissement.	Augmentation du nombre de personnes ayant accès à des systèmes appropriés d'assainissement	# élèves (garçons et filles) des écoles publiques dans les villes et localité rurales bénéficiant d'un accès à des installations sanitaires améliorées;	Construction et rehabilitation système basique d'assainissement dans les Ecoles Publiques et les lieux publics	Nombre de cabines construites dans les écoles publiques et les lieux publics	0
		# de ménages dont les eaux usées sont traitées à travers des station de traitement mise en place par le Programme	Construction de rehabilitation des Stations de traitement des excréta	Nombre d'écoles bénéficiant des blocs construits ou réhabilités par le Programme	0
				Nombre de stations d'excreta construites	0.1
	Amélioration des Conditions d'hygiène de base	# d'activités/campagnes de sensibilisation pour la population en hygiène et assainissement	Mise en oeuvre de de la strategie assainissement	Nombre de maçons formés	0
				Nombre d'officiers sanitaires formés par la DINEPA	0
				Nombre de personnes atteint par les activités de promotion en hygiène	0
	Les institutions prévues par la Loi Cadre (2009) sont mises en place et renforcées de maniere durable pour la fourniture des services de base	Mise en place des OREPA	Mise en place et Renforcement à moyen terme des Entités de la Réforme (URD, OREPA, TEPAC)	Nombre de protocoles signés entre les OREPA et les CAEPA	0
		Mise en place des URD	Renforcement Organisationnel de la DINEPA	Nombrede batiments construits pour les OREPA	0.4
		#d'entités gouvernementales (au niveau local, régional, de l'État ou national) qui ont reçu une formation pendant le programme		Nombrede personnes formés pour la maitrise d'ouvrage et la gestion de services;	2
	Amélioration et Augmentation du niveau de service fourni par les exploitants (CTE)	%Augmentation du nombre d'abonnés actifs	Renforcement et appui aux CTE pour la mise à niveau de l'opération pour les villes de plus de 10,000 habitants	Nombrede campagnes de visibilité conçus et réalisés pour la DINEPA;	0
				Nombre OREPA, CTE bénéficiant de location et ou de réaménagement des locaux. bénéficiant de location et ou de réaménagement des locaux.	2
				Nombrede CTE appuyés en ressources humaines, formation, équipements et/ou matériels.	4
				Nb de personnel recruté comme appui en ressources humaines pour l'exécution du Programme	11
				Nbre de livrables produits pour l'année	0
				Nb de laboratoire mis en place dans les CTE pour l'amélioration de la qualité des services urbains et ruraux	0
				Nb de cadastre technique et commercial préparés et actualisés	4

GRAND NORD 4697-GR/HA

Le Projet d'Eau, d'Assainissement et d'Hygiène dans les Zones Urbaines, Périurbaines et Rurales du Grand Nord d'Haïti est le projet le plus important en terme de ressource financière .Les résultats des composantes eau potable , assainissement et renforcement institutionnel sont essentiels pour l'autonomie financière des exploitants de la région Nord.

5- Eau Potable et Assainissement dans le Grand Nord (BID)					
Champ géographique	Cap Haïtien, Jacmel, Gonaïves, commune de Cap Haïtien (Département du Nord), (Département du Nord Ouest) et les zones rurales de l'OREPA Sud ,de l'OREPA Nord et de l'OREPA Centre				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Nord)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer les conditions de vie des ménages dans le Grand Nord d'Haïti	L'accès aux services d'eau et d'assainissement des ménages, la qualité du service d'eau et les pratiques d'hygiène se sont améliorés dans les villes du Nord d'Haïti.	Nb de ménages ayant accès à l'eau gérée de manière sûre à Cap Haïtien	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb branchements installés dans les SAEP couverts par le Projet	1705
			Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb forages construits, équipés et fonctionnels	4
			Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb Reservoir construit pour l'alimentation en eau	1
			Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb ml Lignes d'adduction, de Refoulement et de distribution posées pour l'alimentation en eau dans le Grand Nord	53000
		Nb de nouveaux ménages ayant accès à un service l'eau potable géré de façon sûre dans les autres villes couvertes par le programme	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb SAEP construits pour l'alimentation en eau en zone urbaine	0.7
			Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb d'études de Mini réseaux condominial réalisées et mis en place	2

5- Eau Potable et Assainissement dans le Grand Nord (BID)					
Champ géographique	Cap Haitien, Jacmel, Gonaives, commune de Cap Haitien (Département du Nord), (Département du Nord Ouest) et les zones rurales de l'OREPA Sud, de l'OREPA Nord et de l'OREPA Centre				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Nord)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer les conditions de vie des ménages dans le Grand Nord d'Haiti	Donner accès à un service d'eau et d'assainissement élémentaire aux ménages dans les localités rurales (SC) couvertes par le projet.	Nb ménages avec un accès basique aux services d'eau dans les zones rurales du Nord d'Haiti	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb de SAEP système gravitaires construits et Nb kiosques construits	3
			Amélioration de la gestion des boues à partir des solutions individuelles	Nb projet pilote mise en oeuvre pour amélioration de la gestion des boues à partir de solutions individuelles	0
		Pourcentage de ménages à Cap Haïtien ayant un accès de base à l'eau à partir des kiosques branchés au réseau	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène dans les localités du Nord	Nb points d'eau construits ou réhabilités	0
		Pourcentage de ménages avec un accès basique aux services d'hygiène dans les zones rurales du Nord d'Haiti	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène dans les localités rurales du Nord	Nb petit SAEP construits/réhabilités en zone rurale	0.3
			Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène dans les localités rurales du Nord	Nb branchements d'eau d'assainissement et d'hygiène dans les bâtiments publics (écoles, centres de santé et marche)	0
			Amélioration de la gestion des boues à partir des solutions individuelles	Nb projet pilote mise en oeuvre pour amélioration de la gestion des boues à partir de solutions individuelles	0
		Pourcentage de la population faisant la défécation à l'air libre dans les quartiers à Cap Haïtien	Investissement prioritaire en eau potable assainissement et hygiène est réalisé dans les localités urbaines	Nb Campagne de changement comportement pour la fin de la défécation à l'air libre	0
			Amélioration de la gestion des boues à partir des solutions individuelles	Nb projet pilote mise en oeuvre pour amélioration de la gestion des boues à partir de solutions individuelles	0

5- Eau Potable et Assainissement dans le Grand Nord (BID)					
Champ géographique	Cap Haitien, Jacmel, Gonaives, commune de Cap Haitien (Département du Nord), (Département du Nord Ouest) et les zones rurales de l'OREPA Sud, de l'OREPA Nord et de l'OREPA Centre				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Nord)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer les conditions de vie des ménages dans le Grand Nord d'Haiti	Les CTE d'Haiti améliorent la durabilité des services d'eau et d'assainissement et les compétences du régulateur et des structures décentralisées sont renforcées.	Pourcentage de la population faisant la défécation à l'air libre dans les quartiers à Cap Haitien	Investissement prioritaire en eau potable ,assainissement et hygiène dans les localités du Nord	Nb Campagne de communication et de marketing visant à améliorer l'accès à l'assainissement et à l'hygiène	0
			Des actions/interventions sont réalisées à l'échelle nationale en réponse au COVID 19	Nbde points de lavage des mains construits et mis en place	0
			Investissement prioritaire en eau potable ,assainissement et hygiène dans les localités du Nord	Nb Formation et ateliers organisés pour l'amélioration des conditions d'hygiène de la population	0
		Nb de CTE qui fournissent les données d'exploitation conformes aux demandes du régulateur	Les Institutions du secteur sont renforcées dans leurs missions de régulation	Nb Campagne de communication et de transparence réalisée pour la connexion du système d'eau	0
			Amélioration de la réglementation du secteur et de la gestion technique et commerciale des CTE	Nb Cadastres commercial réalisés pour l'amélioration de la gestion des CTE; acquisition et installation logiciel	0.3
			Renforcement de la capacité institutionnelle de la DINEPA, par la maîtrise de la régulation du secteur et le partage d'expérience pour l'amélioration des services EPA. (cout fonctionnement et salaire)	Nb services EPA améliorés	5

5- Eau Potable et Assainissement dans le Grand Nord (BID)

Champ géographique	Cap Haitien, Jacmel, Gonaives, commune de Cap Haitien (Département du Nord), (Département du Nord Ouest) et les zones rurales de l'OREPA Sud ,de l'OREPA Nord et de l'OREPA Centre
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Nord)

Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Améliorer les conditions de vie des ménages dans le Grand Nord d'Haiti	Les CTE d'Haiti améliorent la durabilité des services d'eau et d'assainissement et les compétences du régulateur et des structures décentralisées sont renforcées.	Nb de CTE ayant atteint l'équilibre financier (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles)	Renforcement de la capacité institutionnelle de l'OREPA Nord, par la maîtrise des ouvrages du secteur et le contrôle des exploitants par le partage d'expérience et de connaissance pour l'amélioration des services EPA	Nb contrats signés par l'OREPA Nord	18
			Renforcement capacité de l'unité de gestion du Projet 4697/GR-HA (salaire, formation, audit, évaluation ect.)	% avancement des résultats attendus obtenu par le projet	20%
			Renforcement capacité des interventions de l'unité de gestion du Projet 4697/GR-HA (acquisition de véhicule & matériel)	Nb de vehicules achetés	1
			Services de consultation nationale pour le renforcement de la capacité institutionnelle de la DINEPA et des OREPA	Nb livrables réalisés	2
Améliorer les conditions de vie des ménages dans le Grand Nord d'Haiti	Les CTE d'Haiti améliorent la durabilité des services d'eau et d'assainissement et les compétences du régulateur et des structures décentralisées sont renforcées.	Le CTE de la ville de Cap Haitien a atteint l'équilibre financier (ratio des revenus d'exploitation annuels contre dépenses d'exploitation annuelles) Pourcentage de femmes occupant des postes de gestion et opération dans le personnel du CTE de Cap Haitien	Amélioration de la réglementation du secteur et de la gestion technique et commerciale des CTE	Nb CTE dotes de materiels,d'equipement et de personnel	1
			Amélioration de la gouvernance du secteur par la prise en charge de la construction et le réaménagement de bâtiments (DINEPA OREPA, CTE)	Nb de batiments réhabilités / construits pour les structures du secteur EPA	0.45
			Amélioration de la réglementation du secteur et de la gestion technique et commerciale des CTE	% avancement contrat d'Assistance Technique par Resultats (ATPR) signé et en vigueur pour l'amélioration de la gestion des Nb de PDPP, mécanisme de plaintes, contingences environnementales et sociales dans les CTE de la région mis en place	0.25
			Des actions/interventions sont realisees à l'echelle nationale en reponse au COVID 19	Nb structures regionales renforcees pour assurer la coordination des activites	2
					0

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT RURAL RESILIENT DURABLE ET DECENTRALISE (EPARRDD)

Le Programme est entré en vigueur en juillet 2023 et prendra fin en juin 2029. Les principales activités identifiées à travers les composantes du Projet EPARRDD tournent autour de trois axes :

- l'amélioration de la durabilité des services en eau potable et en assainissement par l'approche par la demande ;
- la résilience lors de la construction des SAEP ;
- La mise en place des conditions basées sur la performance telles ; l'amélioration du SIEPA ; les critères de durabilité pour 150 SAEP, et la préparation du Budget Programme Simplifié BPS).

6. Eau Potable et Assainissement Rural, Résilient, Durable et Décentralisé (EPARRDD)					
Champ géographique	National - Tous les départements du pays				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et 4 Orepa)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Accroître l'accès à des services d'eau et d'assainissement de base inclusifs, résilients et durables en milieu rural	Améliorer les services locaux d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) pilotés par les communautés	Nombre de plans d'amélioration des services WASH pilotés par la communauté, inclusifs et tenant compte du climat, élaborés dans le cadre du projet	les sous projets locaux WASH sont mis en oeuvre dans 15 communes du Grand Sud	Nombre de SAEP répondant aux critères de résilience et durabilité	0
	Améliorer l'accès aux services d'eau de base dans les zones sujettes à la sécheresse	Nombre de Personnes ayant accès aux services d'eau potable de base dans les zones exposées à la sécheresse dans le cadre du projet, ventilées par sexe, âge et handicap	Des SAEP ruraux résilients sont construits /réhabilités et gérés	Nombre d'Etudes de faisabilité réalisées pour la construction/réhabilitation des SAEP	4
				Nombre de SAEP construits /réhabilités	1
	Améliorer l'accès aux services d'assainissement de base	Nombre de Personnes ayant accès aux services d'assainissement de base dans les zones couvertes par le projet, ventilées par sexe, âge et handicap	Des campagnes de communication et de sensibilisation en hygiène et en assainissement sont réalisées dans 10 communes prioritaires du pays touchées par le choléra,	Nombre de plans d'action d'assainissement communal élaborés	0
				Nombre de personnes qui ont bénéficié de l'ACAT (Approche Communautaire pour l'Assainissement Total)	0
				Nombre de toilettes institutionnelles en construction/ réhabilitation	0
Accroître l'accès à des services d'eau et d'assainissement de base inclusifs, résilients et durables en milieu rural	Augmentation du nombre de systèmes ruraux d'approvisionnement en eau par canalisation résilients et gérés de manière durable	Nombre de systèmes ruraux d'approvisionnement en eau résilients et gérés de manière durable avec une meilleure résilience aux sécheresses, aux inondations et aux cyclones dans l'ensemble du pays .	Amélioration de la collecte et de l'assurance de la qualité des données du SIEPA	La DINEPA a adopté un manuel d'opérations pour le SIEPA.	1
			Augmentation du nombre de systèmes d'approvisionnement en eau potable résilients et gérés de manière durable	Une liste d'au moins 25 autres systèmes d'approvisionnement en eau potable par canalisation en état de fonctionnement et gérés conformément aux six normes est enregistrée dans le SIEPA.	25
			Amélioration de la performance et de la responsabilisation de la DINEPA en matière de gestion financière	La DINEPA a adopté et publié sur son site Internet un budget-programme FY24/25 simplifié.	1

REGLEAU

Le programme a commencé en avril 2023 pour prendre fin en octobre 2025. Le Programme est géré par Helvetas cependant pour cette phase II un volet est mis en œuvre par la DINEPA à travers l'OREPA Sud.

Il faut noter que le volet Suivi / contrôle et appui technique de l'OREPA SUD aux municipalités est satisfaisant : L'OREPA SUD a encadré les collectivités dans la préparation des cahiers de charge qui ont conduit à lancer des appels d'offres pour la construction de SAEP et de blocs sanitaires .

7. Programme Renforcement Gouvernance Locale Eau et Assainissement en Haïti (REGLEAU)-					
Champ géographique	4 Communes du Département du Sud Est				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Sud)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Les communes (en tant que maitres d'ouvrages) fournissent à leurs communautés des services EPA résilients contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie et Appuyer la DINEPA/OREPA SUD dans la poursuite du renforcement de la capacité des acteurs de la gouvernance locale EPA	Renforcer la maitrise d'ouvrage communale en appuyant les municipalités dans la mise en place des services EPA	Nombre de documents élaborés pour définir le cadre global de fonctionnement pour la maitrise d'ouvrage EPA communal	Les Institutions du secteur sont renforcées dans leurs missions de régulation	Nb ateliers réalisés pour l'elaboration des reglements et autres propositions pour le transfert des services aux mairies	1
				Rapport sur la grille tarifaire élaboré	0.95
	La DINEPA et les OREPA sont renforcées dans leurs fonctions de régulation, coordination et pour l'appui technique des municipalités	Nombre de Mairies renforcées par l'OREPA Sud pour la fourniture services d'eau potable et d'assainissement	Une assistance technique est fournie aux municipalités sélectionnées par l'OREPA Sud;	Nombre de séances de formations réalisées dansle cadre de l'appui technique des SAEP -	2
				Nb Plans d'affaires global EPA élaborés à échelle de la commune ou de la section communale ;	2
				Nb de visites de chantier réalisées conjointement entre mairies et URD pour assumer les fonctions de contrôle et de suivi	53
				Nb de cahier de charge réalisé en appui aux municipalités	2
				Nb de foires réalisés sur la decentralisation du secteur	0
				Nb de réunions de coordination régionales et départementales réalisées pour assumer les fonctions de coordination	2

Projet : Sécurité sanitaire et réponse aux menaces sanitaires en Haïti

A travers le financement du CDC un volet de ce programme est géré par la DINEPA et vise à renforcer la surveillance et la qualité de l'eau. Cette subvention a pris fin au milieu de l'exercice 2024-2025. Le projet est en grande partie un projet de renforcement institutionnel. Des acquisitions ont été effectuées pour du matériels mais ceux-ci n'ont pas pu être installés en raison des problèmes logistique et aussi à cause de l'insécurité. La prise en charge des TEPAC n'a pas pu être effectuée durant l'exercice 2024-2025.

Le Projet a financé la conception d'une application pour le suivi des informations de la qualité de l'Eau Potable.

8. Renforcement Institutionnel pour mieux Reguler le Secteur EPA -					
Champ géographique	département du Sud, des Nippes, de la Grande Anse et département de l'Artibonite et du département du Nord				
Champ institutionnel	Service public EPA (Dinepa et Orepa Sud, Centre et Nord)				
Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)		
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs	Réalisations
Augmenter l'accès à l'eau et améliorer la qualité de l'eau dans les systèmes d'alimentation en eau potable afin de réduire les cas de maladies d'origine hydrique dans les communautés rurales haïtiennes.	Mise en place d'un système d'analyse et de contrôle de la qualité de l'eau dans les SAEP ruraux des départements des Nippes, du Sud, de la Grande Anse et du Nord,	Nombre de systèmes d'eau potable ruraux des départements des Nippes, du Sud, de la Grande Anse et du Nord distribuant une eau contrôlée	Installation et réparation des hypochlorateurs au niveau des SAEP ruraux des départements des Nippes, du Sud, de la Grande Anse et du Nord	Nombre nouveaux hypochlorateurs installés dans les SAEP ruraux	0
				Nombre de nouveaux rapports élaborés et intégrant le système de surveillance du chlore résiduel (SISKLOR)	0
				Nombre d'Opérateurs Formés sur les techniques de chloration et le rapportage dans le SISKLOR	0
				Nombre d'Equipements de protection individuelle distribués et utilisés	0
	Augmentation de l'accès à l'eau potable	Nombre de points d'eau amélioré construits donnant de l'eau potable	Amélioration des infrastructures WASH dans les communautés rurales du Sud, du Nord, de l'Artibonite et du Centre.	Nombre kg de produits utilisés pour la désinfection de l'eau distribuée aux structures déconcentrées	0
				Nombre de PMH transformés en kiosques avec systèmes de filtration construits	3
	Les structures de contrôle déconcentrées sont renforcées	Nombre de Techniciens pris en charge	Les structures déconcentrées sont prises en charge pour améliorer leurs capacités	Nombre de contrats de personnel signés	0

UNICEF

C'est un programme de réponse à une situation d'urgence, il est surtout question de renforcement de capacités des partenaires locaux et des bénéficiaires. Les indicateurs de résultats ne sont pour l'instant pas renseignés. Le volet institutionnel constitue l'essentiel des activités. Le programme a pris fin en juin 2025 et dès lors le financement personnel du Département de Réponses aux Urgences a été assuré pendant 6 mois par le Programme EPARRDD.

9. Programme Eau Assainissement & Hygiène _UNICEF

Champ géographique National-tous les départements du pays

Champ institutionnel Service public EPA (Dinepa et 4 Orepa)

Objectifs de développement	Résultats (outcome)		Résultats (output)	
	Objectif	Indicateurs	Objectif	Indicateurs
Les institutions et les communautés renforcent leurs capacités en matière d'EAH, en vue d'améliorer leur résilience, leur préparation et leur riposte face aux situations d'urgence	Amélioration de l'accès à l'eau dans les sites vulnérables	Quantité d'eau fournie en urgence aux personnes affectées en zone urbaine par le cholera, le déplacement (IDP, Rapatrises), les désastre naturels (inondation, cyclone, séisme) et autres catastrophes.	Les sites temporaires bénéficient des interventions en eau potable	Nombre de personnes dans des contextes humanitaires bénéficiant de services d'eau potable appropriés, grâce à des programmes soutenus par l'UNICEF (CSI/SP Indicateur 4.1.7) ;
	Amélioration de l'accès à l'assainissement dans les sites vulnérables	% accès à un assainissement de base, y compris la gestion des excréta, aux familles déplacées vivant dans des camps ou hébergées dans les communautés urbaines et peri-urbaines;	Les sites temporaires bénéficient des interventions en assainissement et en hygiène	Nombre de personnes dans des contextes humanitaires bénéficiant de services d'assainissement de base soutenus par l'UNICEF (CSI/SP Indicateur 4.1.8) Nombre de campagnes de sensibilisation pour la promotion du lavage des mains avec de l'eau et du savon aux moments critiques dans les camps de déplacés et la promotion de la gestion de l'hygiène menstruelle ; Nombre de personnes ayant reçu des fournitures essentielles pour l'EAH (y compris des produits d'hygiène) et des services essentiels
	Amélioration des Conditions d'hygiène de base	Nombre de Communes bénéficiant des campagnes de sensibilisation pour le changement de comportement et la promotion du lavage des mains avec de l'eau	Les campagnes de sensibilisation et de changement de comportement pour mettre fin à la défécation à l'air libre sont réalisées	Nombre de communes touchées par la stratégie assainissement
	Renforcement de la gouvernance du secteur EPA	Nombre de documents élaborés et diffusés	La DINEPA et les OREPA sont renforcés dans leurs missions	Nombre de formations réalisés
	Renforcement des capacités institutionnelles du secteur pour la réponse aux urgences	Nombre de structures prises en charge		Nombre de contrats de personnel signés
		Nombre de formations WASH dispensées		Nombre d'ateliers autour de la gouvernance réalisés

Conclusion

En dépit d'une année difficile marquée par le ralentissement des activités et le contexte sécuritaire limitant les mobilisations des entreprises sur le terrain, des résultats positifs ont pu être obtenus grâce aux efforts conjugués des directions concernées de la DINEPA et des OREPA, d'une part, et des coordinations de projet, d'autre part.

La finalisation durant l'exercice 2024-2025 des travaux de réhabilitation du SAEP de Miragoane, des travaux de construction du réseau de distribution de Vivy Michel marche L, les travaux de construction du SAEP de Lascahobas et la construction du réservoir de Lafond sont des résultats concrets pour l'amélioration de l'accès à l'eau de la population haïtienne.

Le budget programme simplifié 2024-2025 a été exécuté pour un montant global de 35,577,959.92 USD en prenant en compte les décaissements réalisés par les neuf (9) programmes de financement en vigueur, incluant le Trésor Public. Il s'en suit donc, un taux moyen de réalisation de 54.72 %.

Le rapport de réalisation budgétaire du Budget Programme Simplifié 2024-2025 a été élaboré à partir des POA des projets et des informations recueillies auprès des différents chefs de projet et Directeurs de la DINEPA.
