



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES (MEF)



FONDS D'ASSISTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (FAES)

RAPPORT TRIMESTRIEL DU FAES (JANVIER-MARS 2026)

AVRIL 2026

TABLE DES MATIÈRES

I. PRESENTATION DU FAES	10
1.1 Notre identité	10
1.2. Notre Mission	11
1.3. Structures du FAES	11
II. CONTEXTE D'EXECUTION (JANVIER-MARS 2026)	15
III. PERFORMANCES FINANCIERE ET TECHNIQUE DU FAES (2^{EME} TRIMESTRE DE L'EXERCICE FISCAL 2025-2026).....	16
3.1. Ressources mobilisées.....	16
3.2. Dépenses d'appui au fonctionnement du FAES (janvier-mars 2026).....	17
3.3. Investissements en gourdes réalisés à travers les programmes en cours (Trimestre I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)	19
3.4 Synthèse des dépenses globales (janvier-mars 2026)	21
3.5. Performance technique du FAES (Exercice fiscal 2025-2026)	23
IV. RETOMBÉES DES INTERVENTIONS DU FAES	29
V. ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES.....	30
Annexe : Avancement des projets Hors PIP au 31 mars 2026	41

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

APA : Association des Producteurs Agricoles

AVSI : Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (partenaire opérationnel)

BAC : Bureau Agricole Communal

BID : Banque Interaméricaine de Développement

CARE : Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (partenaire opérationnel)

CECI : Centre d'étude et de coopération internationale (partenaire)

COMMCARE : Outil numérique de collecte de données et de suivi des bénéficiaires

CSCCA : Commission Supérieure des Contrats et des Marchés Publics (référéncée implicitement)

DA : Direction Administrative

DF : Direction Financière

DG : Direction Générale

DIE : Direction des Initiatives Économiques

DLCP : Direction de Lutte Contre la Pauvreté

DPRI : Direction de Promotion et Renforcement Institutionnel

DPS : Direction des Projets Sociaux

DSE : Direction du Suivi et de l'Évaluation

EFA : École Fondamentale d'Application

EN : École Nationale

FAES : Fonds d'Assistance Économique et Sociale

FAN : Fédération des Amis de la Nature

FFA : Food for Assets (programme « nourriture contre travail »)

FHAF : Fonds Haïtien d'Aide à la Femme

FHONEP : Fondation Haïtienne des Organisations de l'Enseignement Privé

FNE : Fonds National de l'Éducation (référéncé dans le cadre Koweït)

GDG : Cabinet ou consultant ayant réalisé l'évaluation finale du programme HA-L1137

GHEKIO : Groupe Haïtien d'Étude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes (partenaire)

GOH : Gouvernement d'Haïti / Government of Haiti (employé contractuel GOH)

HA-J0001 : Programme (financé par la BID, clôturé)

HA-J0005 : Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables (BID)

HA-J0007 : Programme pour lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience (BID)

HA-J0008 : Programme communautaire de promotion de la sécurité humaine en Haïti (BID)

HA-L1137 : Programme clôturé (financé par la BID, évaluation finale en 2024)

HA-L1145 : Programme antérieur ayant servi de base au HA-J0001

HAVA : Association Haïtienne des Agences Bénévoles

HIMO : Haute Intensité de Main-d'Œuvre

HTG : Gourde haïtienne (monnaie nationale)

IEC : Information – Éducation – Counseling

IPC : Indice de Classification de la Sécurité Alimentaire (IPC, phases)

IPV : Intimate Partner Violence (violence conjugale, en anglais)

KM : Kantin Mobil (cantine mobile)

KORE-PEP : Programme d'assistance sociale (Taïwan/Colombie)

MAST : Ministère des Affaires Sociales et du Travail

MEF : Ministère de l'Économie et des Finances

MENFP : Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle

MPCE : Ministère de la Planification et de la Coopération Externe

OIM : Organisation Internationale pour les Migrations

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OPC : (site de distribution ou camp, cité dans les photos)

OPS : Opérateurs de services (dans le contexte des programmes)

OPS/OMS : Organisation Panaméricaine de la Santé / Organisation Mondiale de la Santé

PADF : Pan American Development Foundation

PAM : Programme Alimentaire Mondial

PDI : Personnes Déplacées Internes

PLIS : Plateforme numérique (système d'information sur l'emploi)

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PRPRLD : Programme de Rénovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement

PSM : Propensity Score Matching (méthode statistique d'évaluation d'impact)

PSTD : Programme de Structuration Territoriale et de Développement

PUM : Programme d'Urgence Multisectoriel pour l'Apaisement et la Réinsertion des Groupes Vulnérables

PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH

RCSI : Risk Control Self-Assessment (indice de comportement ou de surveillance, contexte programme PAM)

RE-28 : Programme de Réhabilitation de 28 écoles

RK : Restaurant communautaire (Kantin Kominotè)

SAEP : Système d'Adduction en Eau Potable

SIMAST : Système d'Information du Ministère des Affaires Sociales et du Travail

SIMT : Système d'Information sur le Marché du Travail

T1, T2 : Trimestre 1, Trimestre 2

TAIWAN / République de Chine (Taïwan) : bailleur de fonds (programme KORE-PEP)

TP : Trésor Public

TOMPORTAIL / TOMPPORTAIL : plateforme numérique interne (gestion/portail)

UAI : Unité d'Audit Interne

UC : Unité de Communication

UCBR : Unité de Coordination des Bureaux Régionaux

UEP : Unité d'Études et de Programmation

UL : Unité Légale

UPM : Unité de Passation des Marchés

UTM : Unité de Transferts Monétaires

VIH/SIDA : Virus de l'Immunodéficience Humaine / Syndrome d'Immunodéficience Acquise

VIVARIO / Viva Rio : partenaire opérationnel

ZL : Zanmi Lasante (partenaire opérationnel)

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026 (janvier-mars 2026), le FAES a maintenu et renforcé ses interventions dans un contexte de crise humanitaire toujours sévère (plus de 1,45 million de personnes déplacées internes et 5,83 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë). **Malgré les contraintes sécuritaires et logistiques, le FAES a enregistré des réalisations techniques significatives, notamment une accélération des décaissements sur les principaux programmes filets sociaux.**

En matière de sécurité alimentaire et d'assistance d'urgence :

- **276,000 plats chauds** distribués à partir des cantines mobiles

Dans le cadre des filets sociaux et du renforcement des moyens d'existence (HA-J0005) :

- **94 projets communautaires** lancés depuis le début de l'exercice (dont 37 nouveaux au T2), dépassant déjà la moitié de l'objectif annuel de 192.
- **69 projets achevés**, dont **41 réalisés durant le seul trimestre janvier-mars 2026**, améliorant durablement les infrastructures locales (accès à l'eau, pistes rurales, ouvrages de drainage, etc.).
- **55 090 bénéficiaires de transferts non conditionnés** et **38 130 personnes** ayant accès à des services sociaux complémentaires (santé, éducation, protection).

Pour l'emploi temporaire et le relèvement économique (HA-J0007) :

- **2 921 travailleurs HIMO** rémunérés au T2, portant le cumul exercice à **14 605 bénéficiaires** de petits travaux rémunérateurs.
- **45 chantiers lancés** dans les zones prioritaires, créant des actifs communautaires tout en générant des revenus immédiats.
- **374 personnes** formées aux compétences socio-émotionnelles, renforçant leur employabilité et leur résilience.
- **4 057 patients** bénéficiaires de transferts conditionnels santé, améliorant l'accès aux soins pour les plus vulnérables.


Une reprise opérationnelle des projets d'infrastructure après un premier trimestre paralysé :

- **2 petits projets d'infrastructure** réceptionnés et achevés dans le cadre du PSTD (Programme de Structuration Territoriale et de Développement), marquant le retour des activités terrain.
- Reprise des décaissements pour le PRPRLD (13,6 M HTG) et le programme des 28 écoles (16,5 M HTG), avec une mobilisation accrue des bureaux régionaux pour le suivi et la supervision.

Une capacité financière au service de l'impact

- **Au deuxième trimestre, les dépenses totales du FAES se sont élevées à 978,5 millions de gourdes, dont plus de 93 % (914 millions de gourdes) ont été directement investies dans des actions de terrain, témoignant de la priorité constante accordée à l'impact social et à l'exécution technique.**

- **Cumul des décaissements au 31 mars 2026 : 3,38 milliards de gourdes**, avec une part prépondérante des investissements (96,6 %).
- Accélération notable des décaissements pour les programmes BID (HA-J0007, HA-J0005, HA-J0008) et pour le PUM, traduisant une montée en puissance opérationnelle.

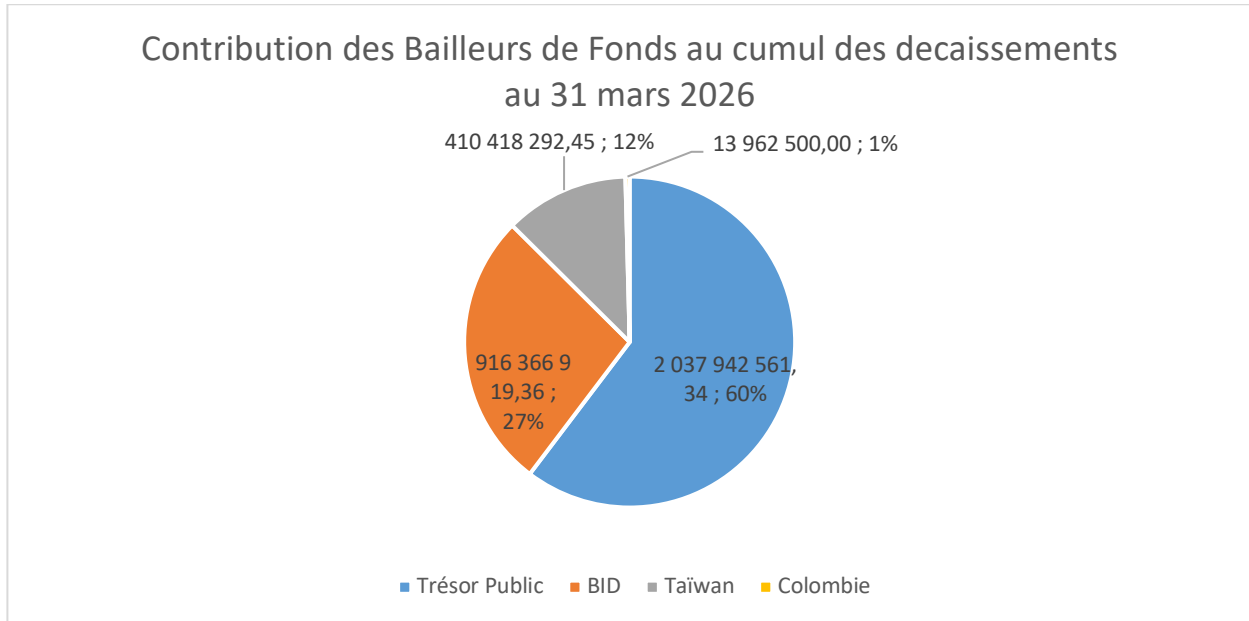

Une institution qui se renforce

- **373 employés au 31 mars 2026**, soit une augmentation de **+12 %** par rapport à décembre 2025, reflétant l'intensification des activités.
- **Progression de la représentation féminine** (35,3 %), avec une amélioration marquée dans les catégories contractuelles.
- Maintien d'une **présence terrain effective** grâce aux cinq bureaux régionaux, aux partenariats stratégiques (PAM, AVSI, CARE, GHESKIO, ZL, etc.) et à l'engagement du personnel.

Malgré ces avancées, des défis demeurent :

- **Démarrage encore lent de HA-J0008** (aucune réalisation terrain significative au 31 mars 2026).
- **Faible rythme d'exécution budgétaire global** (22,5 % du budget annuel d'investissement consommé à mi-exercice), appelant à une accélération soutenue sur les deux derniers trimestres.

I. PRESENTATION DU FAES

1.1 Notre identité

Le FAES est une agence d'exécution d'excellence du Gouvernement. C'est une entité « étatique » qui s'engage à être remarquable dans sa capacité d'exécution de programme et de projets financés par le Trésor Public ou les bailleurs internationaux dans le temps tout en prenant soin de garder le meilleur rapport qualité prix sur le marché de gestion des projets. A cet effet, la culture du FAES se base sur trois valeurs : **la valorisation des talents, l'agilité, la performance.**

Les ressources humaines qualifiées et expérimentées sont les premiers actifs du FAES et nous valoriserons ces talents tout en attirant d'autres. Nous avons pu retenir au niveau des **directions** techniques des cadres ayant plus de 15 ans dans la conception, l'exécution et l'évaluation de programmes et projets. Nous avons mis au niveau du FAES un système de gestion de ressources humaines pour attirer et retenir les meilleurs talents. Chaque cadre du FAES devra avoir l'assistance nécessaire pour atteindre son potentiel pour son épanouissement professionnel et le renforcement de l'Institution. La performance comme valeur partagée guidera le recrutement et la promotion.

- **Le FAES se distingue par son agilité d'intervention.** Le FAES est capable d'intervenir plus rapidement que beaucoup d'autres institutions dans les différentes étapes d'exécution de programmes ou projets. Cette institution a aussi les capacités de maintenir la continuité de ses opérations et de suivre ses lignes stratégiques même en période de chocs naturels, de troubles politiques ou sociaux.
- **Le FAES est une Institution qui se base sur l'évidence et la performance.** La culture de la performance est d'abord internalisée auprès de notre personnel et constitue notre engagement auprès de nos partenaires du Gouvernement ou de l'International. Se fixer sur les résultats et renforcer notre capacité de répondre aux attentes nous permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire puis d'assurer une feuille de route commune de dialogue pour notre équipe et nos partenaires.
- **Le FAES est une institution respectueuse des normes et des procédures.** Le FAES croit que le respect des normes de marchés publics, de gestion de projet est non seulement une exigence de conformité mais un sceau de bonne gouvernance et un outil de promotion de la croissance des Petites et Moyennes Entreprises (PME), ses fournisseurs de services. Dès sa création en 1990, le FAES s'est distingué par le respect des procédures et durant plus d'une décennie par sa capacité de faire respecter les procédures de marchés publics et sa capacité de répondre aux exigences des bailleurs de fonds.

En 2017, le processus de restructuration a permis à l'institution d'envoyer un signal positif aux bailleurs. Suite aux efforts consentis au cours de ces dernières années, le FAES a su gagner la confiance de plusieurs donateurs au cours de l'année 2020. Notre équipe s'assure toujours de respecter les normes et procédures du Gouvernement autant que ceux de nos partenaires en appliquant la rigueur et la transparence.

La rigueur est une qualité indispensable de notre personnel dans l'application des normes et des procédures. Le FAES exige un grand effort intellectuel de son équipe pour une connaissance approfondie

de la loi sur les marchés publics et des procédures de passations de marché pour chaque bailleur. Cette maîtrise des normes est corolaire au besoin d'une grande exactitude dans leur application. La rigueur exige objectivité.

La transparence est un principe fondamental du FAES qui exige une obligation de publicité active des interventions du FAES. La transparence exige une responsabilisation et participation dans l'action du FAES par qui de droit et en particulier une connaissance à priori de l'action publique du FAES par le public cible. **D'où le rôle fondamental du ciblage de la population bénéficiaire dans les interventions du FAES.** Le FAES s'engage à utiliser les nouvelles technologies de l'information pour renforcer sa culture de transparence durant les prochaines années. La transparence est un facteur pour améliorer les pratiques de gestion dans l'intérêt général par la dissémination de l'information et par la participation.

1.2. Notre Mission

- Le Fonds d'Assistance Economique et Sociale (FAES) a pour mission de financer des projets de courte durée et à haute intensité de main d'œuvre visant à améliorer les conditions de vie des populations démunies dans les zones urbaines et rurales et à accroître leur potentiel productif. (Art.3 / Décret du 3 juin 1990 portant création du FAES). Ses modes opératoires le placent toujours en situation d'accompagner les communautés défavorisées dans le développement de leurs capacités et la valorisation de leurs potentialités et de se dégager une vision commune pour leur avenir en apportant l'appui nécessaire à leur renforcement et en finançant des projets prioritaires identifiés par ces communautés. Pour remplir cette mission, il se dote d'une structure organisationnelle qui comprend actuellement :


1.3. Structures du FAES

- **Un Conseil d'Administration** composé de neuf (9) membres : le Ministre de l'Economie et des Finances (MEF) ou son représentant, Président ; le Ministre de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE) ou son représentant Vice-président ; le Ministre des Affaires Sociales ou son représentant, membre ; le Directeur Général du FAES, secrétaire exécutif ; un représentant du FHAF (Fonds Haïtien d'Aide à la Femme), membre ; un représentant de la FHONEP (Fondation Haïtienne des Organisations de l'Enseignement Privé), membre ; un représentant de la HAVA (Association Haïtienne des Agences Bénévoles), membres ; un représentant de la APA (Association des Producteurs Agricoles) et ; un représentant de la FAN (Fédération des Amis de la Nature).
- **Une Direction Générale (DG)**, composée, entre autres : de l'Unité de Coordination des Bureaux Régionaux (UCBR) ; de l'Unité de Passation des Marchés (UPM) ; de l'Unité d'Audit Interne (UAI) ; de l'Unité Légale (UL) ; de Coordination de Programme ; de l'Unité de Communication (UC) ; de l'Unité d'Etude et de Programmation (UEP) ; Unité de Contrôle Financier et ; de l'Unité de Transferts Monétaires (UTM) ; et qui coiffe les directions suivantes logées au Bureau Central du FAES situé dans le département de l'Ouest, précisément à Delmas 75 :
 - Une Direction Administrative (DA) ;
 - Une Direction Financière (DF) ;
 - Une Direction des Projets Sociaux (DPS) ;
 - Une Direction de Promotion et Renforcement Institutionnel (DPRI) ;

- Une Direction des Initiatives Economiques (DIE) ;
- Une Direction de Lutte Contre la Pauvreté (DLCP) ;
- Une Direction du Suivi et de l'Evaluation (DSE).
- **Cinq (5) Bureaux Régionaux** : Bureau Régional du Nord'Ouest (Port de Paix) ; Bureau Régional du Centre (Hinche) ; Bureau Régional du Nord'Est (Fort liberté) ; Bureau Régional du Sud (Cayes) et ; Bureau Régional du Sud'Est (Jacmel).

Ces structures représentent l'Institution sur tout le territoire national, y inclus les zones à hauts risques et les zones d'accès difficiles et assurent, actuellement, le suivi des missions sociales de distribution d'aliments, de plats chauds, de transferts monétaires non conditionnés et conditionnés à la participation à des petits projets d'amélioration de résilience et d'infrastructures, de formation des jeunes, de réalisation des activités d'incubation d'entreprise, de cantine scolaire, des travaux d'infrastructures (scolaires, de logement, de santé...) au profit des ménages les plus vulnérables...

Présentation de l'organigramme du FAES

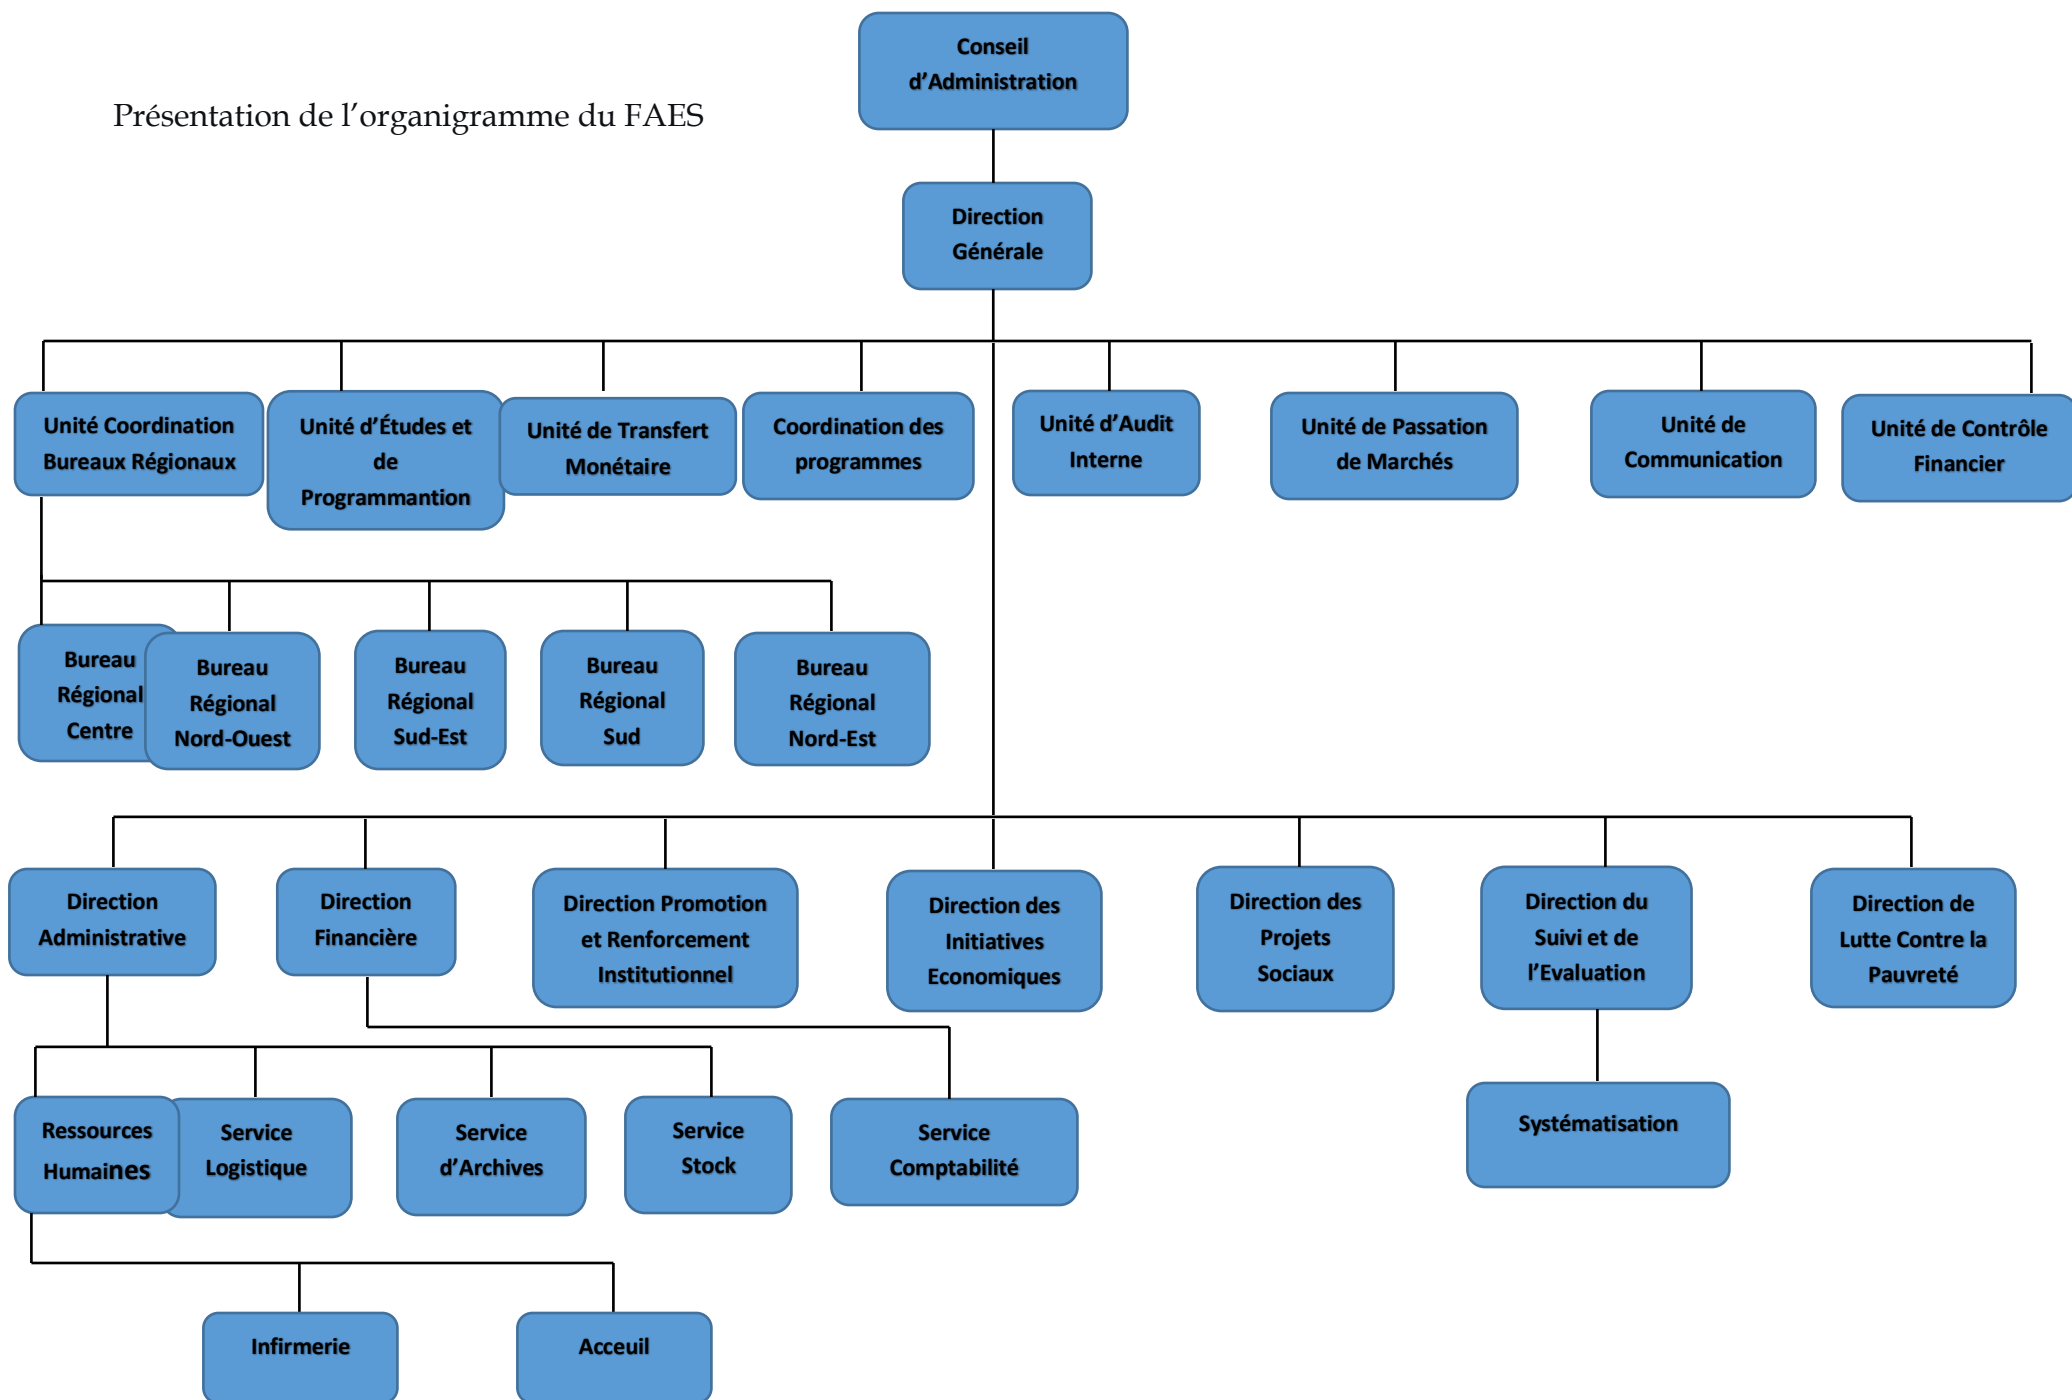

1.4. Situation du personnel au 31 mars 2026

Au 31 mars 2026, la situation du personnel de l'Institution se présente de la manière suivante :

TAB# 1 : Évolution de la situation du personnel du FAES au 31 mars 2026


Sexe	Employé régulier		Employé contractuel (GOH)				Autres membres du personnel / BID		Grand total	
	Au 31 déc. 2025	Au 31 mars 2026	Au 31 déc. 2025	Sous-Total au 31 mars 2026	Au 31 mars 2026 (GOH 114)	Au 31 mars 2026 (GOH 119)	Au 31 déc. 2025	Au 31 mars 2026	Au 31 déc. 2025	Au 31 mars 2026
Homme	104	114	88	97	7	90	27	30	219	241
Femme	49	63	55	60	3	57	9	9	113	132
Total	153	177	143	157	10	147	36	39	332	373

L’effectif total du Fonds d’Assistance Économique et Sociale (FAES) s’élève à **373 employés au 31 mars 2026**, soit une augmentation de **+12 %** par rapport au 31 décembre 2025 (+41 personnes dont 19 femmes).

Cette hausse est principalement portée par le personnel régulier (+24) et le personnel contractuel GOH (+14), reflétant l’accélération de la mise en œuvre et de la supervision du PUM.

La représentation des femmes progresse légèrement (34.4 % → 35.3%), avec une amélioration notable dans la catégorie Autres contractuels (28.9 % → 38.7 %).

L’équilibre global entre réguliers (47.4 % du total) et contractuels GOH (42,09 %) reste plus ou moins stationnaire.

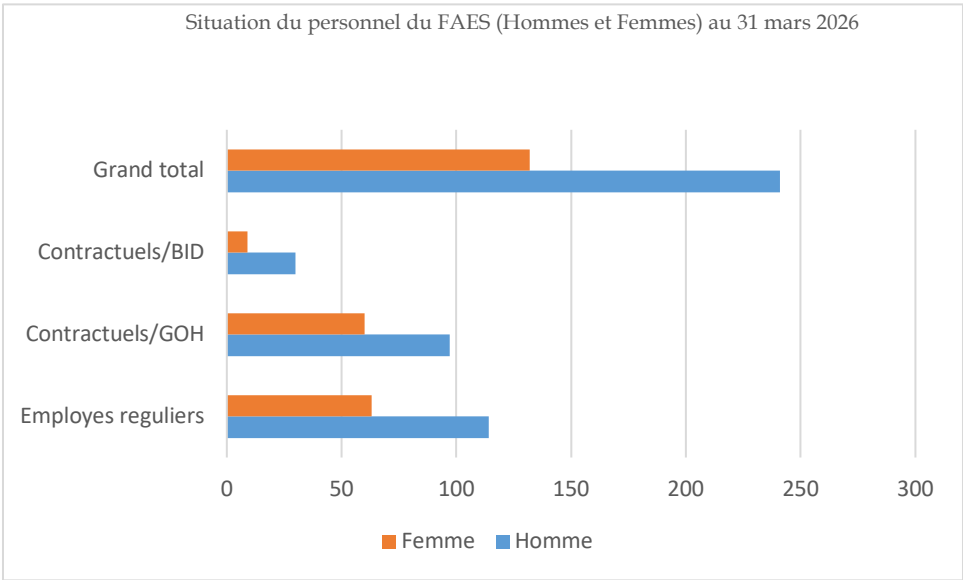

II. CONTEXTE D'EXECUTION (JANVIER-MARS 2026)

La marge de manœuvre du FAES entre janvier et mars 2026 est étroite, mais ses atouts structurels lui confèrent une résilience certaine. Ses cinq bureaux régionaux lui permettent de contourner en partie les blocages sécuritaires de la capitale. Ses partenariats stratégiques – dans le cadre du PUM et des programmes financés par la BID renforcent ses capacités de mise en œuvre. La confiance de la BID et du Trésor Public lui garantit est un atout fondamental pour le FAES. Enfin, la collaboration avec les autorités locales facilite l'accès au terrain.

Facteurs contraignants. Des contraintes majeures pèsent sur la performance du FAES durant cette période ; notons :

L'insécurité et l'accès limité aux zones. Entre 80 et 90 % de Port-au-Prince est sous contrôle des gangs selon l'UNODC, ceux-ci contrôlant également toutes les routes d'accès à la capitale. Cette situation entrave physiquement les déplacements du personnel et des convois humanitaires vers les sites de personnes déplacées internes, rendant les évaluations et les distributions difficiles.

L'augmentation des demandes d'assistance représente aussi un facteur contraignant. Avec plus de 1,45 million de personnes déplacées internes recensées par l'OIM en février 2026 et 5,83 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë (dont 1,9 million en situation d'Urgence – Phase 4 IPC), la demande d'assistance dépasse très largement les capacités opérationnelles disponibles du FAES.

La faible mobilisation des fonds du GOH constitue aussi un frein majeur. Au second trimestre 2026, le FAES n'a pas reçu même une partie des fonds prévus dans son budget pour exécuter le PUM au cours de l'exercice fiscal 2025-2026, par exemple.

À ces contraintes s'ajoutent des goulots logistiques : les routes contrôlées par les gangs perturbent les chaînes d'approvisionnement alimentaire et font grimper les coûts de transport.

Facteurs favorables. Plusieurs atouts structurels et relationnels permettent au FAES de maintenir sa performance malgré un environnement difficile. Citons, par exemple :

L'existence de ses cinq bureaux régionaux constitue un avantage majeur. Implantés dans les Départements du Nord'Ouest, Nord'Est, Centre, Sud et Sud'Est du pays, ces bureaux permettent au FAES de disposer d'une présence permanente sur le terrain, de remonter rapidement les informations sur les besoins des populations et d'organiser des visites de suivi et de supervision même lorsque l'accès à la capitale est compromis.

Les partenariats stratégiques développés par le FAES renforcent son efficacité opérationnelle. Dans le cadre du Projet d'Urgence Multisectoriel (PUM), le FAES a noué des collaborations essentielles avec les acteurs humanitaires sur le terrain. Par ailleurs, les programmes financés par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) permettent de compter sur les expertises techniques de certains partenaires, tels que le PAM, AVSI, Zanmi Lasante, CARE, GHESCHIO, AVSI, VIVARIO, PADF, CECI, OIM, OPS/OMS

La confiance de bailleurs de fonds stratégiques comme la BID et le Trésor Public haïtien constitue un levier financier essentiel. Cette confiance, traduite par des appuis récurrents et des décaissements de fonds, permet au FAES de bénéficier de ressources pour exécuter ses interventions.

La collaboration avec les autorités locales facilite l'accès aux communautés et la coordination des actions. Les mairies, les directions départementales et les élus locaux facilitent le déroulement des interventions sur le terrain.

L'existence au sein du FAES d'un personnel expérimenté et engagé, déterminé à renforcer l'institution, malgré les contraintes.

III. PERFORMANCES FINANCIERE ET TECHNIQUE DU FAES (2^{EME} TRIMESTRE DE L'EXERCICE FISCAL 2025-2026)

Le troisième chapitre du présent rapport dresse un état exhaustif des performances financières et techniques du FAES au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026 (janvier-mars 2026). Après avoir rappelé le contexte d'exécution, ce chapitre détaille successivement les ressources mobilisées par source de financement, les dépenses de fonctionnement engagées et/ou décaissées, le niveau et la répartition des investissements par programme, la contribution respective des bailleurs ainsi que les réalisations techniques physiquement constatées sur le terrain. Cette analyse permet d'apprécier la capacité opérationnelle du FAES à transformer les décaissements en livrables concrets au profit des populations vulnérables.

3.1. Ressources mobilisées

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026 (janvier-mars 2026), le montant total des ressources mobilisées s'élève à deux milliards cinq cent huit millions deux cent dix-huit mille sept cent dix-huit et 63/100 **(2,508,218,718.63) gourdes**, réparties entre financements internes (884,734,833.44 gourdes) et externes (1,623,483,885.19 gourdes).

Sur l'ensemble des deux premiers trimestres de l'exercice (octobre 2025 à mars 2026), le cumul des ressources mobilisées atteint **9 389 241 410,92 gourdes**.

TAB#2 : Ressources mobilisées durant les trimestres I et II (Ex. fiscal 2025-2026)

Source	Prévisions des ressources (Exercice fiscal 2025-2026)	Ressources mobilisées ou déjà disponibles au niveau du FAES (Trimestre 1 de l'Exercice fiscal 2025- 2026)	Ressources mobilisées ou déjà disponibles au niveau du FAES (Trimestre 2 de l'Exercice fiscal 2025- 2026)	Cumul Ressources mobilisées (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025-2026)	Taux de réalisation des ressources cumulées (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025- 2026)
Total	14,539,553,544.85	8,774,206,303.05	2,508,218,718.63	10,732,425,021.68	73.82
Financement interne	6,032,334,801.62	3,224,898,688.81	884,734,833.44	3,559,633,522.25	59.01
Fonds d'investissements GOH /MPCE	166,891,294.08	138,160,295.63	0	138,160,295.63	82.78

Fonds d'investissements du MENFP	60,405,834.11	18,817,499.47	0	18,817,499.47	31.15
Financement des activités du PUM 25-26	5,063,746,394.70	0		-	0.00
Autres interventions publiques	0.00	550,000,000.00		550,000,000.00	
Frais de Gestion du PUM (TP)	415,289,222.73	0	0	-	0.00
Dotation Budgétaire du MEF	326,002,056.00	71,825,838.68	132,200,748.09	204,026,586.77	62.58
Engagement investissements PUM 2024-2025	0	0	0	0	0
Reliquat frais de gestion PUM 2024-2025	0	0	0	0 -	0
☐ Financement Externe	8,507,218,743.23	5,549,307,614.24	1,623,483,885.19	7,172,791,499.43	84.31
Accord de don / Investissements de Koweït	1,339,899,010.41	0	0	0 -	0.00
Accord de don HA-J0005 / Investissements de la BID	2,710,092,000.00	2,390,588,623.11		2,390,588,623.11	88.21
Accord de don .HA-J0007 / Investissements de la BID ...	2,244,000,000.00	789,610,080.48	1,423,983,885.19	2,213,593,965.67	98.65
Accord de don .HA-J0008 / Investissements de la BID ...	1,584,000,000.00	2,242,542,322.15		2,242,542,322.15	141.57
Accord de don / Investissements de Taiwan	572,025,211.65	98,000,250.00	199,500,000.00	297,500,250.00	52.01
Frais de Gestion du programme KORE-PEP (TAIWAN)	57,202,521.17	4,900,012.50		4,900,012.50	8.57
Investissements du programme KORE-PEP (COLOMBIE)	0	23,666,326.00	0	23,666,326.00	
Frais de Gestion du programme KORE-PEP (COLOMBIE)	0	0	0	-	

3.2. Dépenses d'appui au fonctionnement du FAES (janvier-mars 2026)

Au terme des deux premiers trimestres de l'exercice fiscal 2025-2026, les dépenses d'appui au fonctionnement du FAES affichent un taux de réalisation global de 44,6 %, soit trois cent trente millions neuf cent vingt-sept mille quatre cent soixante-dix-sept gourdes et cinquante-neuf centimes (330 927 477,59 HTG) décaissées ou engagées sur une prévision annuelle de sept cent quarante et un millions six cent quarante-quatre mille cent trente-trois gourdes (741 644 133 HTG).

Les rémunérations et charges liées au personnel constituent le poste le mieux couvert. Au sein du programme PUM, elles atteignent 85 698 793,07 HTG (quatre-vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-treize gourdes et sept centimes), soit 34,2 % des crédits ouverts. Pour la dotation budgétaire, le taux s'élève à 55,1 %, avec 99 601 250,03 HTG (quatre-vingt-dix-neuf millions six cent un mille deux cent cinquante gourdes et trois centimes) consommées.

L'exécution devient très inégale pour les autres postes de dépenses, particulièrement pour le programme PUM. Les services et charges diverses plafonnent à 7,9%. Les immobilisations corporelles suivent une pente similaire, avec un taux de réalisation de seulement 5,3%. En revanche, les achats de biens de consommation et petits matériels enregistrent un dépassement spectaculaire de 212,3 %.

Du côté de la dotation budgétaire, l'exécution apparaît plus homogène : les services et charges diverses atteignent 56,0%, les achats de biens, 89,8% et les immobilisations corporelles dépassent la prévision (128,0 %).

TAB#3 : Dépenses d'appui au fonctionnement réalisées durant les trimestres I et II (Ex. fiscal 2025-2026)

Programme	Rubrique	Prévisions 25-26	Décaissements Trimestre I (Exercice fiscal 2025-2026)	Décaissements Trimestre II (Exercice fiscal 2025-2026)	Cumul Dépenses de fonctionnement (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025-2026)+ engagements	Taux de réalisation des dépenses d'appui au fonctionnement (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025-2026)
PUM	Sous-total 1	415,544,133.15	43,684,736.24	64,430,937.83	108,115,674.07	26.02
	1 DEPENSES DU PERSONNEL	250,475,750.23	42,343,261.24	43,355,531.83	85,698,793.07	34.21
	2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES	51,068,382.92	1,341,475.00	2,669,959.00	4,011,434.00	7.86
	3 ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS	6,000,000.00	0	12,735,073.00	12,735,073.00	212.25
	4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	108,000,000.00	0	5,670,374.00	5,670,374.00	5.25
	5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	
	9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES	0	0	0	0	
DOTATION BUDGETAIRE	Sous-total 2	326,002,056.00	71,825,839.46	150,985,964.06	222,811,803.52	68.35
	1 DEPENSES DU PERSONNEL	180,807,888.00	31,539,890.68	68,061,359.35	99,601,250.03	55.09
	2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES	56,995,000.00	25,795,663.00	6,125,963.89	31,921,626.89	56.01
	3 ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS	68,374,168.00	14,490,285.78	46,890,601.52	61,380,887.30	89.77
	4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18,325,000.00	0	23,459,689.30	23,459,689.30	128.02
	5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1,500,000.00	0	-	-	-
	9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES	0	0.00	6,448,350.00	6,448,350.00	
KORE-PEP /TAIWAN	Sous-total 3	0	5,966,036.71			
	1 DEPENSES DU PERSONNEL	0				#DIV/0!
	2 DEPENSES DE SERVICES ET CHARGES DIVERSES	0				#DIV/0!

	3 ACHAT DE BIENS DE CONSOMMATION ET PETITS MATERIELS	0				#DIV/0!
	4 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0				#DIV/0!
	5 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0				#DIV/0!
	9 AUTRES DEPENSES PUBLIQUES	0				#DIV/0!
Dépenses totales		741,546,189.15	121,476,612.41	215,416,901.89	330,927,477.59	44.63

3.3. Investissements en gourdes réalisés à travers les programmes en cours (Trimestre I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)

Le cumul des décaissements du FAES au cours des deux premiers trimestres de l'exercice fiscal 2025-2026, s'élève à 3 061 796 758,85 gourdes. Pour le seul deuxième trimestre (janvier-mars 2026), les décaissements atteignent 914 035 863,72 gourdes, ce qui représente ...% des décaissements cumulés. Cinq programmes concentrent l'essentiel des décaissements cumulés : PUM (55,7 %), KORE-PEP/Taiwan (13,2%), HA-J0007 (14,5%), HA-J0005 (14,4%), HA-J0008 (1,0%), PSTD (0,03%)

A noter que les trois programmes financés par la BID (HA-J0005, HA-J0007, HA-J0008) totalisent ensemble 916 366 919,36 gourdes, soit 29,9 % du cumul desdits décaissements. Avec 55,7 % des décaissements cumulés, le PUM occupe une place prépondérante. Toutefois, les ressources du PUM ne proviennent pas dans le cadre du Budget de l'exercice fiscal 2025-2026 dudit programme.

TAB#5 : Investissements en gourdes réalisés à travers les programmes en cours (Trimestre I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Rubrique	Type	Source de Financement	Prévisions 25-26	Décaissements (Trimestre I de l'exercice fiscal 2025-26)	Décaissements (Trimestre II de l'exercice fiscal 2025-26)	Cumul des décaissements (Trimestres I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)	Taux de décaissement des investissements (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025-2026)
Total	Investissements des programmes	A caractère social	GOH/TAIWAN/BID/KO WEIT	13,525,434,533.30	2,127,760,895.13	914,035,863.72	3,041,796,758.85	22.49
Relance économique et la réhabilitation des infrastructures : Soutien aux PME et modernisation des pratiques agricoles	1. Programme de Renovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement (PRPRLD)	A caractère social	GOH	47,041,902.65	0	0	0.00	-
	2. Programme de Structuration Territoriale et de Développement (PSTD)	A caractère social	GOH	119,849,391.43	0	1,002,278.84	1,002,278.84	0.84
	3. Réhabilitation 28 écoles	A caractère social	GOH	60,405,834.11	0	0	0.00	-

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Rubrique	Type	Source de Financement	Prévisions 25-26	Décaissements (Trimestre I de l'exercice fiscal 2025-26)	Décaissements (Trimestre II de l'exercice fiscal 2025-26)	Cumul des décaissements (Trimestres I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)	Taux de décaissement des investissements (Trimestre 1 + Trimestre 2 de l'exercice fiscal 2025-2026)
	10. Programme de Reconstruction d'Infrastructures d'éducation et de Santé	A caractère social	KOWEIT	1,339,899,010.41	0	0	0.00	-
Sécurité alimentaire et accès aux services sociaux de base : Distributions ciblées aux populations vulnérables.	4. Programme d'Urgence Multisectoriel pour l'Apaisement et la Réinsertion des Groupes Vulnérables (PUM)	A caractère social	GOH	5,063,746,394.70	0	0	0	0
	5. KORE-PEP	A caractère social	TAIWAN	356,400,000.00	98,009,380.04	306,442,875.70	404,452,255.74	113.48
	6. KORE-PEP	A caractère social	COLOMBIE		13,962,500.00		13,962,500.00	#DIV/0!
	7. Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables HA-J0005	A caractère social	BID	2,710,092,000.00	393,060,134.50	48,807,294.42	441,867,428.92	16.30
	8. Programme pour Lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience grâce à un filet de sécurité pour les personnes vulnérables HA-J0007	A caractère social	BID	2,244,000,000.00	252,445,393.64	192,241,522.41	444,686,916.05	19.82
	9. Programme communautaire de promotion de la sécurité humaine en Haïti (HA-J0008)	A caractère social	BID	1,584,000,000.00	5,989,883.74	23,822,690.65	29,812,574.39	1.88
	10. Autres interventions publiques	A caractère social	GOH	0				

3.4 Synthèse des dépenses globales (janvier-mars 2026)

Au deuxième trimestre (janvier-mars 2026), les décaissements se sont élevés à 978,5 millions de gourdes. Le cumul des décaissements au 31 mars 2026 atteint 3,15 milliards de gourdes.

Sur l'ensemble du premier semestre (octobre 2025 à mars 2026), les investissements représentent 96,6 % du total des décaissements, contre 3,4 % pour l'appui au fonctionnement.

Malgré ce taux d'investissement très intéressant, le rythme d'exécution budgétaire reste modéré : à la fin du deuxième trimestre, seulement 22.48 % du budget annuel d'investissement a été consommé. Une accélération significative sera nécessaire au cours des deux trimestres restants (avril à septembre 2026) pour atteindre les objectifs de l'exercice fiscal.

TAB# 6 : Synthèse des décaissements du FAES (Trimestre I et II de l'exercice fiscal 2025-2026)

Catégorie	Montant Prévu (HTG): Ex fiscal 2025-2026	Montant décaissé :Oct.-dec. 2025	Montant décaissé : janvier-mars 2026	Cumul des decaissements au 31 mars 2026
A. INVESTISSEMENTS	13,525,434,533.30	2,127,760,895.13	914,035,863.72	3,041,796,758.85
B. APPUI AU FONCTIONNEMENT	741,644,133.16	121,476,612.41	215,416,901.89	336,893,514.30
TOTAL GÉNÉRAL (A+B)	14,267,078,666.46	2,249,237,507.54	1,129,452,765.61	3,378,690,273.15

3.5. Performance technique du FAES (Exercice fiscal 2025-2026)

Les principales réalisations du FAES durant les deux premiers trimestres concernent l'axe prioritaire Sécurité alimentaire et accès aux services sociaux de base : Distributions ciblées aux populations vulnérables.

En effet, grâce au Programme d'urgence multisectoriel, les cantines mobiles ont distribué 312 000 plats chauds en trois mois – un flot continu qui porte à 576 000 le total cumulé sur l'exercice. Les restaurants communautaires pour personnes déplacées tournent à plein régime : 48 restaurants communautaires ont été approvisionnés pour pouvoir desservir les PDI. 163 restaurants communautaire hors site sur 200 sont alimentés, offrant des repas à des milliers de ménages vulnérables.

Les transferts monétaires amplifient ce souffle solidaire : 54,796 ménages vulnérables secourus, 161,118 parents d'écoliers aidés terrain. Les ouvriers du textile, eux, ont reçu 36,923 transferts, soit près de 40 % de la cible.

Concernant le programme HA-J0005, 37 nouveaux petits projets ont été lancés, 41 achevés durant le trimestre janvier-mars 2026. Au cumul, 94 projets ont été mis en œuvre, dépassant déjà la moitié de l'objectif annuel de 192. Les bénéficiaires de ces transferts conditionnés atteignent 18 410 individus, dont 5 523 femmes.

Parallèlement, le programme HA-J0007 permet, entre autres, de rémunérer 2,921 travailleurs via des petits travaux, de former 374 personnes aux compétences socio-émotionnelles, de lancer 45 chantiers.

Également, la sensibilisation progresse : deux campagnes réalisées sur les deux prévues, 27 645 personnes orientées vers des services sociaux complémentaires. Le document-cadre sur la gestion des retours de personnes déplacées a été validé.

Tab#8 : Interventions du FAES par rapport aux priorités gouvernementales au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unité	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
Relance économique et la réhabilitation des infrastructures : Soutien aux PME et modernisation des pratiques agricoles	Programme de Structuration Territoriale et de Développement	Nbre de petits projets d'infrastructure receptionnes	petit projet receptionne	11	0	2	2	18.18
		Nbre de petits projets d'infrastructure acheves	petit projet acheve	11	0	2	2	18.18
		Nbre de projets d'infrastructure realises	petit projet d'infrastructure acheve	4	0	0	0	N/A
		Rue Ravine trompette dans la commune de Pilate/ betonnee (Phase 2)	rue betonnee	1	0	0	0	N/A
		Travaux de construction du Tribunal de paix de Mare-Rouge finalises	Tribunal de paix construit	1	0	0	0	N/A

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unite	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
		Projet de Construction d'un ponceau dans la localité de Mme Combe, Picot et Pelerin dans la commune des Cayes acheve	ponceau construit	1	0	0	0	N/A
	Programme de Rénovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement	Travaux de 2 places publiques à Plateau Central finalises	Construction de Place publique finalisee	2	0	0	0	N/A
		Deux (2) mini centres universitaires de l'Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves et à Saint-Marc / Phase 1 construits	Mini centre universitaire construit	2	0	0	0	N/A
		Construction d'une école communale à Lascahobas dans le département du centre (Catherine Flon à Morène, 1ère section Petit Fond) poursuivie	Construction d'une école communale poursuivie	1	0	0	0	N/A
		Travaux de construction d'une école de formation technique dans la commune de Limbé dans le Département du Nord sont acheves	Construction d'une école de formation technique achevee	1	0	0	0	N/A
		Achèvement de la construction du marché communal de Gros-Morne	Construction de marché communal achevee	1	0	0	0	N/A
		Projet de Construction de 2 centre culturel (Jean Rabel et Anse à Veau) acheve	Construction de centre culturel achevee	2	0	0	0	N/A
	Programme de Réhabilitation de 28 écoles	Des écoles nationales de Métayer, Champy, Hérivaux et Finition de l'école nationale de Laborde sont rehabilitees	Nombre d'écoles nationales réhabilitées	4	0	0	0	N/A
	Programme de Reconstruction d'Infrastructures d'éducation et de Sante	Le lycée de Débouchette (Exécution & Supervision) est finalise	Construction de lycée finalisee	1	0	0	0	N/A
		Un hôpital à Sans Fil est construit	Hôpital construit	1	0	0	0	N/A
Sécurité alimentaire et accès aux services sociaux de base : Distributions ciblées aux populations vulnérables.	Programme d'Urgence Multisectoriel pour l'Apaisement et la Réinsertion des Groupes Vulnérables (PUM)	Nombre de Kits alimentaires (après cuisson) distribués	kit	380,000	0	0	0	0
		Nombre de Kits alimentaires (apres cuisson) distribués	kit	66,580	0	0	0	0
		Nombre de plats chauds distribués (cantines mobiles)	plat chaud	671,420	264,0000	276,000	540,0000	80.4%
		Nombre de Kits sanitaires distribués	kit sanitaire	63,000	0	0	0	0
		Nombre de Récipients d'eau distribués	recipient d'eau	15,000	0	0	0	0

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unite	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
		Nombre de Restaurants communautaires approvisionnés (PDI)	restaurant communautaire PDI	48	0	0	0	0
		Nombre de restaurants communautaires hors site approvisionnés	restaurant communautaire hors site	200	104	163	267	133.50
		Nbre de menages vulnerables incluant PDI ayant reçu des transferts monetaires	menage vulnerable	83,000	20,000	0	20,000	24.09
		Nbre de parents d'ecoliers ayant reçu des transferts monetaires	parent d'ecolier	0	161,118	0	161118	N/A
		Nbre d'ouvriers du textile ayant reçu des transferts monetaires	ouvrier	94,500	36,923	0	36923	39.07
	Programme d'Assistance Sociale KORE-PEP / TAIWAN	Nombre de kits alimentaires de type E distribués	kit		3,794	13,045	16839	#DIV/0!
		Nombre de kits sanitaires distribués	kit		1,550	0	1550	N/A
		Nombre d'approvisionnements de restaurants communautaires (RK) réalisés	approvisionnement		1	0	1	N/A
	Programme d'Assistance Sociale KORE-PEP COLOMBIE	Nombre de plats chauds distribués	plat chaud		12,000	0	12000	N/A
		Nombre de kits alimentaires de type E distribués	kit		1,075	0	1075	#DIV/0!
	Programme de renforcement des filets de sécurité pour les populations vulnérables (HA-J0005)	Nombre d'individus qui reçoivent des transferts non conditionnés pour une sécurité alimentaire accrue.	individu	79,755	55,090	0	55090	69.07
			menage vulnerable	15,951	11,018	0	11018	69.07
		Nombre de femmes qui reçoivent des transferts non conditionnés pour une sécurité alimentaire accrue.	Femme	39,878	5,509	0	5509	13.81
		Nombre d'individus qui reçoivent des transferts conditionnés à la participation à de petits travaux liés aux actifs environnementaux de la communauté	menage vulnerable	14,627	3,571	3,682	7253	49.59
			Individu	73,135	17,855	18,410	36265	49.59
		Nombre de femmes qui reçoivent des transferts conditionnés à la participation à de petits travaux liés aux actifs environnementaux de la communauté.	Femme	21,941	5,892	5,523	11415	52.03
		Nombre de nouveaux petits projets travaux mis en œuvre	nouveau petit projet	192	57	37	94	48.96

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unite	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
		dans le cadre du programme argent contre travail.						
		Nbre de petits projets communautaires lancés	petit proje lance	155	57	37	94	60.65
		Nbre de petits projets communautaires achevés	petit projet acheve	77	28	41	69	89.61
		Nombre de personnes déplacées ayant reçu une aide sous forme de transferts monétaires et en nature	PDI	44,800	0	0	0	N/A
		Composante 2 :					0	#DIV/0!
		Nombre de campagnes de sensibilisation réalisées pour identifier les bénéficiaires potentiels	campagne de sensibilisation	2	1	1	2	100.00
		Nombre de personnes qui reçoivent des transferts et des services sociaux complémentaires.	personne	56570	10,485	27,645	38130	67.40
		Nombre de personnes déplacées ayant reçu des services de santé complémentaires	personne	30000	0	0	0	N/A
		Composante 3:			260		260	#DIV/0!
		Nombre de rapports trimestriels sur les déplacements internes et les retours élaborés et diffusés	rapport trimestriel	4	0	0	0	N/A
		Nombre d'aires d'accueil équipées conformément au standard minimum (kits de base disponibles)	Aire d'accueil equipe	3	0	0	0	N/A
		Nombre de documents de lignes directrices et protocoles validés pour la gestion des retours	document de lignes directrices et protocoles validés	1	1	0	1	100.00
		Composante 3 :					0	#DIV/0!
		Nouveaux Ménages enquêtés et enregistrés dans le SIMAST	Famille		0	0	0	N/A
	Lutter contre l'insécurité alimentaire et favoriser la résilience grâce à un filet de sécurité pour les personnes	Nombre total de travailleurs bénéficiaires recevant des transferts monétaires pour participation à des projets HIMO	Bénéficiaire	6,400	0	2,921	2921	45.64
		Nombre d'hommes bénéficiaires recevant des transferts HIMO	Homme	3,840	0		0	N/A

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unite	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
	vulnérables (HA-J0007)	Nombre de femmes bénéficiaires recevant des transferts HIMO	Femme	2,560	0		0	N/A
		Nombre total de petits travaux communautaires lancés	petit projet lance		0	45	45	#DIV/0!
		Formations aux compétences socio-emotionnelles	Bénéficiaire		0	374	374	#DIV/0!
		Formations aux compétences techniques	Bénéficiaire		0	0	0	N/A
		Nombre total de petits travaux communautaires achevés	petit projet acheve	114	0		0	N/A
		Nombre de petits travaux d'amélioration du cadre de vie réalisés	Femme bénéficiaire	80	0	0	0	N/A
		Nombre de petits travaux de renforcement de la résilience climatique réalisés	Projet	34	0	0	0	N/A
		Nombre de patients recevant des transferts conditionnels pour soins de santé	Patient	7,200	4057	0	4057	N/A
		Nombre d'hommes recevant des transferts conditionnels santé	Homme	2,160	1217	0	1217	N/A
		Nombre de femmes recevant des transferts conditionnels santé	Femme	3,600	2029	0	2029	N/A
		Nombre d'hommes en situation de handicap recevant des transferts santé	Homme handicapé	360	0	0	0	N/A
		Nombre de femmes en situation de handicap recevant des transferts santé	Femme handicapée	360	405	0	405	N/A
	Programme communautaire de promotion de la sécurité humaine en Haïti (HA-J0008)	Nombre de ménages bénéficiaires de transferts conditionnels	Menage	37348	0		0	N/A
		Nbre de bénéficiaires (ménages) reçoivent des transferts monétaires conditionnés	Ménage	19392	0		0	N/A
		Nombre de projets mis en oeuvre	projet	275	0		0	N/A
		Nbre de personnes formées (formation professionnelle et socio-émotionnelle)	Personne	5608	0		0	N/A
		Nbre de Personnes ayant reçu au moins un service de l'ensemble des soins essentiels par l'intermédiaire de leur réseau	Personne	403771	0		0	N/A

Axe prioritaire du Gouvernement Haïtien	Programme ou composante de programme en exécution	Indicateur	Unite	Prévision annuelle	Résultats atteints (Octobre-decembre 25)	Résultats atteints (Janvier-mars 2026)	Résultats cumulés au 31 mars 2026 (Exercice fiscal 2025-2026)	% d'avancement au 31 mars 2026 (Ex. Fiscal 2025-2026)
		communautaire au cours de l'année écoulée						
		Nbre d'Incitations du côté de la demande distribuées	Incitation	33000	0		0	N/A
		Nbre de Campagnes de promotion des subventions auprès des ménages comptant des personnes handicapées exécutées	Campagne de promotion	7	0		0	N/A
		Nbre de Structures dans les départements prioritaires dont l'équipement a été modernisé au cours de l'année écoulée	Structure	9	0		0	N/A
		Personnels de santé formés à l'utilisation des protocoles de dépistage et de prise en charge des victimes de violences sexistes.	Personnel de sante formé		0		0	N/A
		Nbre de Jeunes inscrits dans les espaces sécurisés pour les activités pour les jeunes	Jeune		0		0	N/A
		Nbre d'Entreprises de jeunes sélectionnés, inscrites dans les incubateurs	Entreprise de jeune		0		0	N/A
		Nbre de Programme sur mesure conçu pour soutenir la croissance et l'auto-développement des femmes entrepreneur	Programme sur mesure		0		0	N/A
		56000 Nouveaux ménages intégrés dans le SIMAST.	Nouveau ménage intégré dans le SIMAST	56000	0		0	N/A
		Nombre de districts sanitaires ayant un plan de renforcement approuvé	District sanitaire	9	0		0	N/A

IV. RETOMBÉES DES INTERVENTIONS DU FAES

À travers ce chapitre, on présente quelques résultats de l'évaluation finale de deux (2) programmes clôturés par le FAES durant l'exercice fiscal 2024-2025. Spécifiquement, dans ce cas, il s'agit des résultats concernant les programmes HA-L1137 et HA-J0001 financés par la BID.

V. ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

Opération de distribution de plats chauds pour les Personnes Déplacées Internes de Port-au-Prince le 31 Mars 2026. PUM



Photo 1



Photo 2

Le FAES engage des travaux de protection sur la rivière Chainaut pour assurer la sécurité des habitants de Bonbon. HA-J0005 (CECI)



Photo 3



Photo 4

850 kits alimentaires sans cuisson ont été distribués, dont 500 à Kenscoff, 300 à Fort-Jacques et 50 remis à l'administration communale à Kenscoff , 25 Mars 2026. PUM



Photo 5



Dans le cadre de ses activités de supervision et approvisionnement des restaurants communautaires* dans le département du Centre, le samedi 14 mars 2026. PUM

Photo 6



Photo 7



Photo 8

La délégation du FAES dans le Centre remet des chèques au personnel des restaurants communautaires le dimanche 15 Mars 2026



Photo 10



Photo 9

La distribution de plats chauds pour soutenir les PDI continue sur plusieurs sites le 10 et le 11 mars 2020

Communication 2. PUM



Photo 11



Photo 12

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque année le 8 mars, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) a organisé, le vendredi 6 mars 2026, une activité d'envergure marquée par la reconnaissance, la réflexion et la valorisation du rôle essentiel des femmes au sein de l'institution.



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16

Construction de 100 mètres linéaires de route à Port-Salut, dans la localité de Ka Standi.
Cet ouvrage a été réalisé par le FAES à travers l'opérateur AVSI. HA-J0005



Les séances de formation socio-émotionnelle organisées dans la commune de Cornillon permettent à nos ouvriers de mieux gérer leurs émotions et de renforcer leurs relations dans le cadre du travail.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme HA-J0007 (Vivario)



Photo 18



Photo 19



Mardi 24 février 2026, plusieurs équipes de Viva Rio se sont rendues à Cornillon, Thomazeau, Ganthier / Fonds-Parisiens et Fonds-Verrettes pour lancer vingt (20) nouveaux petits projets de génie civil, sur un total de cinquante et un (51). HA-J0007



Photo 22



Photo 23

Du vendredi 6 au lundi 9 février 2026, le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES) et ses partenaires ont mobilisé des moyens considérables afin d'assurer une réponse alimentaire digne et immédiate. Chaque jour, 33 000 repas chauds ont été préparés et distribués au profit des familles déplacées des communes de Delmas et de Port-au-Prince. PUM



Photo 24



Photo 25

Distribution de plats chauds et Kits alimentaires sans cuisson aux sites : MSF, École Nationale Équateur, MAST, MTPTC, Annexe Communication 2, Colombie, Fusion, KID et OPC. Au total, 303 144 plats chauds distribués, soit 33 000 plats par jour, du jeudi 5 au mercredi 11 février 2026 dans le cadre du programme (KORE PÈP) appuyé par la République de Chine Taiwan.



Photo 27



Photo 26



Photo 29



Photo 28

5 390 kits sans cuisson ont été distribués le mercredi 4 février 2026 Dans le cadre de la du Programme National d'Assistance Sociale Kore Pèp Taiwan.





Le FAES forme des bénéficiaires pour la réalisation de cinq projets à Gros-Morne. HA-J0005 (CARE).



Photo 33



Photo 32

Ce jeudi 29 janvier 2026, Viva Rio a lancé dix (10) nouveaux projets dans la commune de Croix-des-Bouquets, dans le cadre du Programme HA-J0005.



Photo 34



Photo 35

Le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES), en collaboration avec la République de Taïwan a distribué 500 kits de produits alimentaires consommables sans cuisson. Cet événement s'est déroulé le 22 janvier à l'Église évangélique Baptiste de Bérée, située à Delmas 33, rue Jean Baptiste.



Photo 37



Photo 36

Atelier de Priorisation des besoins départementaux: Vers des Solutions durables en matière de soins sanitaires de base. HA-J0008



Photo 38

Du 13 au 16 janvier 2026, le Gouvernement de la République, à travers le Fonds d'Assistance Économique et Sociale (FAES), a conduit une importante mission dans le département du Centre au profit des populations déplacées internes. Cette intervention visait l'approvisionnement et la supervision de dix (10) restaurants communautaires, la rémunération du personnel de cuisine ainsi que la distribution de kits alimentaires aux familles les plus vulnérables, dans une logique de proximité, de solidarité et de responsabilité de l'État.



Opération de plats chauds KM (Kantin Mobil)– Mardi 6 janvier 2026, 33 000 plats chauds

Photo 41



Photo 42



FAES | Solidarité, Dignité et Espoir pour la fête de l'Indépendance , 1er Janvy 2026

37 Restaurants communautaires du Nord-Ouest bénéficie de la soupe ;

- 9 camps dans le Centre ;
- 2 sites dans l' Artibonite. / PUM

Photo 44



Photo 43



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Exercice Fiscal: 2025-2026

TABLEAU DE MISE A JOUR DES PROGRAMMES ET PROJETS

Nom de l'Entité: FAES

Date: 29/04/26

PROGRAMME
HA_J0005

Titre du projet	Date de début	Date de fin	Statut du projet	Cout total du projet en gourdes	Etat d'Avancement	Remarque
Constructions d'un mur de soutènement pour la protection du littoral Devan Bonn	2025-06-04	2025-11-25	approuve	8 398 124.16	88.02411764705883	
Construction d'une place publique de 525 m2, Nan Franklin	2025-05-06	2025-09-30	approuve	8 465 390.91	99.99979528290878	
Construction de 120 ml de canal de drainage en maçonnerie à morne Figaro II	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 816 826.18	30	
Projet d'aménagement de la place publique du Centre-Ville	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 020 460.16		
Réhabilitation du centre culturel de Bassin (132 m2)	2025-10-10	2026-06-22	approuve	7 968 287.78		
Construction de 100 ml de murs de soutènement à Kokoye	2025-04-01	2025-06-30	approuve	7 925 146.63	100	
Rehabilitation ouvrage de traversee, Gwo trou	2025-11-17	2026-03-20	approuve	6 226 654.4	25.635779036827195	
Réhabilitation de 250 ml de route en terre battue et construction De 3 Cunettes en Béton à Route Charleus, Petite Source	2026-03-16	2026-07-16	approuve	6 175 007.79		
Réhabilitation de 189 m3 de gabion à la rivière Charrette	2025-05-05	2025-10-20	approuve	7 642 032.83	100	
Bétonnage de 140 ml des corridors Glassy et Charles Emile dans la commune de Jérémie.	2025-11-27	2026-04-15	approuve	6 550 000.7	93	
Pavement d'Adoquins à l'Ecole National Charlotin Marcadieu -Rue Saint Domingue.	2026-02-13	2026-03-31	approuve	7 751 644.29	18.5	
Mur de soutènement pour la correction de la ravine de Michel Aubourg	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 338 563.64		
Construction d'une passerelle (Nouaille) a Cote du village artistique.	2025-09-01	2025-12-31	approuve	7 974 037.61	96.355	
Projet de Réfection de Toiture Hôpital Ste Marie	2025-05-19	2025-10-10	approuve	11 487 634.59	99.99999999999923	

Projet de Réhabilitation et d'Embellissement du Centre Culturel du Centre-Ville de Tiburon	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 011 285.20		
Bétonnage de 163 ml de la rue Disciple Jean Pierre	2025-11-24	2026-03-31	approuve	7 859 999.34	99.99999999956441	
Réhabilitation de 100 ml de route en béton hydraulique et 160 m² de perrés maçonnés à morne Damas.	2025-05-15	2025-10-30	approuve	7 879 442.45	100	
Projet de gabionnage pour la réhabilitation de la prise de Vérone/Losier	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 287 758.83		
Reboisement et correction de ravine par des seuils en sacs. Mahotiène	2025-09-29	2026-06-30	approuve	6 206 933.50	93.40361881785284	
Travaux de traitement intégré de 2500 ml de la ravine Laboule incluant seuils connexes à Bassin Bleu	2025-12-18	2026-07-13	approuve	6 473 644.28		
Protection de 120 m de berges de la rivière chainaut dans la commune de Bonbon.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 859 999.75	25.6	
Bétonnage de 155 ml de la ruelle Duverger dans la commune de Jérémie.	2025-11-24	2026-03-31	approuve	7 860 000.40	99.99999999999994	
Réparation de deux kiosque d'eau Corail (kiosque a Bloc 2 et kiosque b Bloc 3).	2026-02-13	2026-03-31	approuve	7 851 970.3	13.16	
Construction d'un kiosque d'eau Cite Doudoune. # 9 Marassa Rue la Joie	2026-02-13	2026-03-31	approuve	8 263 916.93		
Construction de 396 ml de clôture du terrain de Jeux de Hatte de Lice	2025-04-07	2025-08-01	approuve	10 523 397.12	100	
Aménagement du tronçon de la route de Barbois/Macabée	2025-06-03	2025-11-25	approuve	8 028 903.20	100	
Construction de 138,6 mètres de clôture du bureau CASEC de Citerne Remy.	2025-10-27	2026-02-13	approuve	7 229 000.16	29.530343865683694	
Réhabilitation de 100 ml de canal de drainage en maçonnerie à carrefour Martin	2025-01-20	2025-05-19		7 902 793.80		
Réhabilitation du tronçon de la route de Morne droit	2025-05-28	2025-11-11	approuve	8 058 458.20	99.99999999999999	
Réhabilitation du tronçon route de Maillard	2025-05-19	2025-10-10	approuve	7 954 318.43	100	
Aménagement d'un système de captage d'eau pluviale a plaine la source	2025-09-29	2026-04-03	approuve	6 204 514		
Réhabilitation école Nationale de Blacktote	2025-05-01	2025-08-31	approuve	7 990 861.20		
Construction citerne communautaire. (Corail) - centre santé.	2025-11-10	2026-01-31	approuve	8 068 945.54	100	
Amélioration Route Vicinale Têtus-Boidine	2025-12-01	2026-03-25	approuve	7 799 883.43		

Curage du canal et réaménagement de petit pont à Boston	2025-04-01	2025-07-31	rejete	7 982 779.79		
Rehabilitation de l'école Caroline Chevreau	2025-09-25	2025-12-31	approuve	7 756 677.37	99.97210000099975	
Projet Aménagement Cour et Espaces extérieurs	2025-07-14	2025-10-31	approuve	7 834 283.59	100	
Réhabilitation du centre de santé de Désormaues	2025-07-03	2025-10-31	approuve	11 790 000.19	100	
Travaux de Réhabilitation de l'École Nationale de Diègue (peinture, Ferronnerie, Ragraéage, bloc sanitaire et lampadaire)	2025-12-01	2026-03-31	approuve	4 488 616	100	
Réhabilitation de la Place Publique de Dame-Marie	2025-07-08	2025-11-10	approuve	11 790 000.7	99.9999989875	
Bétonnage de 113 ml de route du marché de Platon Guilbin	2025-01-20	2025-05-19		7 956 284.42		
Projet de Travaux de Réhabilitation de : Peinture, Bloc Sanitaire, Construction d'un puisard, allée Piétonne et un Lave-main de l'École National Lélia Lhérisson.	2025-12-01	2026-03-31	approuve	2 122 825	100	
Bétonnage de 130 ml de la rue de la place et réhabilitation de 380m2 de l'espace de loisir de Mouline	2025-07-07	2025-10-31	approuve	11 790 000.7	100	
Projet de gabionnage de la rivière de Canette	2025-05-19	2025-10-10	approuve	8 285 447.40	100	
Amélioration Route Vicinale Morne Alce-Morne Marie	2025-12-01	2026-03-25	approuve	7 799 093.60		
Réhabilitation de la place publique, Tamarin	2025-09-29	2026-06-30	approuve	6 134 229.84	81.35567010309279	
Réhabilitation du canal d'irrigation de Labestière	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 030 955.4		
Rehabilitation de canal a Bas Fontaine	2025-10-13	2026-02-13	approuve	7 720 410		
Bétonnage de 84 mètres linéaires du corridor à l'entrée et remblayage de la cour du Lycée de Bonbon.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 859 999.91	54.59767301692351	
Construction d'un mur de soutènement sur le littoral de Tapion pour la protection d'une boîte de captage communautaire.	2026-01-19	2026-05-19	approuve	7 926 805.18	97.70555555555553	
Réhabilitation du tronçon de route de rue Germain	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 770		
Construction citerne communautaire 1ere Ruelle Remy. Rue Duval 30, imp la Paix	2025-06-01	2026-01-30	approuve	8 068 945.54	25.129484536082476	
Réhabilitation du tronçon de la route de Plaine Dumont	2025-06-03	2025-11-25	approuve	7 900 622.40	100	
Aménagement d'un tronçon de route morne Ti Valin	2026-01-14	2026-06-30	approuve	6 192 069.25	96.66666666666667	

Approvisionnement en eau potable de Petite-Rivière par l'extension du système d'adduction d'eau potable (SAEP) de La Hatte/Lesson.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 860 000		
Bétonnage de 120 ml de la route Torbeck dans la section communale de fond rouge Torbeck	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 860 000.24		
Amélioration Route Vicinale Vye baryè - Tikoma	2025-12-01	2026-03-25	approuve	7 799 529.54		
Réhabilitation de l'école nationale de Trou-Milieu	2025-09-01	2025-12-31	approuve	8 045 475.43		
Réhabilitation de 130 Metre de cloture du commissariat de Baie de Henne	2025-09-22	2026-06-22	approuve	7 692 032.40	30.269396551724135	
Réhabilitation de la route du centre-ville	2025-05-27	2025-11-10	approuve	8 034 415.35	100	
Réhabilitation de 141 m de route en béton hydraulique à la rue Archimède de Beauvoir prolongée.	2025-10-27	2026-07-13	approuve	7 824 556.20		
Projet d'extension du système d'eau de Pradel	2025-09-01	2025-12-31	approuve	8 023 816.54		
Bétonnage de 210 ml de la rue des Pommes	2025-07-07	2025-10-31	approuve	11 790 000.19	100	
Construction citerne communautaire Grd Plaine	2026-02-13	2026-03-31	approuve	8 068 945.54	5.88	
Réhabilitation partielle de l'école communautaire de Borno (construction trois salles de classe)	2025-11-01	2026-03-31	approuve	7 344 520	49.498	
Extension du système d'eau de Balairase à Point-Est	2025-09-01	2025-12-31	approuve	8 049 534.64		
Construction de 100 de canal de drainage et 100 m de béton hydraulique à Fond Papaye	2025-12-15	2026-07-13	approuve	7 828 789.67		
Réhabilitation du tronçon de la route de Balix	2025-05-28	2025-11-11	approuve	8 078 008	99.99999999999999	
Projet de gabionnage de la rivière de Les Anglais/Digue	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 231 162.40		
Aménagement du tronçon de la route de Darbouse2	2025-06-04	2025-11-25	approuve	8 005 903.20	100	
Construction kiosque d'eau Dimusso. Route Drouillard	2026-02-13	2026-03-31	approuve	8 263 916.93	10	
Réhabilitation du tronçon de route de Terre Noire de 100 m Lineaires	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 770		
Bétonnage de 110 m de route à Calvaire et 25 m à la rentrée du commissariat de Marmelade	2025-10-10	2026-06-22	approuve	7 830 502.62	59.13149350649351	
Construction d'une citerne communautaire, à l'école. (Lilavois 23-25)	2025-02-02	2025-10-30	approuve	8 068 945.54	100	

Projet de construction de canaux d'irrigation a Vaureuil	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 655		
Corection de la ravine de Tapon	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 107 150.40		
Réhabilitation du tronçon de la route de Vérone	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 008 836.72		
Bétonnage de 110 ml de route à la rue la Paix	2025-04-01	2025-06-30	approuve	7 713 851.78	100	
Titre du sous projet : Bétonnage de 100 m du corridor et 30 m maçonnerie à la rue La Paix pro-longée	2025-10-27	2026-02-13	approuve	6 776 327.79		
Réhabilitation de 300 ml de canal d'irrigation à nan Carré	2025-04-10	2025-09-30	approuve	8 405 883.48	100	
Projet d'aménagement du tronçon route de Carrefour à Blacktote	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 024 303.20		
Construction d'une passerelle (Trois Rigoles)Route Nouaille.	2025-04-01	2025-11-30	approuve	7 974 037.61	85.41999999999999	
Construction d'un kiosque d'eau Santo22.	2025-04-01	2025-12-31	approuve	8 263 916.93	95.17233933083486	
Bétonnage de 120 ml de la ruelle caracoli-Duverger dans la commune de Jérémie.	2025-11-24	2026-03-31	approuve	7 859 999.41	100	
Aménagement de 60 ml en béton hydraulique de la partie critique de la rue Archimède Beauvoir.	2025-05-15	2025-10-30	approuve	7 492 708.20	100	
Correction de la ravine Adonice	2025-05-19	2025-10-10	approuve	7 885 746.56	100	
Réhabilitation du tronçon de la route de Boulé	2025-05-28	2025-11-11	approuve	8 187 258.20	100	
Construction d'une passerelle (Remy) entre les Ruelles: Raille et Rte. d'Esaié.	2025-04-01	2025-12-31	approuve	7 710 223.16	98.17750000000001	
Bétonnage de 180 ml de rue Bébé Fils-Aimé	2025-11-24	2026-03-31	approuve	7 860 000	99.99999999999955	
Réhabilitation de l'espace communautaire de Petite-Anse	2025-04-07	2025-07-30	approuve	7 937 148.60	100	
Alimentation en eau potable de Débarrasse par la Construction de Deux Points d'Eau à partir des sources (Bèl Cèil 1 et 2) et Source Koulout : Fond Rouge Torbeck/Section communale de Jérémie.	2025-11-01	2026-02-01	rejete	7 860 000.57		
Réparation de kiosque d'eau (Corail d) bloc 4.	2025-11-03	2026-01-31	approuve	7 189 629.59	99.99999999999866	
Projet de Réhabilitation de la Clôture et des fenêtres de l'Hôpital Ste Marie	2025-04-21	2025-10-10	approuve	6 010 724.20	100	
Amélioration d'un tronçon de 300 mètres de la route à l'entrée de Moulines.	2025-11-01	2026-04-17	approuve	7 859 999.51	100	
Bétonnage de 100 ml de route à Figaro I	2025-09-22	2026-06-19	approuve	6 740 011.33	32.5	

Bétonnage de 159 ml du corridor du quai dans la commune de Jérémie.	2025-11-24	2026-03-31	approuve	6 549 999.58	100	
Construction kiosque d'eau (Santo 19) Rue Tamarin.	2025-06-01	2026-02-27	approuve	8 263 916.93	58.98548895899054	
Réhabilitation de 200 m3 de gabion à la rue Guerrier	2025-05-05	2025-10-30	approuve	7 549 850.2	100	
Projet de Conservation de sol Nan Bathol	2025-11-17	2026-06-30	approuve	6 231 555	23.24	
Projet d'aménagement du marché de Tiburon	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 057 710.70		
Bétonnage de 111.75m de la rue Tandri et 48 m de la route principale du centre-ville de Bonbon.	2025-11-01	2026-03-31	approuve	7 860 000.41	42.2	
Réhabilitation du tronçon de la route de morne Karodi/Dalmette	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 025 660.20		
Construction d'une traverse de 19 ml à la rue St-Michel et Capois.	2025-05-15	2025-10-30	approuve	7 375 975.43	100	
Projet d'Assainissement de la Ruelle Croix Bleue et rehabilitation de deux canaux de drainage.	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 764.40		
Projet de conservation de sol par des structures mécano-végétatives, Tamarin	2025-11-17	2026-06-30	approuve	6 206 898.70	93.22000000000001	
Projet de Réhabilitation du centre de loisirs de Belecourt	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 840		
Réhabilitation du tronçon de la route de morne Tif/Dalmette	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 030 490.20		
Réparation de canal Santo 22- Impasse Diaboule	2026-02-13	2026-03-31	approuve	7 188 088.40	19.6	
Reprofilage de 1500m de la ravine de Lesson	2025-05-12	2025-09-12	approuve	6 550 000	100	
Correction de la ravine de Caïman	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 019 022.24		
Construction d'un mur de soutènement	2025-11-01	2026-03-31	approuve	7 126 404.92	53.07	
Réhabilitation de 100 m de canal de drainage en maçonnerie et aménagement du carrefour Martin en béton hydraulique	2025-09-22	2026-06-22	approuve	7 095 181.89	30.1	
Réhabilitation terrain de foot-ball Parc Souffrant	2025-11-17	2026-03-20	approuve	6 206 459.96	52.48857142857143	
Bétonnage de 161 ml de la rue du Café	2025-07-07	2025-11-15	approuve	7 860 000.42	100	
Construction d'un kiosque d'eau Canaan 3c. Rue Betany.	2025-06-01	2025-12-31	approuve	8 263 916.93	86.99999999999994	
Construction d'un kiosque d'eau (Canaan1) # 10 Ruelle Galilee.	2026-02-13	2026-03-31	approuve	8 263 916.93	10	
Bétonnage de 350 ml de la rue St Celia Pierre	2025-07-07	2025-10-31	approuve	11 790 000.19	100	
Correction de trois embranchements de ravines Chaléus Petite source	2025-09-29	2026-06-30	approuve	6 227 686.43		

Construction de 50 ml de bande de béton et 3 cunettes à Morne chandelle	2026-01-15	2026-04-03	approuve	6 544 922.27	95.59999999999992	
Correction sur 200 ml ravine lala et base Asile	2026-01-19	2026-06-30	approuve	6 233 686.43	95	
Aménagement du tronçon de la route de Barbois/ Bellevue	2025-06-04	2025-11-25	approuve	8 028 903.20	100	
Correction de la ravine de Voiceneil	2025-05-01	2025-08-31	approuve	7 971 743.4		
Construction de 193 ml de canal de drainage à Passe César.	2025-05-15	2025-10-30	approuve	7 839 202.67	100	
Réhabilitation partielle du Lycée Antoine et Georges Izmer, situé à Petite Place Cazeau, Delmas 33	2025-09-01	2025-12-31	approuve	7 035 701.68	98.40326576576567	
Projet de conservation de sol et de reboisement à Morne Pichigri	2025-05-06	2025-10-30	approuve	6 596 819.55	100	
Projet de Renforcement Structurel et Spatial Hôpital Ste Marie	2025-04-21	2025-10-10	approuve	10 968 982.69	99.99999999999942	
Bétonnage de 110.2 mètres de route à Cité Wallas	2025-09-22	2026-06-22	approuve	7 415 352	30	
Projet de gabionnage de la rivière de Les Anglais pour la protection du marché	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 231 162.40		
Rehabilitation de l'Ecole National Colbert Lochard (E.N.C.L).	2025-09-01	2025-12-31	approuve	7 546 551.8	100	
Réhabilitation d'une traverse de 13 ml et 47,4 ml de béton à la rue Basse	2025-03-31	2025-07-31	approuve	7 465 467.79	100	
Réhabilitation de 250 ml de route en terre battue et construction de 3 cunettes en béton a Mare Sucrin	2026-01-14	2026-06-30	approuve	6 248 640.48	96.66666666666666	
Construction kiosque d'eau (route Bagoman)	2025-04-01	2025-12-31	approuve	8 263 916.87	99.99999999999987	
Réhabilitation partielle de l'École Nationale d'Application de Damien	2025-09-01	2025-12-31	approuve	7 120 664.74	58.414176196772644	
Construction de la Place Publique de Fond Rouge Torbeck, section communale de Jérémie	2025-12-15	2026-04-30	approuve	7 799 999.94		
Réhabilitation partielle de l'école communautaire boukan boyer (construction deux salles de classe)	2025-09-01	2026-03-31	approuve	7 119 665.60	52.565	
Construction kiosque d'eau (Shada). Corridor Djo	2025-07-01	2026-01-31	approuve	8 263 916.93	95.67995267374036	
"Projet de Réhabilitation et d'Assainissement des abords du Canal de drainage de Bois Neuf	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 770		
Clôture du cimetière de Petite Rivière.	2025-11-24	2026-04-30	approuve	7 860 000.29	38.23529411764706	
Réhabilitation du tronçon route du centre-ville	2025-05-27	2025-11-10	approuve	8 034 415.35	89.97444444444444	

Projet de Correction et drainage du Canal de la Cahouane	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 026 005.20		
Projet d'Aménagement du Terrain de Parc Leclerc de Martial	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 302		
Projet de Réhabilitation des Bâtiments Hôpital Ste Marie	2025-04-21	2025-10-10	approuve	11 940 288.10	100	
Établissement d'une pépinière pour la production de plantule à Coteaux	2025-05-27	2025-11-10	approuve	8 033 362.56	99.99999999999999	
Réhabilitation de l'école Nationale d'Arniquet	2025-05-19	2025-10-10	approuve	8 017 346.56	100	
Bétonnage de 107 ml de la rue Frère Portier	2025-07-08	2025-10-31	approuve	7 859 999.70	100	
Réhabilitation de la place publique du centre-ville de Bonbon	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 859 999.41	35.64277967717402	
Réhabilitation du Système d'Adduction en Eau Potable (SAEP) de Lesson à partir de la source La Hatte.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 860 000		
Projet de gabionnage sur la ravine pour la protection du marché	2025-06-04	2025-11-25	approuve	8 216 672.40	61.17999999999999	
Mur de soutènement pour la protection du pont de Scipion	2025-06-03	2025-11-25	approuve	8 222 620.16	100	
Bétonnage de 130 ml de la rue Henry Christophe.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 799 999.48	18.56884477529639	
Bétonnage de 120 ml de la rue courbe du centre-ville de Bonbon.	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 860 000.56	100	
Construction de 160 m³ de gabion à la ravine Grépin	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 521 912.56	30	
Réparation de Canal, Dignerion impasse la Foreney	2026-02-13	2026-03-31	approuve	6 955 428.54		
Aménagement du tronçon de la route de Barbois/Castambee	2025-06-03	2025-11-25	approuve	7 969 663.83	100	
Bétonnage de 117 ml du corridor madame Tony dans la commune de Jérémie.	2025-11-24	2026-03-31	approuve	6 550 000.23	100	
Bétonnage de 115.30 mètres de route à Cité Julio	2025-10-10	2026-06-22	approuve	8 003 259.52	65.47701647875108	
Achèvement et construction de 100 ml de mur de clôture centre socio culturel	2025-09-29	2026-04-03	approuve	6 211 595.50	94.25	
Cloture de l'école nationale	2025-09-01	2026-03-31	approuve	7 123 027.39	54.153	
Bétonnage de 106 ml du corridor à Haut Citerne/ Nan 12	2025-03-31	2025-06-30	approuve	7 607 898.25	100	
Construction d'une passerelle de 30 m2 sur rivière à Medisant	2025-05-12	2025-09-30	approuve	8 424 500.20	100	
Bétonnage de 200 ml de l'impasse Beauzil dans la commune Jérémie.	2025-11-24	2026-04-30	approuve	7 859 999.75	99.99999999999997	

Réhabilitation du SAEP de Fond Rouge Torbeck à partir des sources Torbeck et Mahotièrè	2025-12-15	2026-04-17	approuve	7 860 000		
Réhabilitation du tronçon de la route de morne "Nan Boye"	2025-05-27	2025-11-07	approuve	8 048 683.59	100	
Construction de 160 m³ de gabion à la ravine Boulevard	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 521 912.56	30	
Bétonnage de 100 ml de route à Bas Madame (Traitement du point critique)	2025-10-10	2026-06-22	approuve	6 943 939		
Amélioration Route Vicinale Fonneg - Te Fann	2025-12-01	2026-03-25	approuve	7 799 913.68		
Réhabilitation de 120 ml de route vicinales latanier plaine la source	2025-09-29	2026-06-30	approuve	6 212 455.84	92.57142857142858	
Construction de 88 m³ de gabion et installations de 10 lampadaires à La source.	2025-05-15	2025-10-30	approuve	7 894 618.68	100	
Bétonnage de 110 m de route à la rentrée de Petit-Paradis.	2025-10-27	2026-02-13	approuve	7 415 352		
Construction de 105 ml de béton hydraulique et 105 ml de pavage en maçonnerie à Ba Nan Fon, La Plate	2025-05-01	2025-10-30	approuve	7 452 840	100	
Réhabilitation du point d'eau de Paparel.	2025-10-10	2026-06-22	approuve	7 326 171.29		
Construction de 160 m de Canal de drainage et 30 m de béton hydraulique à la rue saint-Michel	2025-10-27	2026-07-14	approuve	7 221 848.99		
Koreksyon Ravin nan Kabrit	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 054 111.20		
Construction d'un micro-retenu de 40.5 m³ et 200 ml de seuils en sacs de terre à Jasmin	2025-04-08	2025-07-31	approuve	7 594 600.31	100	
Travaux de Réhabilitation de l'École Municipal Pierre Labitrie (peinture, Bloc sanitaire et menuiserie)	2025-12-01	2026-03-31	approuve	4 232 321		
Construction kiosque d'eau (Chanelle) Duval 30	2025-03-10	2026-01-31	approuve	8 263 916.93	50.415261183834666	
Réhabilitation du marché et de la Place public	2025-09-01	2025-12-31	approuve	8 046 284.87		
Réhabilitation des 2 points de vente de Platon Guilbin	2025-05-05	2025-10-03	approuve	7 547 090.4	100	
Rehabilitation du point d'eau de Pienaceco	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 993 454.67	30.001147804414128	
Rehabilitation de canal et réaménagement de 5 petits ponts à Boston.	2025-10-13	2026-02-13	approuve	7 842 770		
Bétonnage sur 30 ml, Wharf Anse-a-Galets	2026-01-13	2026-06-30	approuve	6 211 275.27	95.6	
Projet d'aménagement du marché d'Arniquet	2025-05-19	2025-10-10	approuve	7 978 146.56	100	
Construction kiosque d'eau (Ti Guinin) Rue Saint Remy	2025-02-01	2026-12-31	approuve	8 263 916.93	95.31107738998446	

Aménagement de deux points d'eau de Débarrasse (source Bèl Cèil 1 et Koulout) et l'alimentation de Nan Brisson en eau potable à partir du réservoir de Torbeck dans la section communale de Fond Rouge Torbeck	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000.25		
Projet de Réhabilitation des Sanitaires et Assainissement Hôpital Ste Marie	2025-02-03	2026-02-06	approuve	11 180 482.29	95.71428571428572	
Construction de 171ml de clôture et réhabilitation de toiture École National Palma	2025-09-29	2026-04-03	approuve	6 213 984.33	94.597	
Betonage de 55ml de route et installation de 5 lampadaire a la rentree du terrain de jeu de Hate de lice	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 881 156.40		
Réhabilitation partielle du lycée Guy François Malary, Damien	2025-08-01	2025-12-31	approuve	7 095 551.43	61.58964399923853	
Réhabilitation du point d'eau de la ruelle Bois D'homme.	2025-01-20	2025-07-31	approuve	8 002 146.60	87.5	
Construction kiosque d'eau (Canaan 2). Rue la paix	2025-03-31	2025-12-31	approuve	8 263 916.93	57.40694006309148	
Construction d'un kiosque d'eau Ona Ville (Gandhi Rock)	2025-11-01	2026-01-31	approuve	8 263 916.93	95.51595598517727	
Construction d'un kiosque d'eau Drouillard	2026-02-13	2026-03-31	approuve	8 263 916.87	10	
Projet de construction de terrasse pour la production de culture de maraichere,Plaine La Source	2025-11-17	2026-03-20	approuve	6 207 309.48	19.17	
Construction d'un kiosque d'eau Lumane Casimir. #3Rue Nil, Grand Rue1.	2025-06-01	2026-01-31	approuve	8 263 916.93	50.41095314091259	
Réhabilitation de canal et réaménagement d'un petit pont à Wharf Jérémie	2025-10-13	2026-02-13	approuve	7 932 510		
Réhabilitation d'une place ,espace public. (Village Renaissance)	2025-07-01	2025-11-30	approuve	8 648 807.8	38.26802852150918	
Construction de 160 m³ de gabion à la ravine la coupe	2025-09-22	2026-06-22	approuve	6 521 912.56	31.180124223602483	
Traitement de 2445 ml de la ravine Alius et de renforcement de la résilience climatique à Petit Paradis	2026-03-31	2026-06-30	approuve	6 750 233.39		
Réhabilitation d'un point d'eau à Pérou	2025-04-02	2025-07-30	approuve	8 175 387.18	100	
Bétonnage de 62,5 mètres de route à Carrefour Coudrey	2025-10-10	2026-06-22	approuve	7 134 384.37	84	

Construction d'un mur de soutènement pour la protection du littoral de St Vil	2025-05-27	2025-11-10	approuve	8 275 484.16	93.3817777777778	
Projet de réhabilitation point d'eau Nan Palma	2025-11-17	2026-06-30	approuve	6 227 560.27		
Réhabilitation des 2 points de vente de Platon Guilbin (537,5 m2)	2025-01-20	2025-05-19		7 902 880.97		
Réhabilitation d'un centre de santé	2025-09-01	2026-03-31	approuve	7 106 273.48	31.8186	
Aménagement du Carrefour Cité Nono en Béton Hydraulique	2025-10-27	2026-02-13	approuve	7 968 287.78		
Amélioration Route Vicinale Ma kochon - Nan Plim	2025-12-01	2026-03-25	approuve	7 799 583.39		
Réhabilitation et canalisation du tronçon de la route de Scipion	2025-06-03	2025-11-25	approuve	8 010 872.40	100	
Projet de rehabilitation et d'Assainissement des abords du canal de Projet Drouillard	2025-04-01	2025-07-31	approuve	7 982 770		
Extension du système d'eau de Balairase	2025-09-01	2025-12-31	approuve	8 166 148.24		
Bétonnage de 150 ml de la ruelle de Balthazar dans la commune de Jérémie.	2025-11-24	2026-03-31	approuve	7 860 000.7	100	
Projet de Réhabilitation de l'école Nationale de Dumont	2026-04-27	2026-07-28		8 094 609.20		
Conservation de sol par des structure Mécano-végétatif, Pas Lave Pye	2026-01-26	2026-06-30	approuve	6 216 684.15	96.4	
Projet de gabionnage de la rivière de Les Anglais/Centre-Ville	2025-05-01	2025-08-31	approuve	8 231 162.40		
Projet d'aménagement du Tribunal d'Arniquet	2025-05-19	2025-10-10	approuve	7 992 706.56	100	
Bétonnage de 113 ml de route du marché de Platon Guilbin	2025-05-05	2025-10-30	approuve	7 535 881.27	100	
Réhabilitation du tronçon de la route de Trichet	2025-05-27	2025-11-11	approuve	8 058 458.20	100	
Construction de 153 ml de canal de drainage a la rue sans fil	2026-01-12	2026-03-06	approuve	6 210 249.40	96.02941176470583	

PROGRAMME HA_J007

Réhabilitation de 400 m de canal d'irrigation à Mahotièrre	2026-02-03	2026-06-05	approuve	7 666 459		
Construction d'un réservoir de 35 m3 et de 3 fontaines pour l'alimentation en eau potable à Fond Rouge Dahère	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Réhabilitation d'une école nationale (Nan Bouchon)	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 700 418.58		
Construction la clôture du terrain de football de Mapou / Belle-Anse.	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	8 083 628.23		

Réhabilitation d'espace culturel de Petit trou de Nippes	2026-05-04	2026-11-06		7 599 822.61		
Clôture d'une école communautaire	2025-11-01	2026-06-30	approuve	7 761 477.29	19.78	
Réhabilitation de la place publique et installation de lampadaire (Rue Zolib)	2025-11-10	2026-03-31	approuve	7 245 611.62		
Finalisation de la construction du Centre de Santé de Marre Briole	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 125 000		
Construction d'un réservoir communautaire pour l'alimentation en eau de la communauté bas Duchity.	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Réhabilitation canaux de drainage Pont Vincent	2026-04-06	2026-10-09		5		
Réhabilitation de la Mairie de Belle Anse	2026-04-20	2026-08-20	approuve	7 613 663.12		
Réhabilitation de l'école nationale de Latanerie.	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Réhabilitation Tronçon de route vicinale Carrefour-lundi-Micho/Installation de lampadaire	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 618.77	26.1449999999999996	
Rehabilitation infrastructure de drainage la saline	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 767 753.25	25.190512820512822	
Aménagement des bassins versants des Périmètres irrigués (Fauché, Blaise, Dini)	2026-05-04	2026-11-06		7 800 000		
Construction d'un système d'adduction d'eau de consommation à usage domestique à Nan Remy/ Village Deschamps	2026-02-04	2026-06-08	approuve	7 512 203.54		
Gabionnage d'un canal (Kadas)	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 782 555.79		
Conservation de sol (Môn orange)	2026-04-10	2026-08-09	approuve	7 258 445.64		
Réhabilitation de la toiture de l'école nationale de Paulette	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Réhabilitation de 160 m³ de gabion à Polycar	2026-02-04	2026-06-09	approuve	7 396 741.16		
Construction d'un centre polyvalent à Didier.	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	8 183 500		
Construction de la clôture du cimetière de Bonamy	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Canalisation de l'eau sur la route de Lagon	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	8 233 400		
Réhabilitation Centre de santé de Dufour	2026-05-04	2026-11-06		7 773 784.66		
Construction d'une citerne communautaire	2025-12-08	2026-06-30	approuve	7 308 032.46	20.68	
Extension route en béton pointe béton	2026-05-04	2026-11-06		7 799 882.81		
Réhabilitation d'une école nationale (toit et mur)	2025-11-01	2026-02-28	approuve	7 296 751.73		
Réhabilitation d'un centre de santé et installation de lampadaire (Pirèt)	2025-11-10	2026-03-31	approuve	7 735 931.23	20.1036	
Réhabilitation du Sous Commissariat de Mapou.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 052 482.50		

Construction mur de soutènement École Presbytérale de Saint Joseph	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 887 246.51		
Construction d'un espace de pépinière pour la production d'arbre fruitier et forestier (Palmis tanpe)	2025-09-01	2026-09-30	approuve	7 384 930.82		
Réhabilitation de la place du Général Larrieux	2026-02-02	2026-06-04	approuve	8 768 150.81		
Construction de trois (3) salle de classe a l'Ecole Nationale de Fond de Boudin	2026-05-04	2026-11-06		7 799 555.14		
Réhabilitation de la clôture du Lycée National de Pestel.	2026-01-12	2026-05-15	approuve	7 800 000		
Construction de 385 m³ de mur sec et 60 m³ de gabion à la ravine Pacot	2026-02-05	2026-06-08	approuve	7 505 193		
Réhabilitation de la Mairie de Môle Saint-Nicolas	2026-02-02	2026-06-04	approuve	8 737 390.80		
Réhabilitation du point de vente de la viande et des poissons de Jean-Rabel	2026-02-02	2026-06-05	approuve	8 036 312.15		
Réhabilitation Ecole nationale Croix des Pères	2026-05-04	2026-11-06		7 799 870.59		
Construction d'une Citerne communautaire	2025-12-08	2026-06-30	approuve	7 780 466.81	25.519999999999996	
Conservation de sol (Dubwa)	2026-04-10	2026-08-09	modifications_requises	7 293 803.88		
Extension Eau Potable : Carrefour Michel Platon Robert	2026-05-04	2026-11-06		7 799 901.4		
Réhabilitation de route vicinale de Bezin-Kokoye-Larintrie	2025-11-17	2026-02-26	approuve	7 799 600.66		
Construction d'une citerne communautaire (Bas terre froide)	2025-11-01	2026-03-31	approuve	7 780 466.81	24.639999999999999	
Réhabilitation structurelle et sécurisation des infrastructures de la place Canapé-vert	2026-05-04	2026-11-06		8 081 448.8		
Construction de kiosque d'eau potable (Centre Ville) et installation lampadaire solaire	2025-12-19	2026-04-19	approuve	7 782 476.97		
Réhabilitation d'un centre de santé (Bouzi)	2025-12-19	2026-06-30	approuve	7 773 266.39	44	
Réhabilitation de la toiture de l'école nationale de Bonamy.	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Conservation de sol (Kadas)	2025-09-01	2026-09-30	rejete	7 258 528.14		
Conservation de sol (Thoman)	2026-01-21	2026-05-22	approuve	7 626 639.98		
Cloture d'un terrain de futbol Orianie	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 544 601.45	28.50625	
Construction d'un espace de pépinière pour production de plantule (Rue Zolib)	2026-03-17	2026-07-16	approuve	7 798 312.43		

Construction de la clôture du cimetière de Savane Carrie	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Réhabilitation Route vicinale Bori Dufou	2026-05-04	2026-11-06		7 799 845.52		
Projet de Réhabilitation du Tronçon de la Route Centre-Ville vers L'homond en béton et en terre battue.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 009 300		
Bétonnage de 150 mètres à l'entrée de l'école communale de Marfranc	2026-03-23	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Conservation de sol avec structure mécano végétative (Kotino)	2025-12-19	2026-04-19	approuve	7 275 401.87		
Construction d'ouvrage de traversée Ravine Meramé	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 779 860.29		
Réhabilitation de l'école nationale de Caracol.	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Bétonnage de 90 mètres de route à Morne Dodo	2026-02-05	2026-06-05	approuve	7 424 092.14		
Réparation d'un dalot (Merceron (Joineau) pon janvy)	2025-12-08	2026-06-30	approuve	7 793 250.93	20.68	
Construction de 150 mètres de clôture de l'école nationale de Roseaux	2026-03-11	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Aménagement de 1 200 mètres carrés à l'entrée de l'école Nationale de Fond Rouge Torbeck.	2026-03-16	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Aménagement route vicinale Route Coloniale, Petite Rivière	2026-05-04	2026-11-06		7 799 606.9		
Réhabilitation de 197 mètres de clôture de la plage Raisinier	2026-02-01	2026-06-03	approuve	7 773 334.39		
Construction d'une citerne communautaire (Ti Sous)	2025-12-19	2026-06-30	approuve	7 798 979.62	25.5199999999999996	
Construction d'un espace de loisir	2026-04-06	2026-10-09		5		
Rehabilitation route Saint-Francois	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 848	26.43163265306123	
Réhabilitation place Anacaona (Culture)	2026-04-06	2026-10-09		7 799 850.54		
Installation de lampadaires Petite Rivière	2026-05-04	2026-12-04		8 049 852.87		
Réhabilitation du Bureau Agricole Communal (BAC) de Mapou	2026-04-20	2026-08-20	approuve	7 946 500		
Construction de bande de béton (Lycée Calixte Numa RABEL de Belle Anse)	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 219 331.20		
Correction de la ravine à travers la conservation du sol.	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	7 656 535		
Rehabilitation d'un centre de santé (Boucon, Junel Léon)	2025-11-10	2026-06-30	approuve	7 799 881.49		
Aménagement de l'Ecole Nationale Complete de Belle-Anse	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 565 936.37		

Construction d'un kiosque d'eau potable (Bare Jeanlys, Rue Ebenezer)	2025-11-10	2026-06-30	approuve	7 434 452		
Construction de bande de béton à Morne oso-Misèk	2026-05-04	2026-11-06		7 800 000		
Réhabilitation de l'école Marie Auxiliatrice (Montalè)	2025-12-08	2026-04-08	approuve	7 784 669.85	26.4	
Réhabilitation de l'école nationale de Nan Tuyaux	2026-02-02	2026-06-04	approuve	7 532 539.66		
Réhabilitation d'un kiosque d'eau potable (Boulay)	2025-11-10	2026-06-30	approuve	7 749 682.91	23.76	
Construction du système de distribution d'eau de Dadié à Bezin	2026-06-01	2026-11-06		7 799 991.76		
Construction de 500 m³ de mur sec à la ravine côtes Garde	2026-02-04	2026-06-08	approuve	6 942 806.96		
Construction d'une citerne communautaire du marché communal de marc	2025-09-01	2026-09-30	approuve	7 281 432.47		
Réhabilitation tronçon de route vicinale St valey Grès	2026-05-04	2026-11-06		7 799 612.50		
Construction d'une Place publique et installation de lampadaire (Localité courette)	2025-11-03	2026-06-30	approuve	7 277 680.45	28	
Clôture du cimetière du Centre-Ville de Côte de Fer	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 141 471.59		
Réhabilitation Tronçon de route vicinale Tikoma, St valey	2025-11-17	2026-07-30	approuve	7 799 060.59	22.53141945773525	
Travaux de Pose de Bandes de Béton sur 287 mètres linéaires de la ruelle du cimetière, reliant L'église Catholique de Vallières au cimetière de Vallières.	2026-03-10	2026-06-30	approuve	7 800 000.9		
Construction de système de captage d'eau pluviale(Sous Mitan)	2025-12-08	2026-04-08	approuve	7 793 418.40		
Réhabilitation dalot rue Boirond Tonnerre prolongé	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 083.26		
Projet d'achèvement d'un rale pour les marchandes	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	10 521 389.51		
Réhabiliter la place publique de Lasous	2026-01-08	2026-05-09	modifications_requises	7 795 251.70		
Réhabilitation Centre d'hébergement Felix Morisseau Leroy	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	7 836 032.50		
Gabionnage Rivière de Charlier	2026-04-06	2026-10-09		5		
Construction de bande de béton à l'Avenue du Progrès vers le Centre Polyvalent de Belle-Anse.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 119 968		
Réhabilitation place public et Bibliothèque de Grand-Goave	2026-04-06	2026-10-09		7 800 000		

Bétonnage de 110 mètres de route à Fond Moquette II	2026-02-04	2026-06-05	approuve	8 314 171.16		
Réhabilitation École Nationale de Sillègue	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 991.76		
Construction de la clôture du tribunal de Roseaux.	2026-03-12	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Construction d'un mur de soutènement (Tibonn 1)	2025-12-08	2026-04-08	approuve	7 254 841.41		
Réhabilitation d'une place publique et installation de lampadaire (Potino)	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 249 609.76		
Projet d'Achèvement du Parc Sportif de Côte de Fer	2026-04-20	2026-08-20	approuve	7 983 929		
Bétonnage d'un tronçon de 130 mètres de la route calvaire	2026-03-10	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Réhabilitation route vicinale la Saline Dano	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 153.92	25.78859649122807	
Projet de Réhabilitation du Tronçon de la Route Centre Ville vers Mouillage en terre battue.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	7 937 300		
Construction d'un dispensaires à Bezin	2026-05-04	2026-11-06		7 799 991.76		
Amélioration de route vicinale Morne Tiby	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 421 810.1		
Bétonnage de 90 ml rue chemisette rue concorde	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 848	24.876938775510204	
Construction de système de captage d'eau pluvial (Decayette Marouge)	2025-11-01	2026-04-30	approuve	7 763 245.14	26.4	
Réhabilitation du bâtiment principal de l'École Nationale Espère et Abricot (Six (6) salles de classe)	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Réhabilitation de la route du CV vers Eglantin en terre battu et en bande de béton	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	8 275 550.95		
Construction d'une Citerne communautaire (Nan Vèrye)	2025-11-01	2026-06-30	approuve	7 764 122.32	26.46	
Réhabilitation d'une école (Dubwa)	2025-11-03	2026-06-30	approuve	7 761 576.4	25.1999999999999996	
Construction d'un système de captage d'eau pluviale (Mawotyè)	2025-11-01	2026-02-28	approuve	7 764 122.32		
Projet de Réhabilitation du Tronçon de la Route Centre-Ville vers Frangipane en béton et en terre battue.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 067 949		
Aménagement d'un espace de laboratoire au lycée national technique de Petit trou de Nippes.	2025-12-01	2026-06-30	approuve	7 799 235.20		
Projet de protection des berges de la rivière en gabion sur 62 mètres linéaires pour la stabilisation de la rive gauche de la Grande Rivière du Nord à Bonamy.	2026-03-09	2026-06-30	approuve	7 800 000		

Construction d'une bande de béton au morne Machasse avec canalisation.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 279 789.20		
Reprofilage de la rivière Congo sur 493 mètres en amont et en aval de l'école nationale de Don Bosco	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Aménagement de la route de Anse-Chrétien et l'installation de lampadaires	2026-04-20	2026-08-20	modifications_requises	8 131 075		
Gabionnage (Lastik)/Conservation de sol	2025-12-19	2026-04-19	approuve	7 778 964.26		
Réhabilitation Route Vicinale Morne Borga - Carrefour Michel/Moinson La Chaudière	2026-05-04	2026-11-06		7 799 056.39		
CONSTRUCTION D'UNE CITERNE COMMUNAUTAIRE	2025-11-01	2026-02-28	approuve	7 772 992.31		
Construction d'une passerelle sur la Rivière gauche	2026-04-06	2026-10-09		5		
Réhabilitation et extension système irrigation Chantrelle Mabial	2026-06-01	2026-11-06		7 797 007.61		
Réhabilitation d'un terrain de basket-ball (Boskè)	2025-12-23	2026-04-23	approuve	7 991 437.15		
Réhabilitation d'une place publique et installation de lampadaire (Dubwa)	2025-11-01	2026-06-30	approuve	7 799 931.80	14	
Réhabilitation de la place publique d'Anse-Rouge	2026-02-02	2026-06-04	approuve	7 898 020.54		
Réhabilitation Route Vicinale Fauché Nan Plak	2026-05-04	2026-11-06		7 799 612.50		
Construction mur de soutènement rue Boirond Tonnerre prolongé	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 937 174.43	25.3002	
Construction d'une citerne de conservation d'eau (Tifon)	2025-11-10	2026-06-30	approuve	7 780 466.81	24.639999999999997	
Aménagement et captage de la Source Nan Fig pour l'approvisionnement en eau potable	2026-02-23	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Construction d'un espace de pépinière	2026-03-17	2026-07-16	approuve	7 798 312.43		
Réhabilitation route vicinale Paraison à la crête	2026-05-04	2026-11-06		7 799 491.34		
Construction d'un espace public Fauché	2026-05-04	2026-11-06		7 800 000		
Réhabilitation gabion Grand Ravine	2026-05-04	2026-11-06		7 991 965.78		
Amélioration de route vicinale Timontine-Mirande	2026-05-04	2026-11-06		7 787 372.25		
Construction 80 m³ de gabion et 2000 ml seuils à la ravine Maria	2026-02-02	2026-06-05	approuve	7 492 193		

Bétonnage de 100 mètres de route à la rue Mauricette	2026-02-02	2026-06-04	approuve	8 090 706.99		
Réhabilitation Route Vicinale Nan Kas Carrefour Leveye	2026-05-04	2026-11-06		7 800 000		
Réparation du bassin de distribution d'eau dlo tèt sous. (Foudoche)	2025-12-01	2026-03-31	approuve	6 540 689.96		
Réhabilitation canaux de drainage Pont Vincent	2026-05-04	2026-11-06		7 799 669.79		
Réhabilitation canaux de drainage fossé Sud	2026-05-04	2026-11-06		7 799 850.54		
Bétonnage de 80 ml de route avenue Jn Simon	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 848	26.520680272108848	
Réhabilitation route vicinale Dupuy – Sillègue	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 794 811.73		
Aménagement Route Vicinale Marché Chatuley	2026-05-04	2026-11-06		7 792 415.8		
Réhabilitation de la clôture de l'école nationale complète de Terrier-Rouge	2026-03-10	2026-06-30	approuve	7 800 000		
Construction de 120 m de canaux trapézoïdaux et reprofilage de 350 m de canaux en terre battue sur la rue Jean-Claude prolongée.	2026-03-23	2026-06-30	approuve	7 800 000.9		
Construction bloc sanitaire marché Communal de Léogane	2026-05-04	2026-11-06		7 799 987.29		
Construction d'une place publique	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 095 217.50		
Construction d'un système de captage d'eau pluvial	2025-11-01	2026-02-28	approuve	7 763 245.12		
Construction de bande de béton sur la route de Toussaint Louverture / Centre-ville de Belle-Anse.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 081 059.20		
Réhabilitation d'une école communale (Localité courette)	2025-11-01	2026-01-28	approuve	10 036 557		
Construction route vicinale Dupa	2025-11-17	2026-07-30	approuve	7 799 749.14	28.222	
Projet d'eau potable/Installation unité de pompage a Raymond	2026-05-04	2026-11-06		7 799 999.83		
Construction d'une citerne communautaire (Nan Mannak)	2025-11-01	2026-02-28	approuve	7 783 977.3		
Réhabilitation canaux de drainage centre-ville	2025-11-17	2026-06-30	approuve	6 133 806.33		
Projet de construction de puits, des Citermes publiques et Captage d'eau à Bandjann, Muret, Nan Talon, Morne Brule et Platon.	2026-04-20	2026-08-20	approuve	8 078 375		
Réhabilitation , reboisement de la place publique et installation de lampadaire (Centre Ville)	2025-12-08	2026-04-08	approuve	7 771 199.12		
Réhabilitation de centre professionnel de Kethan	2025-11-17	2026-06-30	approuve	9 465 321.78		

Réhabilitation d'une place publique et installation de lampadaire (Bourg Ganthier)	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 794 119.31		
Réhabilitation de route vicinale Kethan-Bernadel	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 796 003.59		
Installation de lampadaires solaires à Gérard	2026-05-04	2026-11-06		7 800 000		
Construction d'un ouvrage de traversée sur la ravine Congo près de l'école de Saint Jean Bosco.	2026-01-12	2026-05-15	approuve	7 799 999.59		
Réhabilitation d'une route vicinale (Courette, Saint Pierre, Latwazon)	2025-12-08	2026-04-08	approuve	7 320 837.7		
Réhabilitation de route vicinale Gardère Simontine et installation de lampadaires solaires	2025-12-01	2026-04-03	approuve	7 788 608.16		
Réhabilitation du Parc d'attraction Juvénile	2025-11-10	2026-03-09	approuve	7 724 011.5		
Réhabilitation tronçon de route vicinale Grös Bori	2025-11-17	2026-07-30	approuve	7 799 757.36	25.62787878787879	
Bétonnage de 80ml rue Pétion, rue Courte	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 799 786.89	26.555442176870752	
Réhabilitation école communautaire St Cyr	2025-11-17	2026-06-30	approuve	7 793 123.16		
Réhabilitation d'un espace de pépinière (Merceron)	2026-03-17	2026-07-16	approuve	7 798 312.43		
Réhabilitation de place publique Notre-Dame de la Nativité	2025-12-01	2026-06-30	approuve	7 794 480.25		
Réhabilitation système eau potable lafond	2026-05-04	2026-11-06		7 797 052.83		
Réhabilitation d'un lac collinaire (Simeyon)	2025-12-23	2026-04-23	approuve	7 784 589.54		
Aménagement paysager, équipements et activation communautaire de la place Canapé-vert	2026-05-04	2026-11-06		7 518 482.58		
Réhabilitation d'un centre culturel (Orianie)	2025-12-23	2026-04-23	approuve	7 793 938.3		
Bétonnage de 117 mètres de l'entrée du lycée St Bernard.	2026-01-05	2026-05-08	approuve	7 800 000		
Amélioration d'un tronçon critique de 240 mètres de la route Otencia, section communale de Fond Rouge Torbeck	2026-02-23	2026-06-25	approuve	7 800 000.9		

Tableau 1 : Situation des petits projets financés à travers le Programme de Structuration Territoriale et de Développement janvier à Mars 2026

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
PSTD¹						
Travaux de drainage et de bétonnage de rues dans la commune de Ferrier dans le Département du Nord-Est	20,573,333.0 0	20,573,333.00	0.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Bétonnage de 160ml de la rue des Marchés dans la 3ième section communale Petit- Anse du Cap Haïtien dans le Département du Nord	9,233,824.32	9,233,824.32	0.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale St-Joseph de Frederic	3,827,637.50	2,966,946.00	860,691.50	77.51%	88%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Damier Jessé	3,827,637.50	3,017,193.75	810,443.75	78.83%	87%	Protocole d'accord de financement additionnel entre le FAES et l'ONG Un Enfant par la Main pour la finalisation des travaux
Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Ray Poste	3,827,637.50	3,060,393.75	767,243.75	79.96%	88%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts.
Construction du Marché public de Niel dans la commune de Marchand Dessalines	3,853,837.00	2,791,653.30	1,062,183.70	72.44%	80%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts.

¹ Il faut remplir les champs afin de présenter les données globales du programme

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Altary	3,827,637.50	0	3,827,637.50	0.00%	0.00%	Les 2 écoles initialement prévues (EN Oreste I et Deslandes) ont bénéficié d'un plus grand financement du MENFP /FNE pour la construction complète. Un nouveau contrat sera signé pour les EN Altary et Mirault
Extension de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Mirault	3,827,637.50	0	3,827,637.50	0.00%	0.00%	
Bétonnage de 150ml de route avec 2 bandes de béton hydraulique et un pavage en maçonnerie de roches de route de la 5ème Section Baliverne de Dame-Marie du Département de la Grand-Anse.	2,499,357.00	2,499,357.00	0.00	100%	100%	Réceptionné définitivement
Bétonnage de 550 ml de route avec 2 bandes de béton hydraulique et un pavage en maçonnerie de roches du tronçon de route reliant Carrefour Norée à Fleury via Estiverne dans la commune de Chambellan du Département de la Grand-Anse.	7,999,688.13	7,999,688.13	0.00	100%	100%	Réceptionné définitivement
Bétonnage de 90ml de la ruelle Derzneau/ Brutus à Ravine Trompette dans la commune de Pilate	4,538,269.51	4,424,812.78	113,456.73	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Bétonnage 794 m2 de route à Morne Savon (Mago) dans la commune de Pilate	4,423,367.29	4,312,783.10	110,584.19	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Erection d'un mur de clôture de 300ml du terrain de jeu de Roseaux.	2,556,734.87	2,556,734.87	0.00	100%	100%	Réceptionnés provisoirement
Construction d'un poste de Police à Privilé dans la commune de Jérémie	3,594,892.00	3,594,892.00	0.00	100%	100%	Réceptionnés provisoirement

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
Construction de 3 salles de classe et un bloc sanitaire de l'Ecole Nationale de Parotie de Carrefour-Sanon de Jérémie dans le Département de la Grand-Anse	5,398,128.00	5,398,128.00	0.00	100%	100%	Réceptionnés provisoirement
Erection d'un mur de clôture de 245.77ml du cimetière de la commune de Grand-Gosier	6,252,528.06	6,096,214.87	156,313.19	97.50%	100%	Réceptionnés provisoirement
Bétonnage de 250ml de la route d'accès au marché public de Thiotte	9,688,723.33	9,446,505.27	242,218.06	97.50%	100%	Réceptionnés provisoirement
Réhabilitation du marché public de Thiotte	5,358,748.00	5,224,779.30	133,968.70	97.50%	100%	Réceptionnés provisoirement
Lot 1: Bétonnage de 150 ml de route à Morne Moreau dans la commune de Bainet dans le Département du Sud-Est	3,310,706.00	3,276,868.35	33,837.65	98.98%	100%	Réceptionnés provisoirement
Lot 2: a) Bétonnage de 200 ml de route à Watapana dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est	4,325,594.40	4,325,594.40	0.00	100%	100%	Réceptionnés définitivement
Lot 2: b) Bétonnage de 154 ml de route à Mayard dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est	3,327,187.76	3,327,187.76	0.00	100%	100%	Réceptionnés définitivement
Lot 2: c) Bétonnage de 65 ml de route à Labidou dans la commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est	1,584,028.60	1,584,028.60	0.00	100.00%	100%	Réceptionnés définitivement
Lot 2: d) Bétonnage de 246 ml de route à Bréman dans la D32 commune de Jacmel dans le Département du Sud-Est	5,930,708.24	5,930,708.24	0.00	100.00%	100%	Réceptionnés définitivement

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
Lot 3: Construction d'un passage à gué à Pérédo dans la Commune de Marigot dans le Département du Sud-Est	3,113,864.00	0.00	3,113,864.00	0.00%	0%	Un avenant portant sur la modification de la mission du projet car à la suite du passage du cyclone Laura qui a dévasté la section communale de Pérédo, la construction du passage à gué prévu dans le Lot 3 de huit (8) mètres de longueur est devenue impossible à réaliser pour le même montant car la longueur s'étend désormais sur vingt-et-deux (22) mètres.
Réhabilitation de la place publique Biassou de Saint Raphael dans le Département du Nord.	6,913,123.99	4,204,394.80	2,708,729.19	60.82%	64%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Erection d'un mur de clôture de 104ml du Sous-commissariat de Cadush à Morne Pelée dans la commune de Quartier Morin	2,946,163.26	2,872,509.17	73,654.09	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Bétonnage de 70ml de la route Galman Duplan, 1ère section communale de BASSE PLAINE, Quartier Morin, Département Nord	2,724,871.26	2,656,749.48	68,121.78	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction d'un impluvium à Dimois, section communale de Beaumont	2,246,940.00	2,190,766.00	56,174.00	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction de la place publique de Trou Bois dans la localité de Duchity, 5ème section communale de Pestel	1,787,250.00	536,175.00	1,251,075.00	30%	30%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
Construction de 10 hangars au marché public de Désriveaux dans la localité de Jean Bellune, 3e section communale de Pestel	2,697,000.00	2,629,575.00	67,425.00	97.5%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction du Lycée National de Plaisance du Sud dans le département des Nippes/1ère phase.	21,299,998.9 7	17,246,523.24	4,053,475.73	76%	81%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Construction de 15 logements sociaux à Degerme, 4ème section communale de Lasseringue de la commune d'Abricot dans le département de la Grand- Anse	15,300,000.0 0	4,360,500.00	10,939,500.00	28.50%	15%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Projet de Bétonnage de 150 ml route Bellevue Palais des Rois, Limonade, Département Nord.	4,577,293.09	4,462,860.76	114,432.33	97.50%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction du complexe administratif de Moron	9,900,000.00	5,040,280.53	4,859,719.47	40%	51%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Construction d'une place publique à Carcasse situé dans la commune de Les Irois	1,799,899.96	1,709,904.96	89,995.00	95%	100%	Réceptionné provisoirement
Bétonnage de 70 ml de route de la rue Nativité à Dame- Marie dans le Département de la Grand-Anse.	2,699,710.00	2,489,132.62	210,577.38	92%	100%	Réceptionné provisoirement
Réhabilitation de la plage publique Laissez-Moi de Miragoane	21,299,850.0 0	19,351,881.9	9,158,935.50	90%	100%	Réceptionné provisoirement
Lot 1: Construction de 1.5km de canal de drainage a Lagaudray sur la route de Port-Salut dans la commune de Cayes	11,548,000.0 0	4,656,224.31	6,891,775.69	39.53.%	59.67%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant

Titre du projet	Coût total du Programme / projet En Gourdes	Etat d'avancement				Remarques
		Montant total déjà décaissé En Gourdes	Balance à date	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
						suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts.
Lot 2: Réhabilitation du marché public de Boury et érection de 56.88ml de gabion de la rive gauche de la riviere Lacoriere	6,344,001.20	2,947,226.44	3,396,774.76	46. %	53.54%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts.
Lot 3 : Réhabilitation du captage de Formond situé dans la 1ere section communale de Torbeck	592,055.50	541,730.79	50,324,.72	100. %	100%	Réceptionné provisoirement

Réhabilitation de 28 écoles

Titre du projet	date de début des travaux	date de fin du contrat	Statut ¹ * du projet	Coût total du projet en Gourdes	Etat d'avancement			Remarques
					Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisatio ns des activités	
Réhabilitation de l'EFA de Belle-Anse	28 jan.2018		Achevé	11,453,264 .32	11,453,264.32	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Mare Briole	28 jan.2018		Achevé	4,707,487. 60	4,707,487.60	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Baie d'Orange	28 jan.2018		Achevé	7,646,252. 73	7,646,252.73	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Cyvadier	19 mars 2019 19 mars 2019		Achevé	7,607,883. 50	7,607,883.50	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement

Réhabilitation de l'Ecole Nationale des Orangers K-Dougé	19 mars 2019		Achevé	9,879,211.00	9,879,211.00	100%	100%	
Réhabilitation de l'EFA et Ecole Nationale de Meyer	19 mars 2019		Achevé	13,715,464.50	13,715,464.50	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Exina Gilles	24 janv. 2019		Achevé	8,369,931.82	8,369,931.82	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Edèze Gousse	24 janv. 2019		Achevé	12,359,466.37	12,359,466.37	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Fort Ogé	24 janv. 2019		Achevé	7,245,482.91	7,245,482.91	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Morne à Bruler	19 mars 2019 19 mars 2019		Achevé	9,488,235.30	9,488,235.30	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Bellevue	19 mars 2019		Achevé	8,710,622.54	8,710,622.54	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Lavanneau	19 mars 2019		Achevé	7,614,460.00	7,614,460.00	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale des Amazones	18 déc. 2018		Annulé					En attente d'une réponse du MENFP pour financer les travaux de reconstruction de l'école suite à des dommages causés sur les bâtiments lors de l'abattage d'un arbre.
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Dumont	18 déc. 2018		Achevé	7,835,885.00	7,389,987.88	94.31%	98%	Ecole réceptionnée provisoirement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale L. Sicard de Pèlerin	18 déc. 2018		Achevé	5,972,992.00	5,823,667.20	97.50%	100%	Ecole réceptionnée provisoirement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Laborde	18 déc. 2018		A l'arrêt	5,359,315.00	4,562,294.25	85.13%	85%	Travaux presque terminés. Il reste l'installation de la pompe à eau
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Caiman	18 déc. 2018		Achevé	6,114,409.00	5,961,548.78	97.50%	100%	Ecole réceptionnée provisoirement

Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Casse	2 déc. 2019			9,997,235.62	-	0.00%	15%	Contrat non approuvé par la CSCCA et retourné au FAES en septembre 2021. Les 3 écoles ont été affectées par le séisme du 14 août 2021. Casse: Pas encore de confirmation du bureau régional concernant l'ampleur des dégâts. Notre Dame de Lourdes: l'école est irréparable. Il faut la reconstruire. Les bâtiments sont déjà démolis et le terrain est prêt pour recevoir les abris provisoires du FNE. Potus: Cette école a été sévèrement endommagée. Le directeur de l'école suggère une reconstruction.
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Notre Dame de Lourdes	2 déc. 2019			12,097,941.60	-	0.00%	16%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Potus	2 déc. 2019		Marché non approuvé par la CSCCA	6,019,359.60	-	0.00%	14%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Mixte de Moron	01 mars 2018		Achevé	12,746,739.50	12,746,739.50	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation du Lycée Congrég. St Martin de Porès	01 mars 2018		Achevé	8,295,432.00	8,295,432.00	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Métayer	14 avr. 2020		A l'arrêt	14,343,373.00	2,868,674.60	20%	15%	Des dommages ont été causés par le passage du séisme le 14 août 2021. Selon le procès-verbal de la visite du Bureau Régional du Sud-est datant du 6 déc 2021: Champy: faiblement atteinte. Les travaux de réhabilitation peuvent continuer. Herivaux: gravement atteinte. Il faudra penser à une reconstruction. Métayer: Tôles emportées par le vent, avec quelques fissures mineures. Le
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Champy	14 avr. 2020		A l'arrêt	10,755,214.00	2,151,042.80	20%	16%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Herivaux	14 avr. 2020		A l'arrêt	11,689,370.00	2,337,874.00	20%	14%	

								directeur de l'école y compris les notables de la localité opte pour une reconstruction sachant que l'école a déjà été réhabilitée à deux reprises.
Réhabilitation de l'EFA de Beaumont	19 déc. 2018		Achevé	5,010,248.00	5,010,248.00	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Duchity	20 déc. 2018		Achevé	6,265,754.75	6,265,754.75	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Plaine Martin	21 déc. 2018		Achevé	10,410,500.00	10,410,500.00	100%	100%	

Tableau 2 : Situation du Programme de Rénovation des Pôles Régionaux et Locaux de Développement Janvier à Mars 2026

Titre du projet	Statut ¹ * du projet	Coût total du projet en Gourdes	Etat d'avancement			Remarques
			Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisations des activités	
Erection de clôture et de blocs sanitaires du terrain de football Pernerle de Fond des Nègres	Achevé	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction d'une place publique à Carrefour Marassa dans la commune de Croix des Bouquets	Achevé	9,999,530.00	9,999,530.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction de 554 ml de 2 rues dans la commune de Duchity	Achevé	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction de 400ml de route en béton à Saint Louis du Nord	Achevé	9,990,400.00	9,990,400.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Réparation de 240 toitures dans le département du Nord-Est	Achevé	9,848,382.64	9,848,382.64	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction d'une école agricole dans l'habitation Merande dans la commune de Ferrier	Achevé	9,998,408.70	9,998,408.70	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction de 460ml de route en béton à Jean Rabel	Achevé	9,999,850.00	9,999,850.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement

Aménagement d'un hangar au carrefour de la Vallée de Jacmel et réhabilitation de 40ml avec une largeur de 6m de route en béton hydraulique de 20cm d'épaisseur sur la route de Gris-Gris	Achevé	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Bétonnage de 70 ml de route à Corail Lamothe dans la commune de Belle Anse et bétonnage de 125 ml de route à Morne Zombi dans la commune de Thiotte	Achevé	2,500,000.00	1,862,000.00	74.48%	75%	Les 70ml de route à Corail Lamothe ont été bétonnés et seulement 80ml (sur 125ml) ont été bétonnés à Morne Zombi. Au regard de l'augmentation des coûts des matériaux l'exécutant avait sollicité une réduction de la masse des travaux à Morne Zombi (pour bétonner 80ml). Demande non approuvé
Aménagement du terrain de Siloe et bétonnage de 90 ml de route à Labidou	Achevé	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Renforcement d'infrastructure de base dans le Plateau Central / Phase 1: construction de 3 places publiques	A l'arrêt	9,903,300.00	3,529,923.81	35.64%	41%	1 place finalisée mais les travaux des 2 autres places sont à l'arrêt dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Réhabilitation de 1264ml de route reliant le centre-ville de Maniche à Port-Salut	Achevé	4,906,000.70	4,906,000.70	100.00%	100%	Receptionné definitivement
Construction de 2 ponceaux qui vont relier les localités suivantes: Guilleme, Brunie, Dantan, Mme Combe, Picot et Pelerin dans le departement du Sud	Résiliation de contrat	4,715,646.76	4,715,646.76	100.00%	60%	Un nouveau contrat a été signé avec BUTECOM pour la poursuite des travaux.
Construction d'un ponceau dans la commune des Cayes	En cours d'exécution	4,943,250.00	3,523,447.69	57%	63%	Un nouveau contrat a été approuvé par la CSCCA en vue de finaliser le chantier. Une demande de décaissement de 605,795.29 Gourdes, représentant 30% de l'avance démarrage des travaux de finalisation du ponceau des cayes. Ce qui ramène le montant total décaissé à : 2,817652.4 + 605,795.29 = 3, 523,447.69 Gourdes.
Construction de 2 mini centres universitaires de l'Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves et à Saint-Marc	Résiliation de contrat	1,557,750.34	1,557,750.34	100.00%	16%	Contrat résilié. Un nouveau contrat a été signé avec Valcin Construction pour la poursuite des travaux

Construction de 2 mini centres universitaires de l'Université Publique de l'Artibonite aux Gonaïves et à Saint-Marc	A l'arrêt	8,325,727.74	0.00	0.00%	0%	La firme VALCIN CONSTRUCTION avait soumis une demande de décaissement d'un montant de 1,674,271.32 HTG pour l'exécution de travaux de remblai et de déblai. Toutefois, la DPS n'était pas en mesure de traiter cette demande, ces travaux n'ayant pas été prévus dans le devis contractuel initial. À cet effet, la firme avait été invitée à soumettre une demande de changement, accompagnée : - d'un devis rectificatif, sans modification du montant global du contrat ; - d'un tableau de cubatures de terrassement, dûment validé par la mission de supervision. L'ensemble de ces documents devait être préalablement approuvé par la DPS. Par ailleurs, s'agissant d'un nouveau site, il était requis de fournir : - une autorisation officielle signée et scellée de la Mairie de Saint-Marc ; - les titres de propriété du terrain concerné. Malgré les dispositions convenues, l'entreprise n'avait pas manifesté d'intérêt pour la poursuite et la finalisation du processus.
Construction du marché communal de Gros-Morne	A l'arrêt	9,996,045.46	8,547,745.92	85.51%	75%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Construction de 209 ml de route en béton à la rue Saint Charles	Achevé	4,194,010.50	4,194,010.50	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction des blocs B et C du centre culturel de Jean Rabel.	A l'arrêt	10,000,000.00	2,850,000.00	28.50%	30%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts

Construction de 4 (quatre) kiosques au marché de "fritay" de Carrefour Charles de la commune de Jérémie	Achevé	2,178,841.00	2,178,841.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction de 15 unités de logements sociaux à Degerme dans la commune d'Abricot	Achevé	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Adoquinage de 120 ml à l'impasse Martineau dans la commune de Jérémie	Achevé	1,815,200.00	1,089,800.81	60.04%	100%	(*)Travaux d'adoquinage de 80ml finalisés. Le projet a été mal évalué car l'impasse Martineau ne mesure que 80 ml de long. Elaboration d'un avenant négatif sur le montant du contrat.
Bétonnage de 300ml de rue à Labidou	Achevé	5,765,550.00	5,765,550.00	100.00%	100%	Réception définitivement le 18 juillet 2019
Construction du centre culturel de l'Anse-a-Veau dans le département des Nippes (Phase 1 / Module 1&2)	A l'arrêt	9,995,690.26	2,848,771.72	28.50%	45%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Réhabilitation de deux tronçons de route dans les quartiers de Fort St-Michel (Rue Gabart) et Vertières (Rue Tabernacle) de la commune du Cap-Haïtien.	Achevé	9,999,997.50	9,499,997.63	95.00%	100%	Réceptionné définitivement.
Réhabilitation de routes par l'approche de Haute Intensité de Main d'Œuvre (HIMO) dans les quatre communes de l'arrondissement de Belle-Anse (Belle-Anse, Grand Gosier, Anse à Pitres et Thiotte).	Achevé	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction de 400 mètres linéaires du tronçon de route Morisseau-l'Asile.	Achevé	10,000,000.00	9,500,000.00	95.00%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction de trois (3) terrains de jeux multidisciplinaires [dans les communes de Port-Salut, de Chardonnières et de Cavaillon].	Achevé	9,999,974.28	8,862,429.32	88.62%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction de 300ml de rue dans la commune d'Ouanaminthe	Achevé	10,000,000.00	9,495,999.40	94.96%	100%	Réceptionné provisoirement
Réhabilitation du marché de Dame Marie	Achevé	2,987,010.00	2,987,010.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement

Construction d'une école communale à Lascahobas dans le département du centre (Catherine Flon à Morène, 1ère section Petit Fond)	A l'arrêt	9,984,582.80	5,911,893.90	59.21%	65%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Bétonnage de 250ml du tronçon de route dans la commune de Maniche dans le Département du Sud	A l'arrêt	5,093,999.30	3,209,219.56	63.00%	70%	Projet actuellement à l'arrêt, dans l'attente d'une demande de financement complémentaire faisant suite à l'évaluation de l'augmentation des coûts
Erection de 450ml de clôture du Lycée de Saint Michel de l'Atalaye, Département de l'Artibonite	Achevé	6,887,800.00	6,887,800.00	100.00%	100%	Réceptionné définitivement
Construction du Sous-Commissariat de Cadush, situé à Morne Pélé dans la commune de Quartier Morin du Département du Nord.	Achevé	6,842,080.45	6,842,080.45	100.00%	100%	Réceptionné provisoirement
Construction d'une école de formation technique dans la commune de Limbé dans le Département du Nord	En cours d'exécution	9,989,550.00	9,490,072.5	97.5%	100%	Réceptionné provisoirement
Supervision des travaux d'infrastructures du Lot 1 (Grand Sud : Nippes, Grand-Anse et Sud)		2,645,000.00	1,964,671.90	74.28%		
Supervision des travaux d'infrastructures du Lot 2 (Grand Nord : Nord, Nord-est et Nord-ouest)		1,875,000.00	1,479,910.71	78.93%		
Supervision des travaux d'infrastructures du Lot 3 (Artibonite, Centre, Ouest et Sud-est)		1,835,000.00	998,036.11	54.39%		

Tableau 3 : Situation du Programme de Réhabilitation de 28 écoles du MENFP Janvier. à Mars 2026

Titre du projet	date de début des travaux	date de fin du contrat	Statut ¹ * du projet	Coût total du projet en Gourdes	Etat d'avancement			Remarques
					Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisations des activités	
Réhabilitation de l'EFA de Belle-Anse	28 jan.2018		Achevé	11,453,264.32	11,453,264.32	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Mare Briole	28 jan.2018		Achevé	4,707,487.60	4,707,487.60	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole	28 jan.2018		Achevé	7,646,252.73	7,646,252.73	100%	100%	

Nationale de Baie d'Orange								
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Cyvadier	19 mars 2019 19 mars 2019		Achevé	7,607,883.50	7,607,883.50	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale des Orangers K-Dougé	19 mars 2019		Achevé	9,879,211.00	9,879,211.00	100%	100%	
Réhabilitation de l'EFA et Ecole Nationale de Meyer	19 mars 2019		Achevé	13,715,464.50	13,715,464.50	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Exina Gilles	24 janv. 2019		Achevé	8,369,931.82	8,369,931.82	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale d'Edèze Gousse	24 janv. 2019		Achevé	12,359,466.37	12,359,466.37	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Fort Ogé	24 janv. 2019		Achevé	7,245,482.91	7,245,482.91	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Morne à Bruler	19 mars 2019 19 mars 2019		Achevé	9,488,235.30	9,488,235.30	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Bellevue	19 mars 2019		Achevé	8,710,622.54	8,710,622.54	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Lavanneau	19 mars 2019		Achevé	7,614,460.00	7,614,460.00	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale des Amazones	18 déc. 2018		Annulé					En attente d'une réponse du MENFP pour financer les travaux de reconstruction de l'école suite à des dommages causés sur les bâtiments lors de l'abattage d'un arbre.
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Dumont	18 déc. 2018		Achevé	7,835,885.00	7,389,987.88	94.31%	98%	Ecole réceptionnée provisoirement

Réhabilitation de l'Ecole Nationale L. Sicard de Pèlerin	18 déc. 2018		Achevé	5,972,992.00	5,823,667.20	97.50%	100%	Ecole réceptionnée provisoirement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Laborde	18 déc. 2018		A l'arrêt	5,359,315.00	4,562,294.25	85.13%	85%	Travaux presque terminés. Il reste l'installation de la pompe à eau
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Caiman	18 déc. 2018		Achevé	6,114,409.00	5,961,548.78	97.50%	100%	Ecole réceptionnée provisoirement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Casse	2 déc. 2019		Marché non approuvé par la CSCCA	9,997,235.62	-	0.00%	15%	Contrat non approuvé par la CSCCA et retourné au FAES en septembre 2021. Les 3 écoles ont été affectées par le séisme du 14 août 2021. Casse: Pas encore de confirmation du bureau régional concernant l'ampleur des dégâts. Notre Dame de Lourdes: l'école est irréparable. Il faut la reconstruire. Les bâtiments sont déjà démolis et le terrain est prêt pour recevoir les abris provisoires du FNE. Potus: Cette école a été sévèrement endommagée. Le directeur de l'école suggère une reconstruction.
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Notre Dame de Lourdes	2 déc. 2019			12,097,941.60	-	0.00%	16%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Potus	2 déc. 2019			6,019,359.60	-	0.00%	14%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Mixte de Moron	01 mars 2018		Achevé	12,746,739.50	12,746,739.50	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation du Lycée Congrég. St Martin de Porès	01 mars 2018		Achevé	8,295,432.00	8,295,432.00	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement

Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Métayer	14 avr. 2020		A l'arrêt	14,343,373.00	2,868,674.60	20%	15%	Des dommages ont été causés par le passage du séisme le 14 août 2021. Selon le procès-verbal de la visite du Bureau Régional du Sud-est datant du 6 déc 2021: Champy: faiblement atteinte. Les travaux de réhabilitation peuvent continuer. Herivaux: gravement atteinte. Il faudra penser à une reconstruction. Métayer: Tôles emportées par le vent, avec quelques fissures mineures. Le directeur de l'école y compris les notables de la localité opte pour une reconstruction sachant que l'école a déjà été réhabilitée à deux reprises.
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Champy	14 avr. 2020		A l'arrêt	10,755,214.00	2,151,042.80	20%	16%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale Herivaux	14 avr. 2020		A l'arrêt	11,689,370.00	2,337,874.00	20%	14%	
Réhabilitation de l'EFA de Beaumont	19 déc. 2018		Achevé	5,010,248.00	5,010,248.00	100%	100%	Ecole réceptionnée définitivement
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Duchity	20 déc. 2018		Achevé	6,265,754.75	6,265,754.75	100%	100%	
Réhabilitation de l'Ecole Nationale de Plaine Martin	21 déc. 2018		Achevé	10,410,500.00	10,410,500.00	100%	100%	

Tableau 4 : Situation du programme, KOWEIT/FNE Janvier à Mars 2026

Titre du projet					Etat d'avancement	Remarques
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-----------

	date de début des travaux	date de fin du contrat	Statut ¹ du projet	Coût total du projet en Gourdes	Montant total déjà décaissé	% déjà décaissé	% de réalisat ions des activité s	
KOWEIT/ Construction du Lycée de Roseline Vaval			Achev é	81,747,44 5.65	74,713,9 30.45	91.40%	100%	Réceptionné provisoirement
KOWEIT/ Construction du Lycée de de Petit Trou de Nippes			Achev é	82,147,58 4.51	74,591,9 69.89	90.80%	100%	Réception provisoire en planification
KOWEIT/ Construction du Lycée de Débouchette				78,284,51 5.40	70,934,5 49.97	90.61%	55%	Une demande de financement est actuellement en cours auprès de la BID en vue de la finalisation du projet.

Fait à Port-au-Prince, avril 2026

La Direction Générale du FAES
