

TABLE VERTE DE CONCERTATION SUD-GRAND'ANSE

Programme de Protection Durable des Terres des Hauts
Bassins Versants du Sud 'Ouest d'Haïti

GRT/FM-11803-HA & GRT/HR-13930-HA

Direction UGP-Macaya

Port-Salut, 27 mai 2016





Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges





Sommaire

1. **Présentation Fiche signalétique du Programme**
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges



Titre du programme : **Programme de Gestion Durable des Terres des Hauts Bassins Versants du Sud'Ouest d'Haïti**

Durée du projet : **60 mois**

Date du démarrage de l'intervention : **Octobre 2012**

Date de Fin du Programme : **Mai 2017 (GEF)/ Septembre 2017 (FRH)**


Budget total : **USD 12,436,364.00**

Contribution du GEF : **USD 3,436,364.00**

Contribution de la Norvège (FRH) : **USD 9,000,000.00**

Contribution l'Etat Haïtien : **USD 400,000.00**

Secteurs d'intervention : **Environnement/Biodiversité**



29/01/2016

Programme de Gestion Durable des Terres des
Hauts Bassins Versants du Sud'Ouest d'Haïti



Sommaire


1. Présentation Fiche signalétique du Programme
- 2. Zone d'Intervention**
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges







Parc National Naturel Macaya

- Localisation : Massif de la Hotte, à cheval sur départements: Sud et Grand'Anse;
- Créé : Décret 4 Avril 1983, arrêtés présidentiels mars 2013 et août 2014;
- Superficie : 13,436 hectares;
- Réserve de la Biosphère, UNESCO (mars 2016)

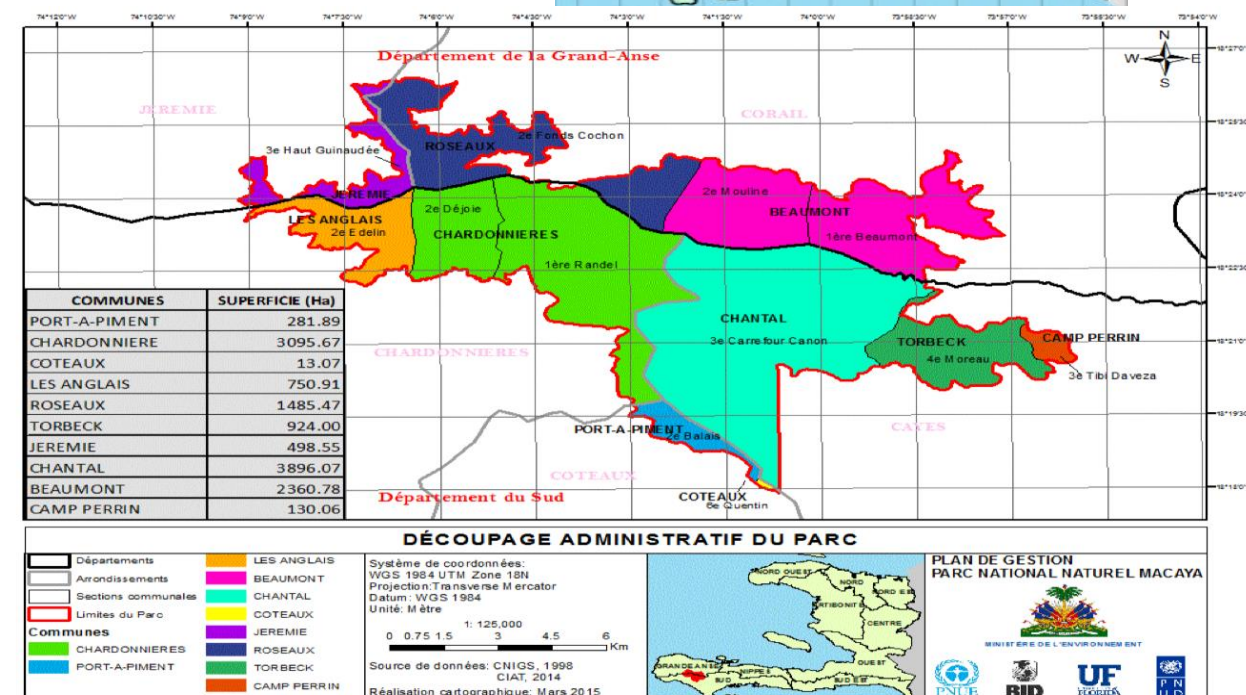







Parc Macaya: Château d'eau/ 8 BV

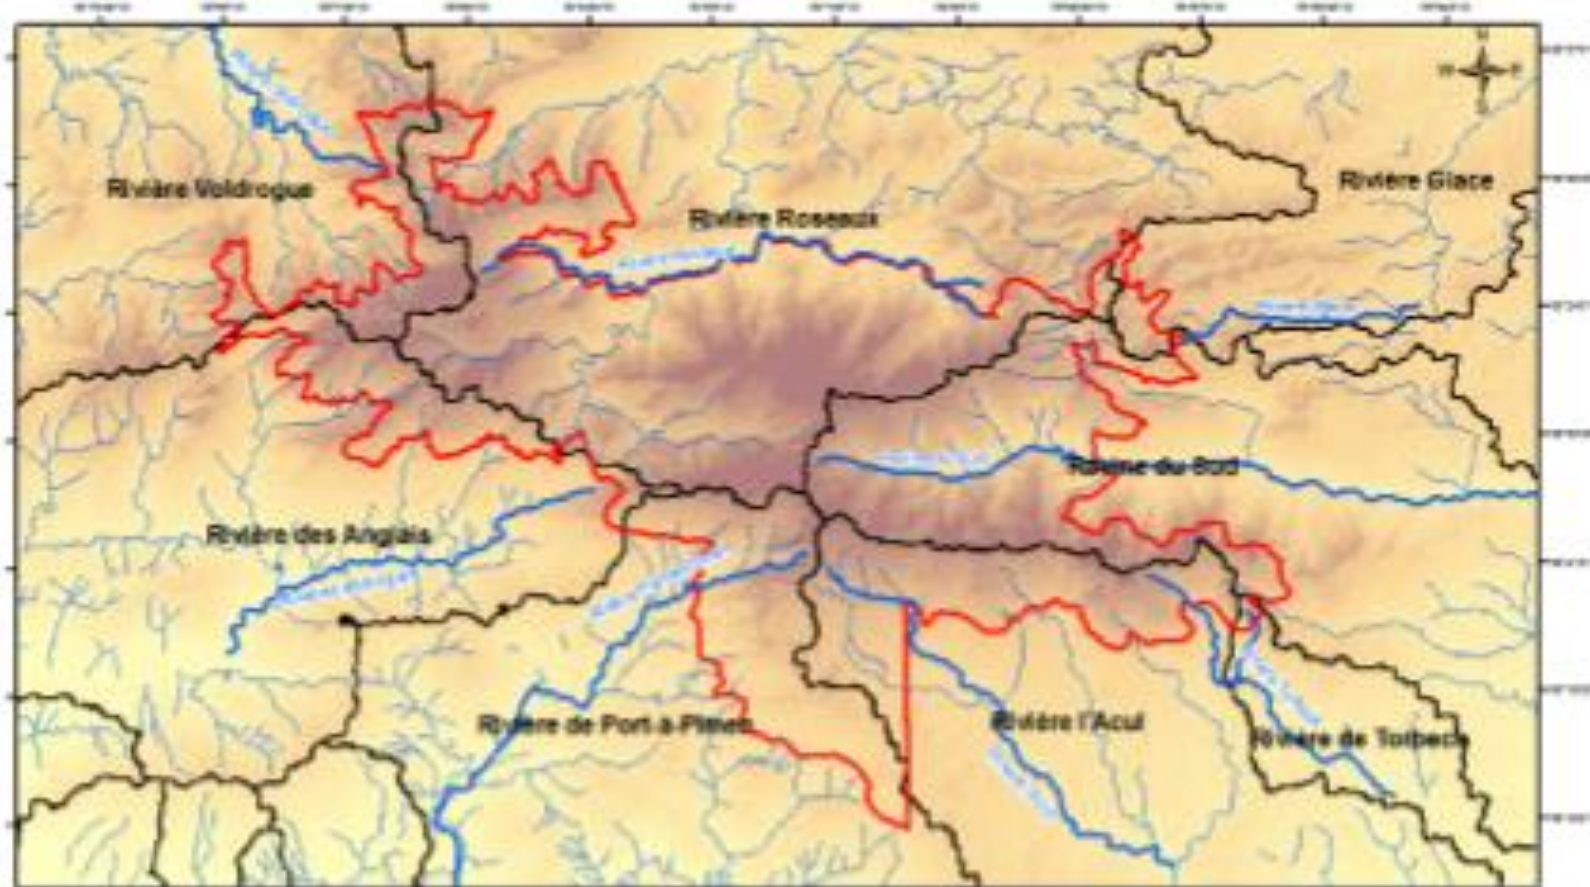



Parc Macaya: Riche en Diversité Biologique





Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
- 3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées**
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges






Programme GEF - FRH

Trois Grands axes d'intervention :

- Etablissement du Parc (Zone Centrale)
- Amélioration de l'attractivité du territoire de la zone tampon selon une gestion durable (Zone Tampon)
- Aménagement de bassins versants (Zone Transversale)




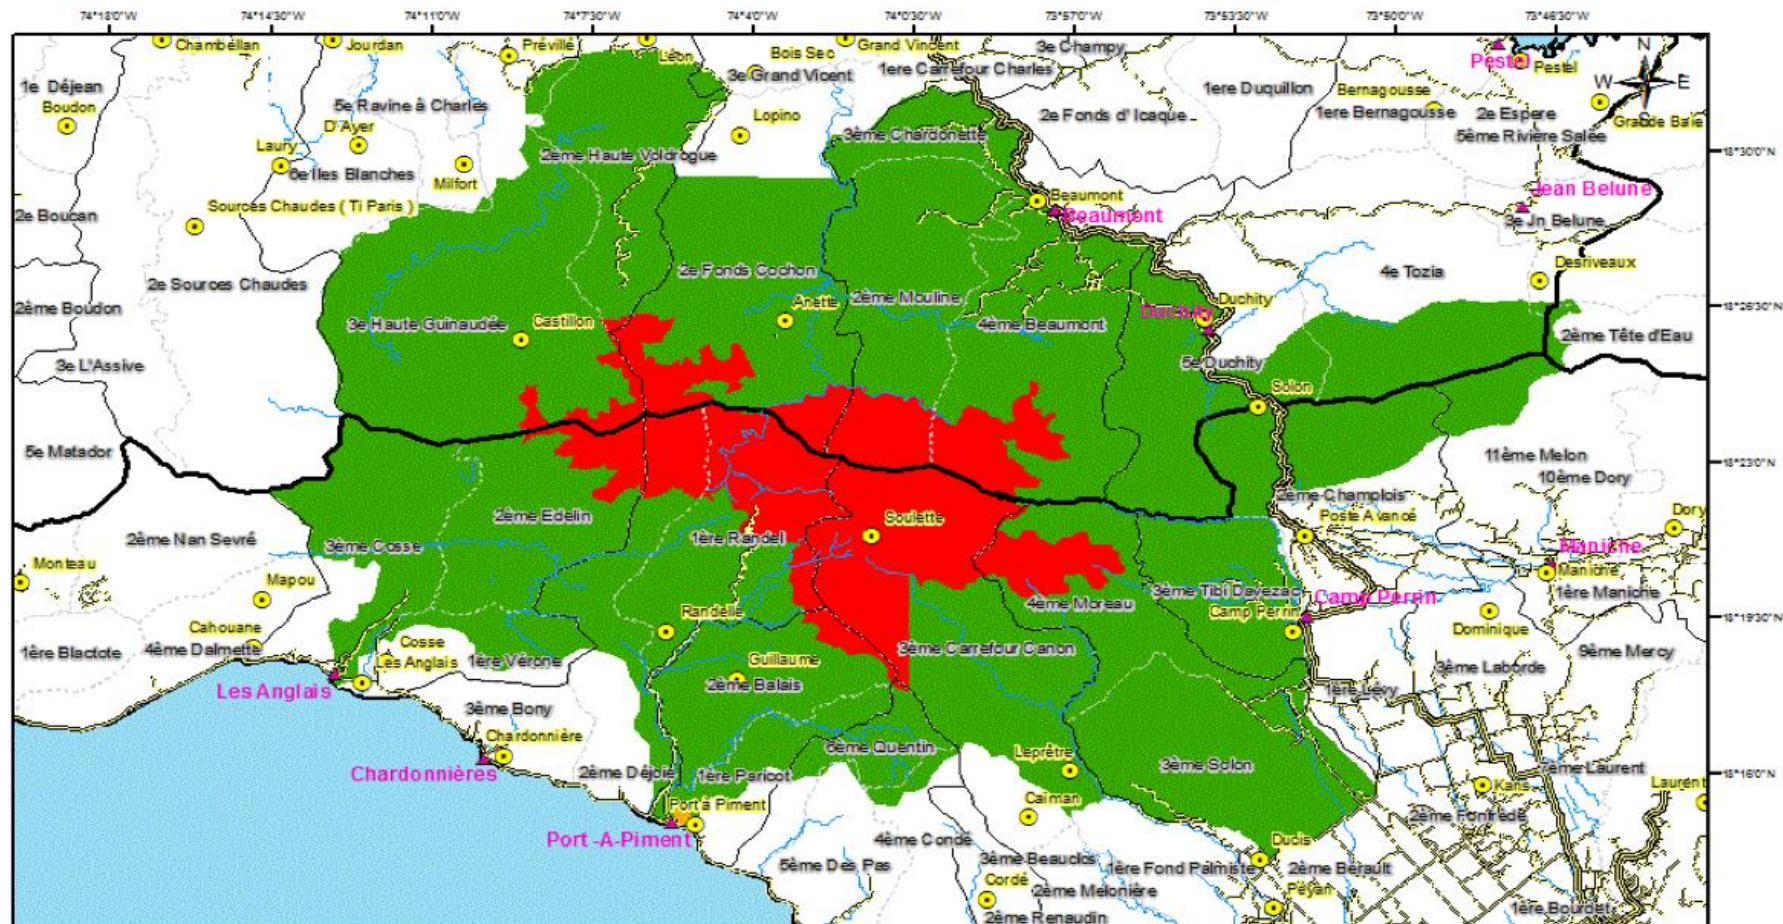

DÉLIMITATION DE LA ZONE TAMPON

- Limites départementales
- Limites communales
- Limites des sections communales
- Grotte Marie Jeanne
- Zone centrale du Parc
- Zone tampon du Parc
- Marchés
- ▲ Principales villes
- Routes nationales
- Autres routes
- Principaux cours d'eau

Système de coordonnées:
WGS 1984 UTM Zone 18N
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Unité: Mètre



Source de données: CNIGS, 1998
CIAT, 2014
PNM, 2015


Réalisation cartographique: Mars 2015



PLAN DE GESTION PARC NATIONAL NATUREL MACAYA



MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT






Parc Macaya

➤ Etablissement du Parc (Zone Centrale)





PLANIFICATION	RESULTATS ATTEINTS	RESPONSABLE (S)
Bornage de 132 km (Parc Macaya et Grande Colline)	68 km borné	CIAT
Réhabilitation et mise en fonction des centres d'hébergement et de formation de Formon	Remise définitive des bâtiments, équipements et matériels achetés. Installation prochaine de l'équipe technique	UGP Macaya
Elaboration du Plan de Gestion du Parc Macaya	Plan validé par le MDE et en vigueur depuis octobre 2015	PNUE
Etablissement d'un système de surveillance	31 agents de surveillance recrutés, formés et équipés. (1 ^{ère} phase du déploiement); 50 à déployer pour la 2eme phase.	UGP Macaya / DISE
Etablissement d'un système de Suivi scientifique établi	Support au bureau de la SAH à Formon / Numérisation des herbiers / Elaboration de modules de formation et organisation de 4 ateliers / Expédition scientifiques pour inventorier des espèces de la faune	Société Audubon Haïti (SAH)





PLANIFICATION	RESULTATS ATTEINTS	Responsable/Remarques
Elaboration d'un Plan de valorisation éco-touristique avec signalétique et sentiers et formation de guides	Lancement du recrutement d'une firme pour élaborer un plan de valorisation écotouristique du Parc. Appui à la finalisation du document de signalétique de l'ANAP pour les aires protégées	UGP Macaya et Consultants / Firmes
Suivi carbone	Mise en place de parcelles temporaires et collecte de données	CATIE





Parc Macaya

➤ **Amélioration de l'attractivité du territoire de la zone tampon selon une gestion durable (Zone Tampon)**





PLANIFICATION	RESULTATS ATTEINTS	RESPONSABLE/REMARQUES
Greffage d'arbres en champ (7,500 prévus)	11,508 arbres	ORE
Transplantation de plantules (1,088,000 prévus)	1,150,585 plantules soit 2,701.05 hectares de superficie reboisée	ORE/FMD/FNGA
Formation de producteurs (1 participant = 1 producteur) (1,150 prévus)	2,170 producteurs formés	ORE/FMD/FNGA
Traitement de ravines	10,950 mètres linéaires traités	FMD/FNGA
Appui aux écoles (23 prévus)	38 écoles appuyées	FMD/FNGA
Formation de professeurs (59 prévus)	59 professeurs formés	FMD/FNGA
Formation de sensibilisateurs environnementaux (26 prévus)	26 sensibilisateurs environnementaux formés	FMD/FNGA
Construction impluviums (3 prévus)	3 impluviums construits	FNGA
Programme de sensibilisation environnementale	30% du budget consommé.	DDE Sud et DDE Grand 'Anse





Parc Macaya

➤ **Aménagement de bassins versants (Zone Transversale)**





PLANIFICATION	RESULTATS ATTEINTS	RESPONSABLE/REMARQUES
Aménagement de bassins versants	- 22 km de routes réparées de façon temporaire avec l'aide du CNE - Etude technique sur 4 pistes rurales dans la zone de Macaya. -Signature de contrat avec deux firmes pour la réhabilitation de la piste Canon-Formon de 18 km de pistes et la construction de 13 bassins de stockage d'eau de pluie.	UGP Macaya avec firmes de construction GRETCO et AEJ-CODS Construction






Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
- 4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion**
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges





Programmes du Plan de Gestion

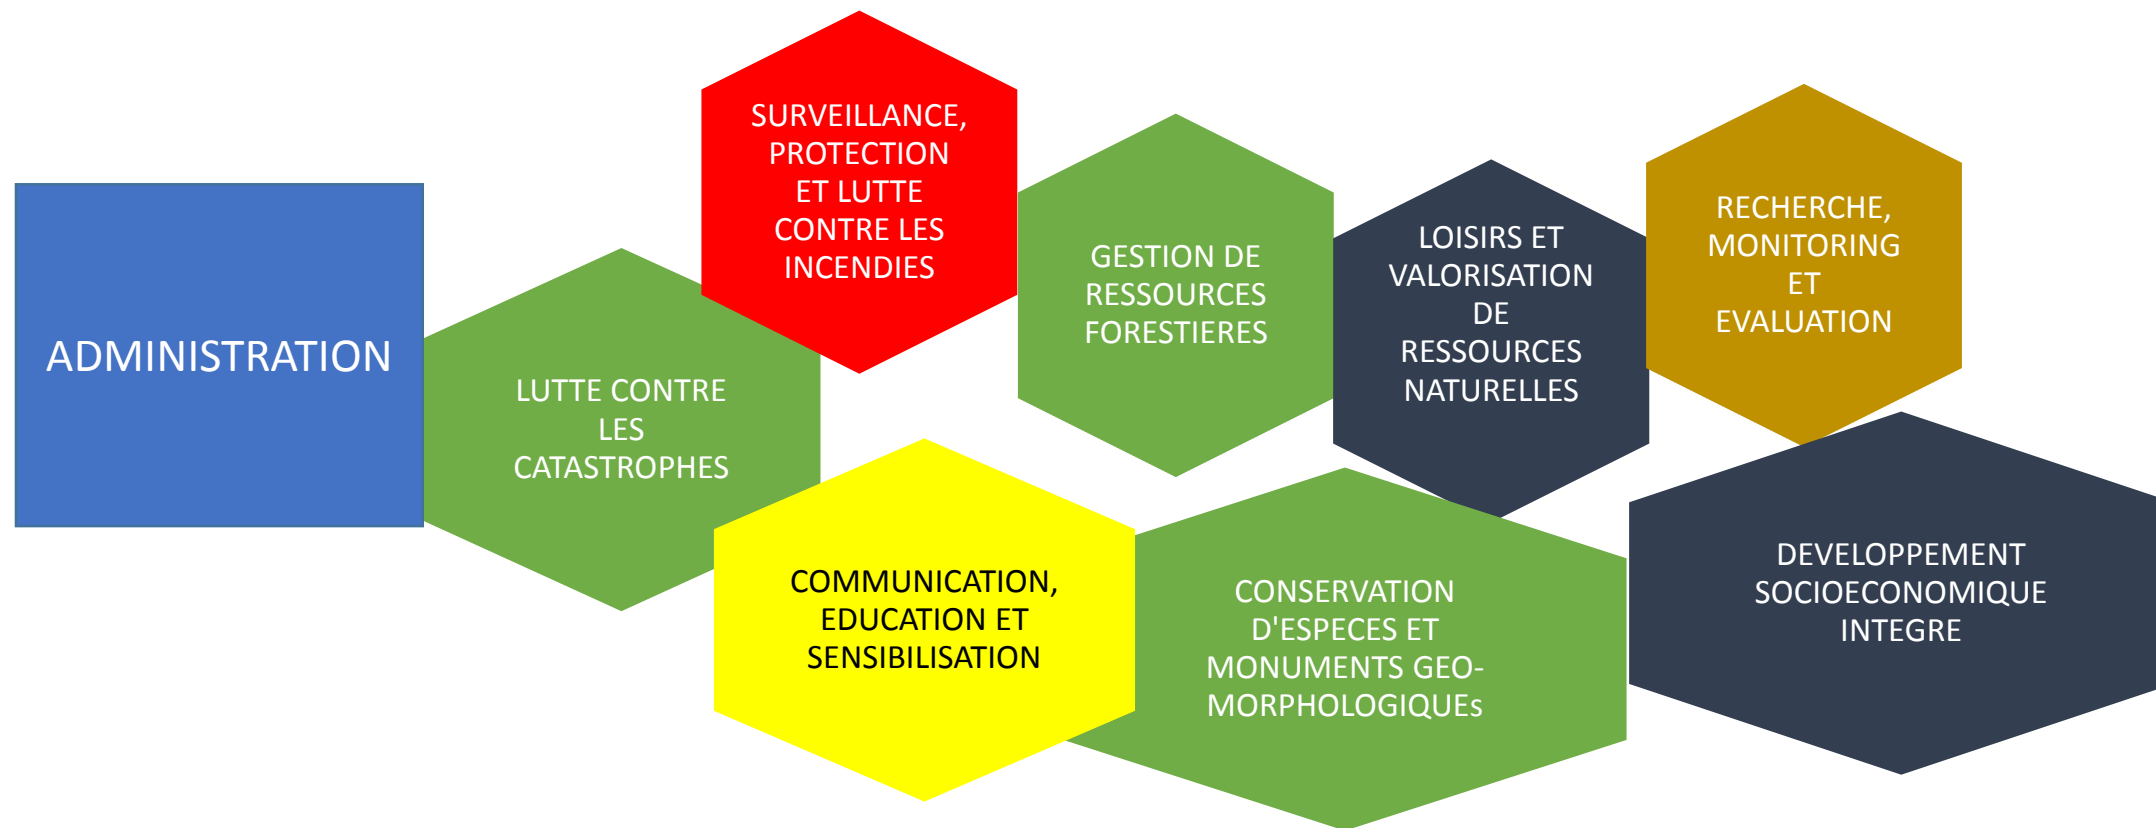



Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
- 5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)**
6. Activités en cours et à venir
7. Challenges





Gestion du Parc

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

(MDE)

||

AGENCE NATIONALE DES AIRES PROTÉGÉES

(ANAP)

||


UNITE DE GESTION DU PROGRAMME MACAYA

(UGP MACAYA)





Parc Macaya

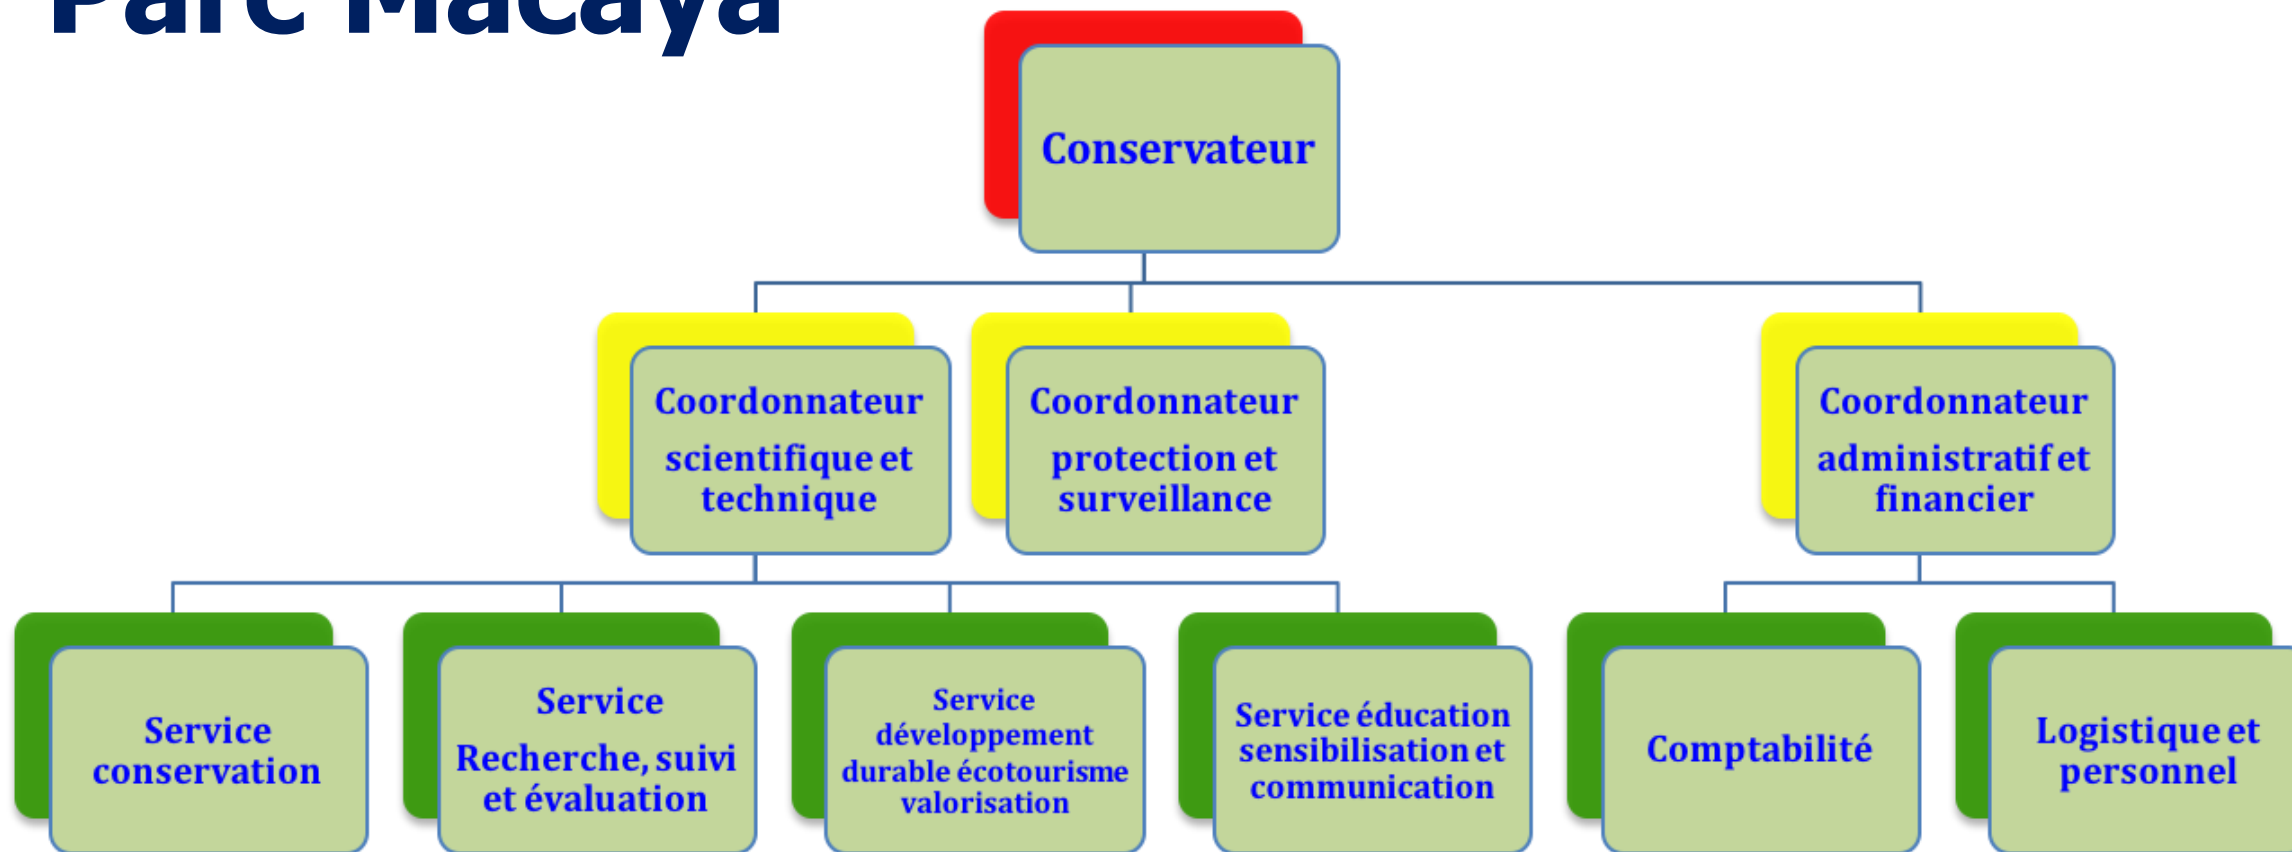



Structures de Gestion et de Gouvernance

Assemblée Générale du
Parc Macaya (39 → 45
dont 6 OCB???)



Conseil de Gestion (9 → 11)

- Conseil de Direction PNNM: 1
- Mairies/CASEC: 4
- CCIS/CCIGA: 2
- Partenaires Stratégiques: 2
- Représentants OCB: 2 ???

Unité de Gestion du Programme/
Bureau du PNN-Macaya

Structure de planification et
d'opérationnalisation

- Conseil de Direction
- Les Services Scientifiques et TK
- Les Agents de Surveillance Env.
- La cellule de Passation des Marchés
- Personnel de Soutien
- ACSE (27/50)

Comité de Pilotage

- MDE
- Bailleurs
- BID
- CIAT
- ANAP
- UGP
- Mairies
- DDS/DDGA
- Partenaires

Organe d'orientation et de prise
de décision

Organe Stratégique/d'Arbitrage





Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
- 6. Activités en cours et à venir**
7. Challenges





Financement GEF=FEM

- *No. Projet : HA-X1002 (GEF)*
 - *No de contrat: GRT/FM-11803-HA*
 - *Signé : 05 Novembre 2009*
 - *Éligibilité : 31 Octobre 2012*
 - *Clôture : 05 Mai 2017*
- *Montant approuvé : US\$ 3,436,364.00*
 - *Montant décaissé par la BID : US\$ 3,015,014.75*
 - *% Décaissé : 87.74 %*
 - *Montant engagé : US\$ 404,421*
 - *% Engagé : 12 %*





Financement FRH / Coopération Norvégienne

- **No. Projet : HA-G1023 (FRH)**
 - **No de contrat: GRT/HR-13930-HA**
 - **Signé : 27 Septembre 2013**
 - **Éligibilité : 26 Juin 2014**
 - **Clôture : 11 octobre 2017**
- *Montant approuvé : US\$ 9,000,000*
 - *Montant décaissé par la BID: US\$ 2,379,057.67*
 - *% Décaissé : 26.43 %*
 - *Montant engagé : US\$ 3,077,383.09*
 - *% Engagé : 34.2 %*





ACTIVITES EN COURS ET A VENIR D'ICI A DECEMBRE 2016

ACTEURS POUR MISE EN OEUVRE

Réhabilitation de Pistes rurales (18km) et 13 Bassins de Stockage

GRETCO & AEJ-CODS Construction

Supervision des travaux de construction

EPTISA/IBC

Suivi Carbone (Parcelles Temporaires et Permanentes)

CATIE

Réalisation de la cartographie participative 3D du Parc

Consultant

Recherche et Suivi Scientifique /Enquêtes Socio-démographique

Société Audubon Haïti (SAH)





ACTIVITES EN COURS ET A VENIR D'ICI A DECEMBRE 2016		ACTEURS POUR MISE EN OEUVRE
Bornage de 64 km Parc Macaya/Grande Colline		CIAT
Renouvellement du contrat des 3 partenaires stratégiques		ORE/ FMD et FNGA
Rapport Audit du programme		Experts Conseils et Associés
Identification d'actions prioritaires avec les Communautés		Mairies/ OCB/ Consultants
Renforcement et déploiement des Agents du Corps de Surveillance environnementale		UGP-Macaya/DISE





ACTIVITES EN COURS ET A VENIR D'ICI A DECEMBRE 2016	ACTEURS POUR MISE EN OEUVRE
Elaboration Plan de valorisation écotouristique	Consultant
Plan d'affaires et étude de commercialisation de filières pour le Bureau du Parc	Consultant
Aménagement complémentaire du Centre de formation de Formon	Consultant
Formation continue des associations de guide en « guidage de montagne »	Consultant





ACTIVITES EN COURS ET A VENIR D'ICI A DECEMBRE 2016	ACTEURS POUR MISE EN OEUVRE
Construction de tours de surveillance/observation pour lutte contre incendies	Consultant
Construction de sentiers et toilettes écologiques	Consultant
Consultant pour Evaluation ¾ - préparation d'un projet avec les fonds BID	Consultant
Fabrication des supports de signalétique du Parc	Consultant





Financement MACAYA GRAND SUD -- PNUE & DDE SUD

- **Montant du financement : USD 570,000**

Appui au paiement de 2 cadres Techniques de l'UGP Macaya


- **Montant approuvé pour Aire de Macaya : USD 322,000 (56%)**

- Responsable du Service Conservation
- Assistant – Chargé de Développement de Filières vertes

Elaboration et mise en place d'un plan de prévention et de lutte contre les incendies dans le Parc.

- **Éligibilité : Janvier 2016**
- **Clôture : Décembre 2017**

Pépinière pour le reboisement de l'aire de la Grotte Marie-Jeanne (objet de conservation du Parc Macaya)





Financement MACAYA GRAND SUD – PNUE & UNOPS

- **Montant du financement approuvé pour Aire de Macaya :**
USD 310,000
- **Éligibilité : Janvier 2016**
- **Clôture : Décembre 2017**
- *Inventaire des espèces de la flore du Parc Macaya en voie de disparition*
(→ *restauration des zones rouges*)
- *Construction d'un Centre d'interprétation*
(→ *valorisation écotouristique*)






Sommaire

1. Présentation Fiche signalétique du Programme
2. Zone d'Intervention
3. Axes d'intervention et Principales Réalisations/Parties concernées
4. Lien avec les Programmes du Plan de Gestion
5. Structures de gestion et de gouvernance (Programme vs Plan Gestion)
6. Activités en cours et à venir
- 7. Challenges**







MERCI

